INVENTAIRE DU FOND HALLEUX

REMIS PAR **MR GURY HERVÉ**

Année 2012, n° 1 **Date de parution de l'inventaire:** 01 Novembre 2012

SOCIÉTÉ **D'HISTOIRE** ET **D'ARCHÉOLOGIE** DU SEDANAIS

Don de Mr HALLEUX Patrice (Sarl GOTTARDI — HALLEUX — CLAUDEL),
Remis par Mr GURY Hervé le 8 avril 2012

Dans ce numéro :

Titre	Année	Page
Construction de Trottoirs — Ville de Sedan, Mme HERBERT	1879	2
Mémoire des travaux de Maçonnerie — ALEXANDRE & FOURNAISE	1887	7
Construction d'un Lycée de Fille - Ville de Charleville	1887	17
Facture du commerce de bois JACQUEMART—Torcy/Sedan	du 5/5/1883	41
Facture du commerce de bois JACQUEMART—Torcy/Sedan	du 22/6/1883	42
Facture du commerce de bois JACQUEMART—Torcy/Sedan	du 27/12/1883	43
Dessin d'un caveau de famille au 10ème d'exécution		44
Tombeau de Mr le Baron de MONTAGNAC Propriétaire		**46**
Eglise des Hauts-Buttés		**48**
Propriété M FÉVRIER — Plan ALEXANDRE & FOURNAISE		**49**
Mr STOFFELS à Sedan		**50**
Propriété de M MOREAU		**62**
Monsieur LEFORT		**63**
Propriété de M Edmond GODFROID à Sedan	du 28/2/1885	**64**
M RENEL-LALLEMENT à Torcy-Sedan		**66**
Propriété des déchets — Monsieur BOURRY Directeur	du 6/5/1880	**68**
M BURTON — HUDRÉAUX Propriétaire	1894	**70**
Place de la gare à Sedan	1888	**72**
Bâtiment de M Paul COCU		**80**
Divers plans et façades		**82**
Propriété de Mr PIROUX		**96**

Construction de Trottoirs — Ville de Sedan

Département des Ardennes — Arrondissement de Sedan

Affaire de voirie

Mme HERBERT Pétitionnaire

Dessins types dressés par l'Ingénieur de la Ville pour être joints à son Rapport en date de ce jour sur la demande de Mme HERBERT Propriétaire à SEDAN

A Sedan, le 30 Octobre 1879

Portant le N°489 du registre d'ordre

Taille du document :

21 x 31.5

Nombre de pages:

4

DÉPARTEMENT
DES ARDENNES

ARRONDISSEMENT
DE SEDAN

AFFAIRE DE VOIRIE

Mme Herbert

Pétitionnaire.

VILLE DE SEDAN
INGÉNIEUR DE LA VILLE
Le 30 octobre 1879
N° 419 DIRECTION VOIRIE

VILLE DE SEDAN

CONSTRUCTION DE TROTTOIRS

DESSINS TYPES

dressés par l'Ingénieur de la Ville soussigné

pour être joints à son Rapport en date de ce jour

sur la demande

DE

Mme Herbert Imprimerie à Sedan

A Sedan, le 30 Octobre 1879.

Delaporte

INVENTAIRE DU FOND HALLEUX

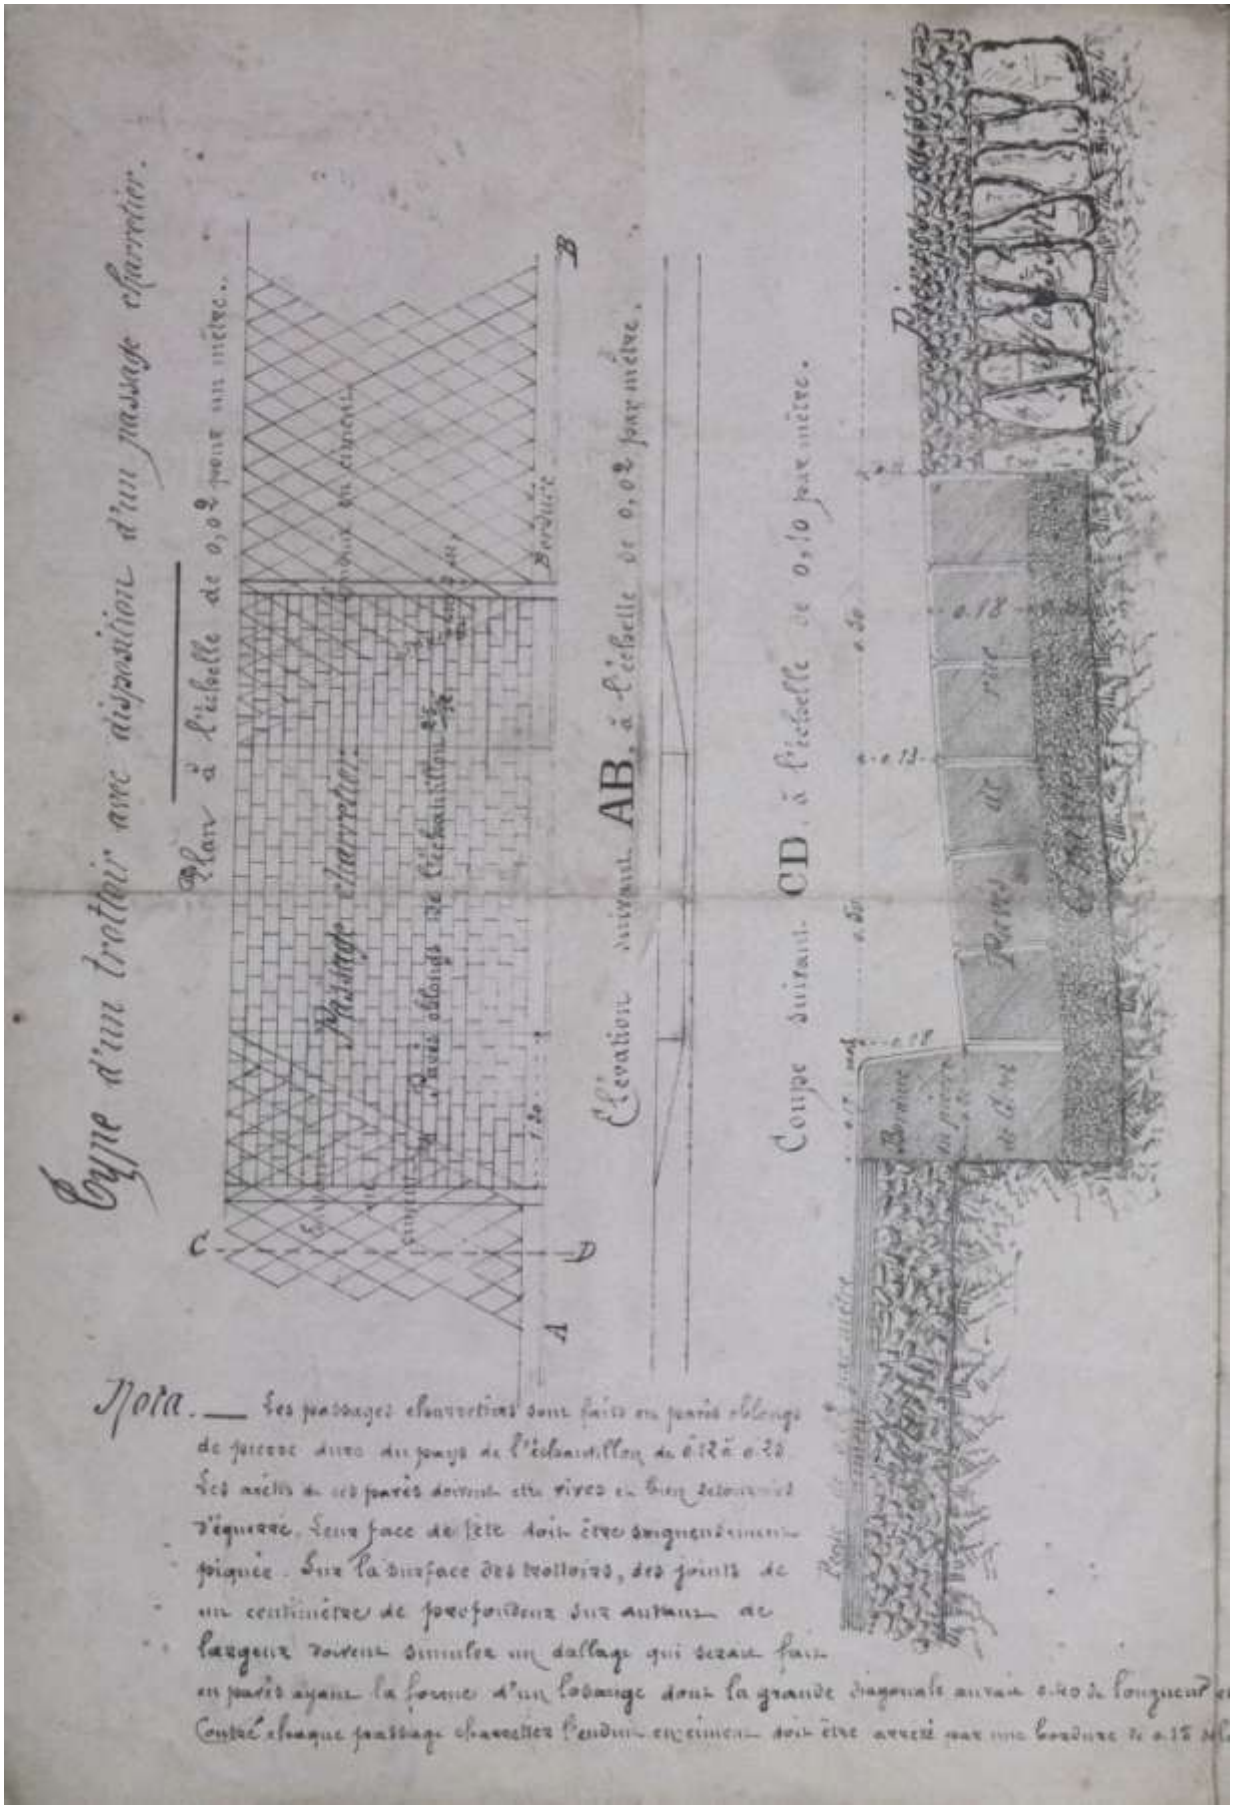

Nota. — Les passages charretiers sont faits en pavés oblongs de percée avec des pavés de l'échantillon de 0,12 à 0,22. Les arêtes de ces pavés doivent être vives et bien retournées d'équerre. Leur face de tête doit être soigneusement piquée. Sur la surface des trottoirs, des joints de un centimètre de profondeur sur autant de largeur doivent simuler un dallage qui devra être fait en pavés ayant la forme d'un losange dont la grande diagonale aura 0,40 de longueur et [illegible]. Contre chaque passage charretier l'enduit en ciment doit être arrêté par une bordure de 0,15 [illegible]

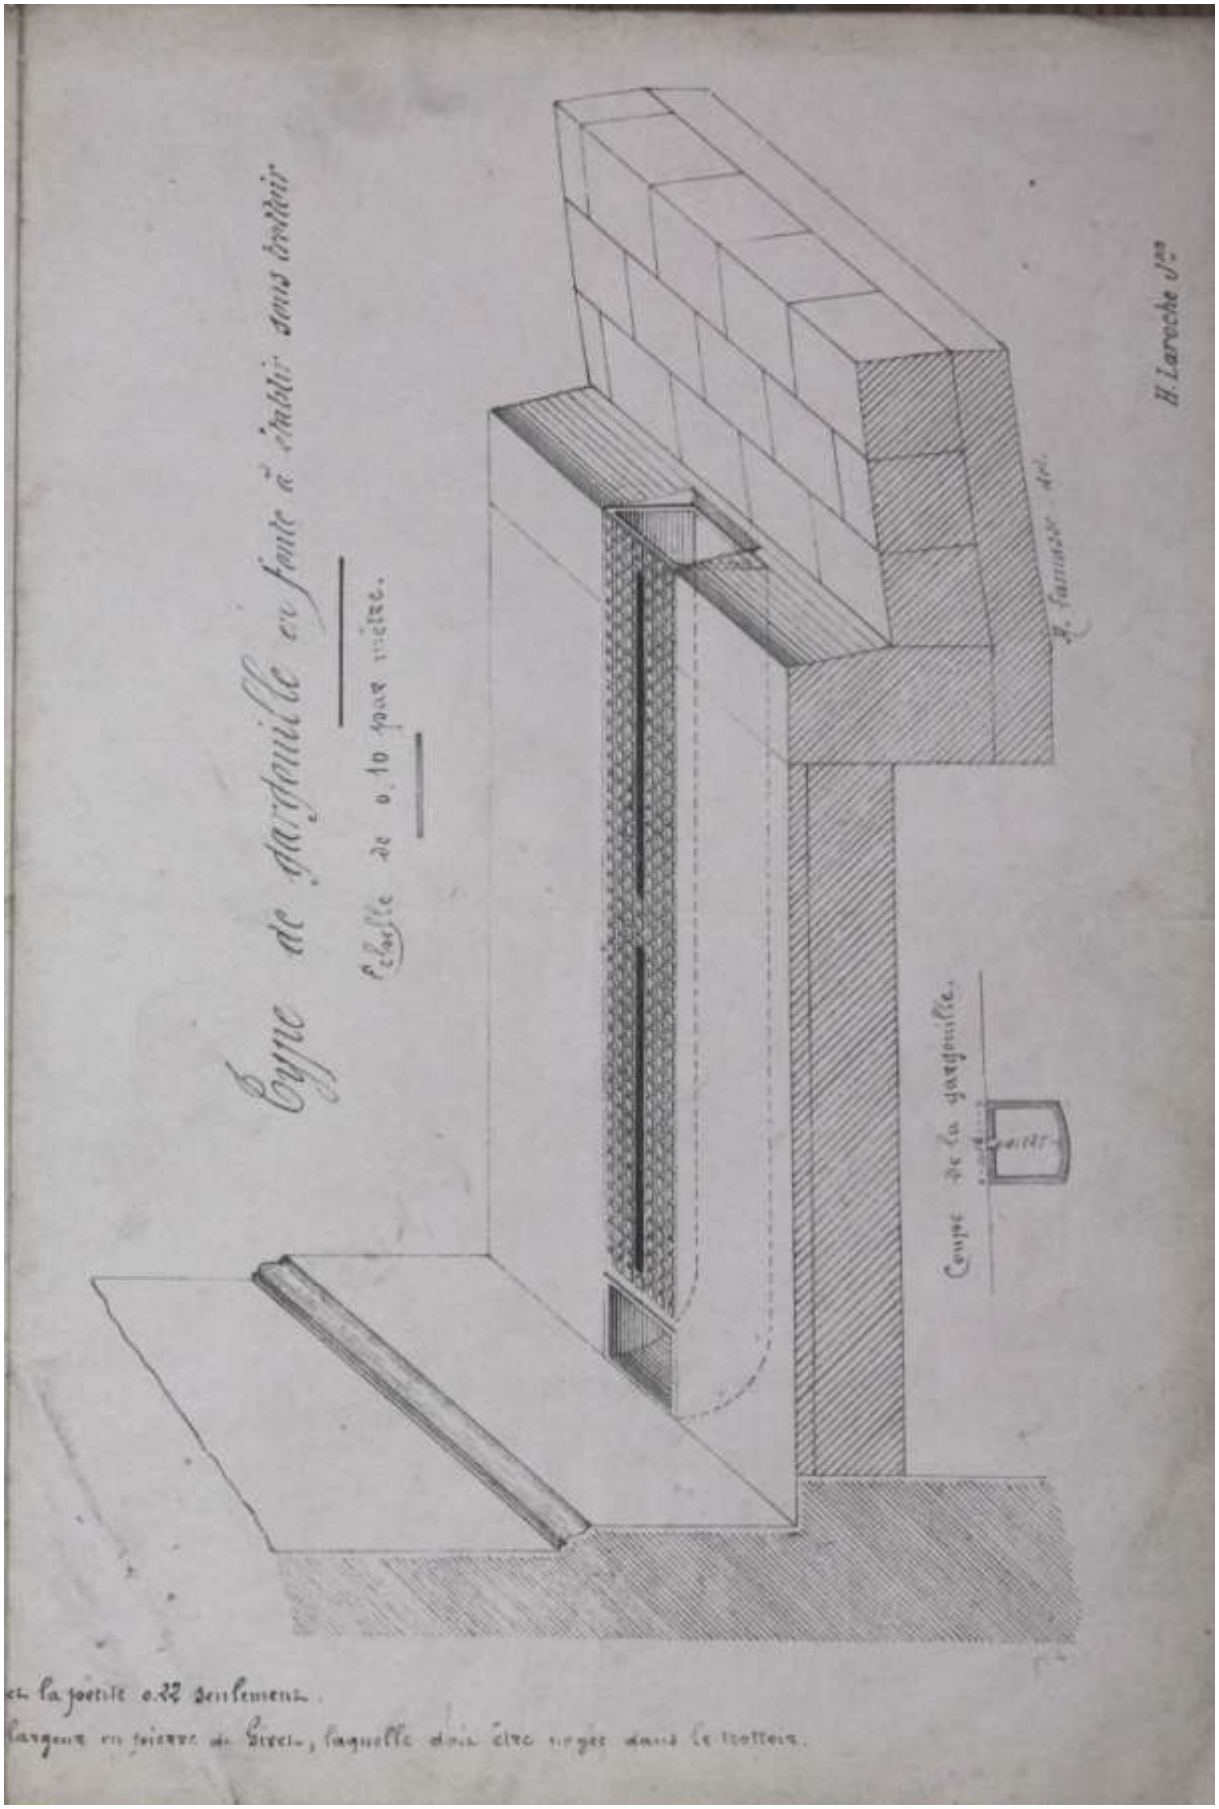
Type de gargouille en fonte à établir sous trottoir
Échelle de 0.10 par mètre.
Coupe de la gargouille.
H. Laroche Jne
et la petite 0.22 seulement.
largeur en pierre de Givet, laquelle doit être noyée dans le trottoir.

EXTRAIT de la délibération du Conseil municipal de Sedan, en date du 28 décembre 1877.

La plate-forme des trottoirs se composera d'un enduit en ciment *Portland* de trois centimètres au moins d'épaisseur, reposant sur une couche de béton hydraulique de quinze centimètres.

Le mortier de ciment à employer pour l'enduit sera formé d'un mélange composé d'une partie de ciment, en volume, pour une partie de sable de Meuse bien pur et tamisé à la claie serrée.

Le mortier de béton contiendra trois parties de sable de Meuse pour deux parties de chaux hydraulique de Charleville ou de Saint-Menges. Il devra entrer dans chaque mètre cube de béton quarante-cinq centièmes de sable.

Entreprise ALEXANDRE & FOURNAISE — Sedan

Mémoire des travaux de Maçonnerie exécutés pour le compte de Mr BERTRAND

Année 1887.

Mr BERTRAND : entrepreneur de couverture à Sedan

ALEXANDRE & FOURNAISE entrepreneurs de travaux publics & particuliers à Sedan

Taille du document :

21.5 x 31.6

Nombre de pages:

12

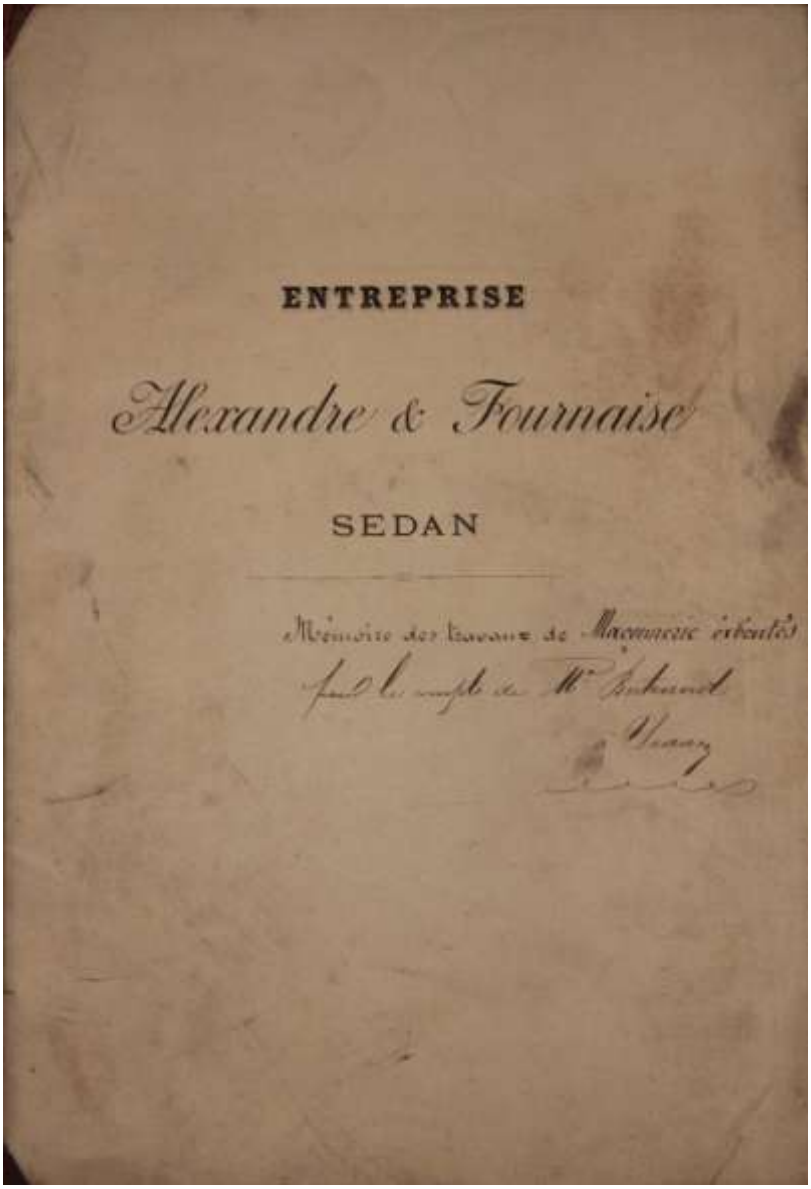

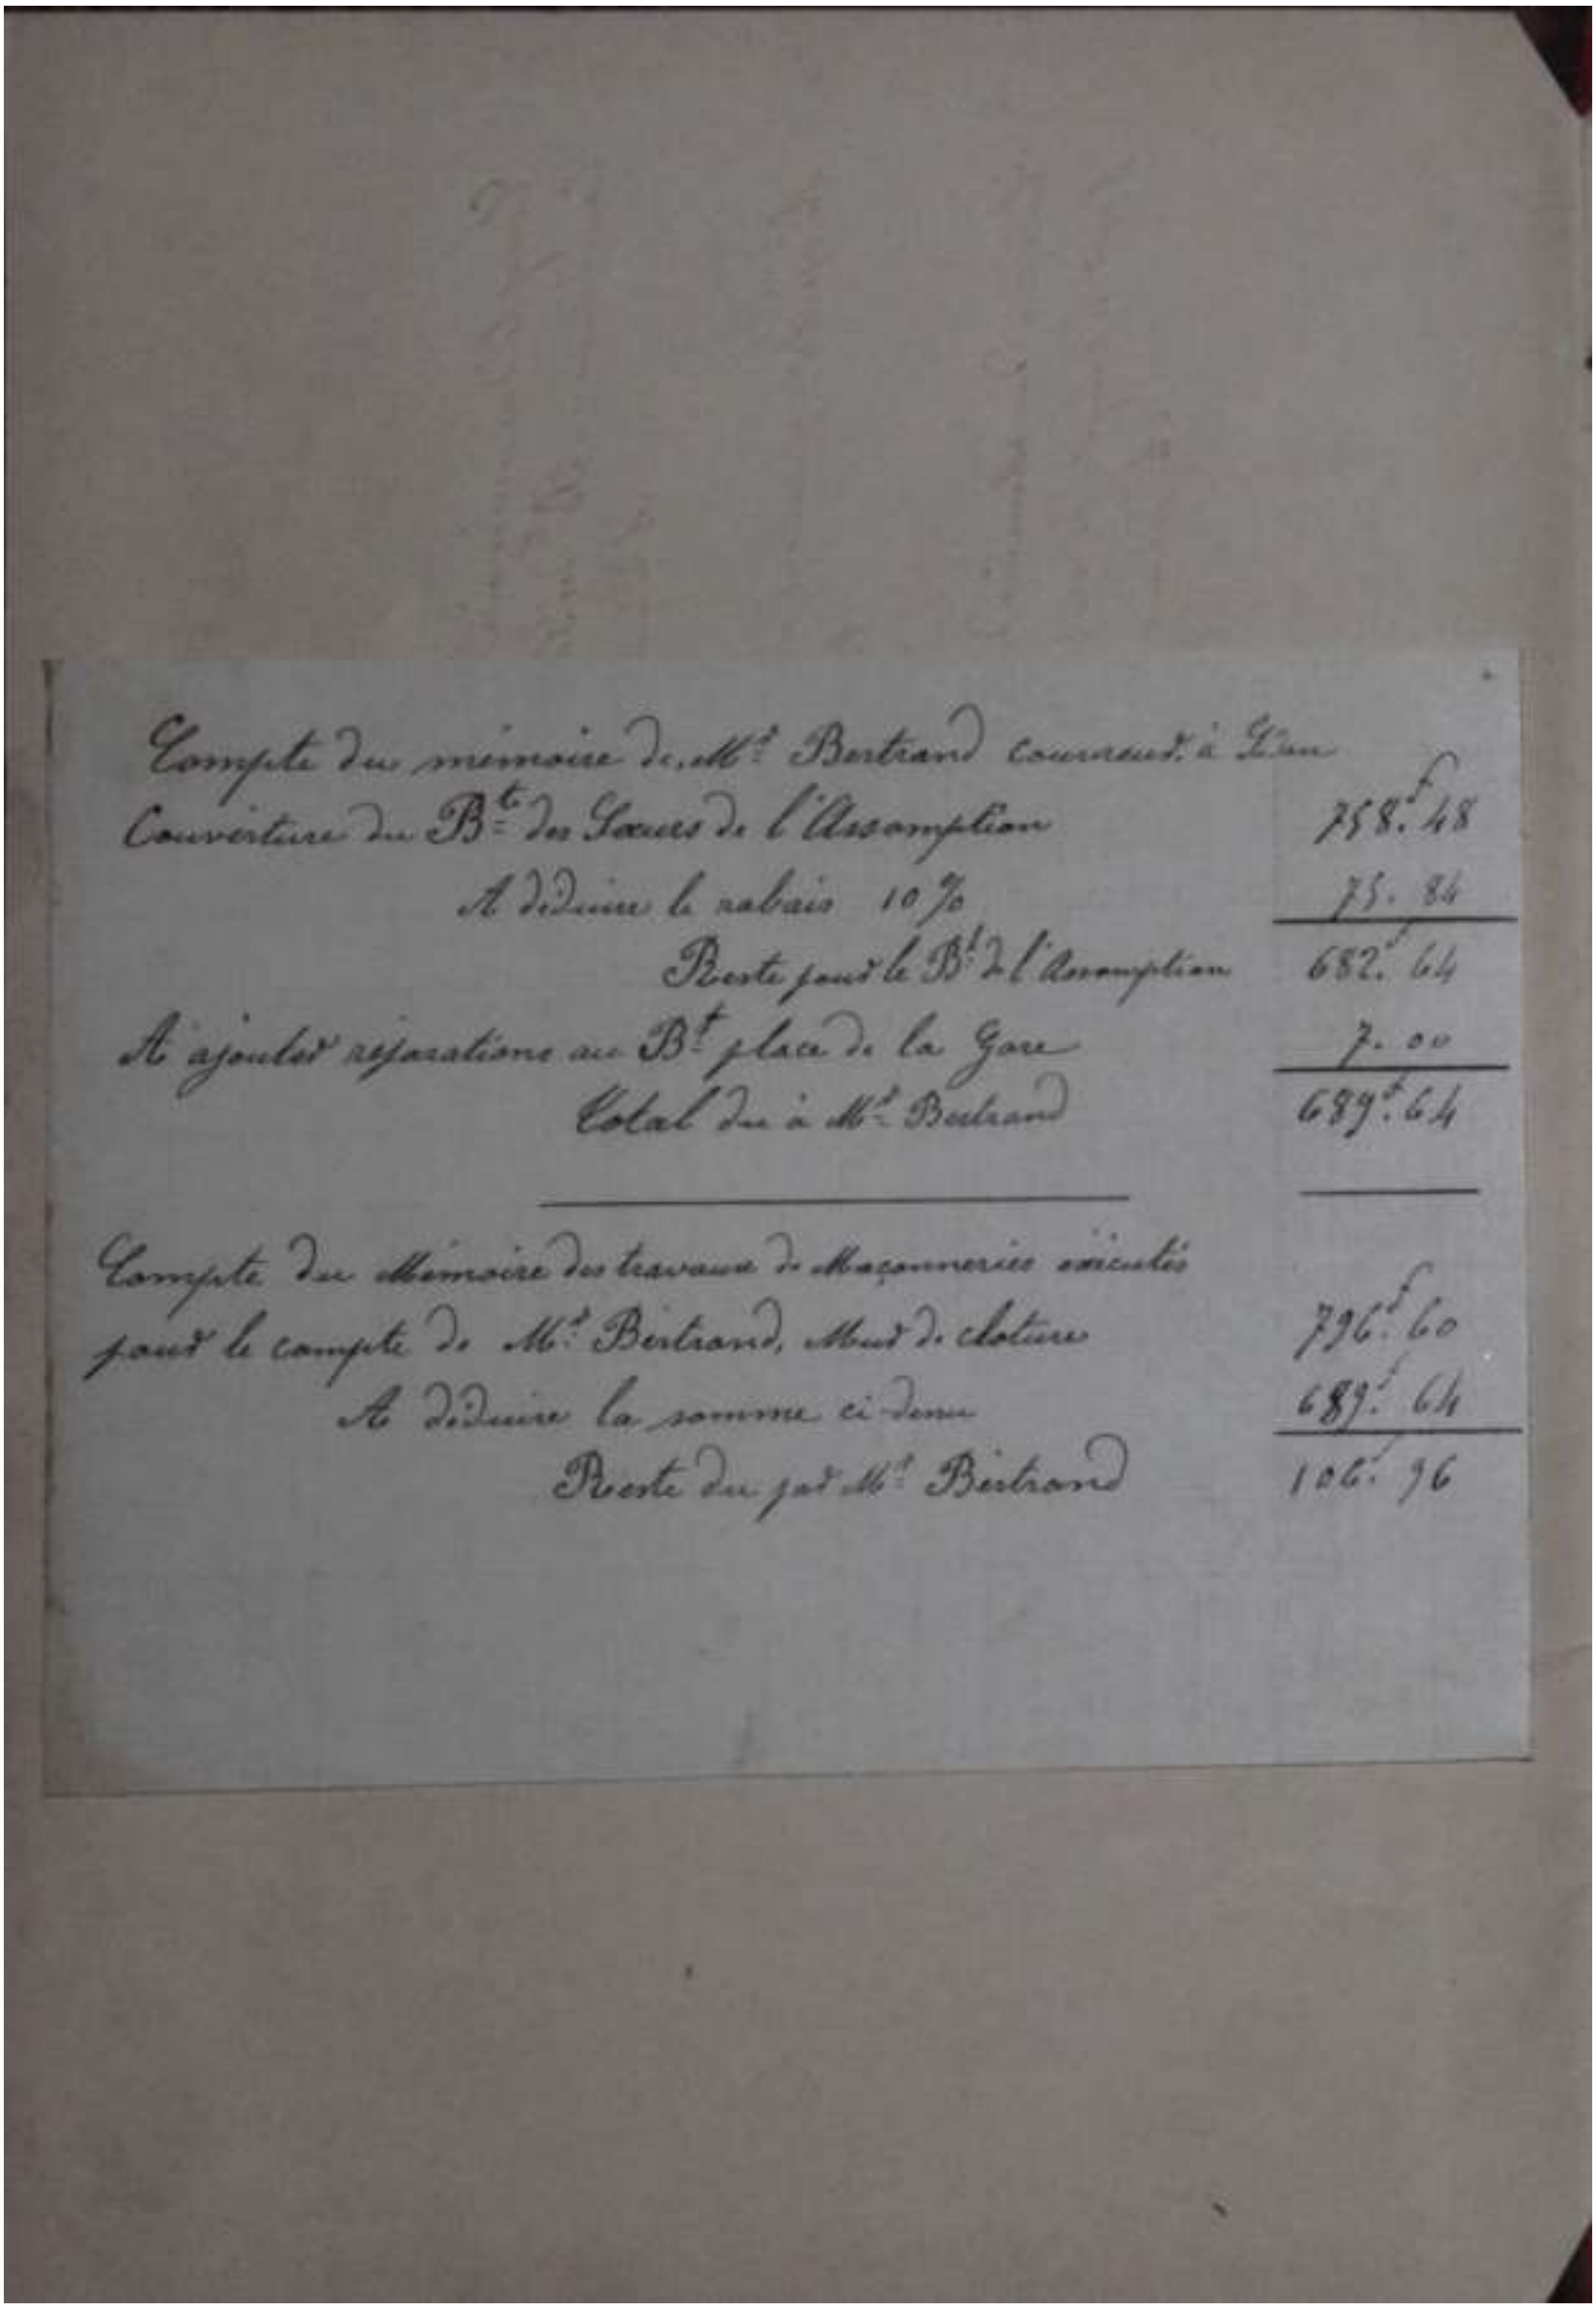

Compte du mémoire de Mr Bertrand couvreur à Lieu	
Couverture du Bt des Sœurs de l'Assomption	758f. 48
A déduire le rabais 10 %	75. 84
Reste pour le Bt de l'Assomption	682f. 64
A ajouter réparations au Bt place de la Gare	7. 00
Total dû à Mr Bertrand	689f. 64
Compte du Mémoire des travaux de Maçonneries exécutés pour le compte de Mr Bertrand, Mur de clôture	796f. 60
A déduire la somme ci-dessus	689f. 64
Reste dû par Mr Bertrand	106f. 96

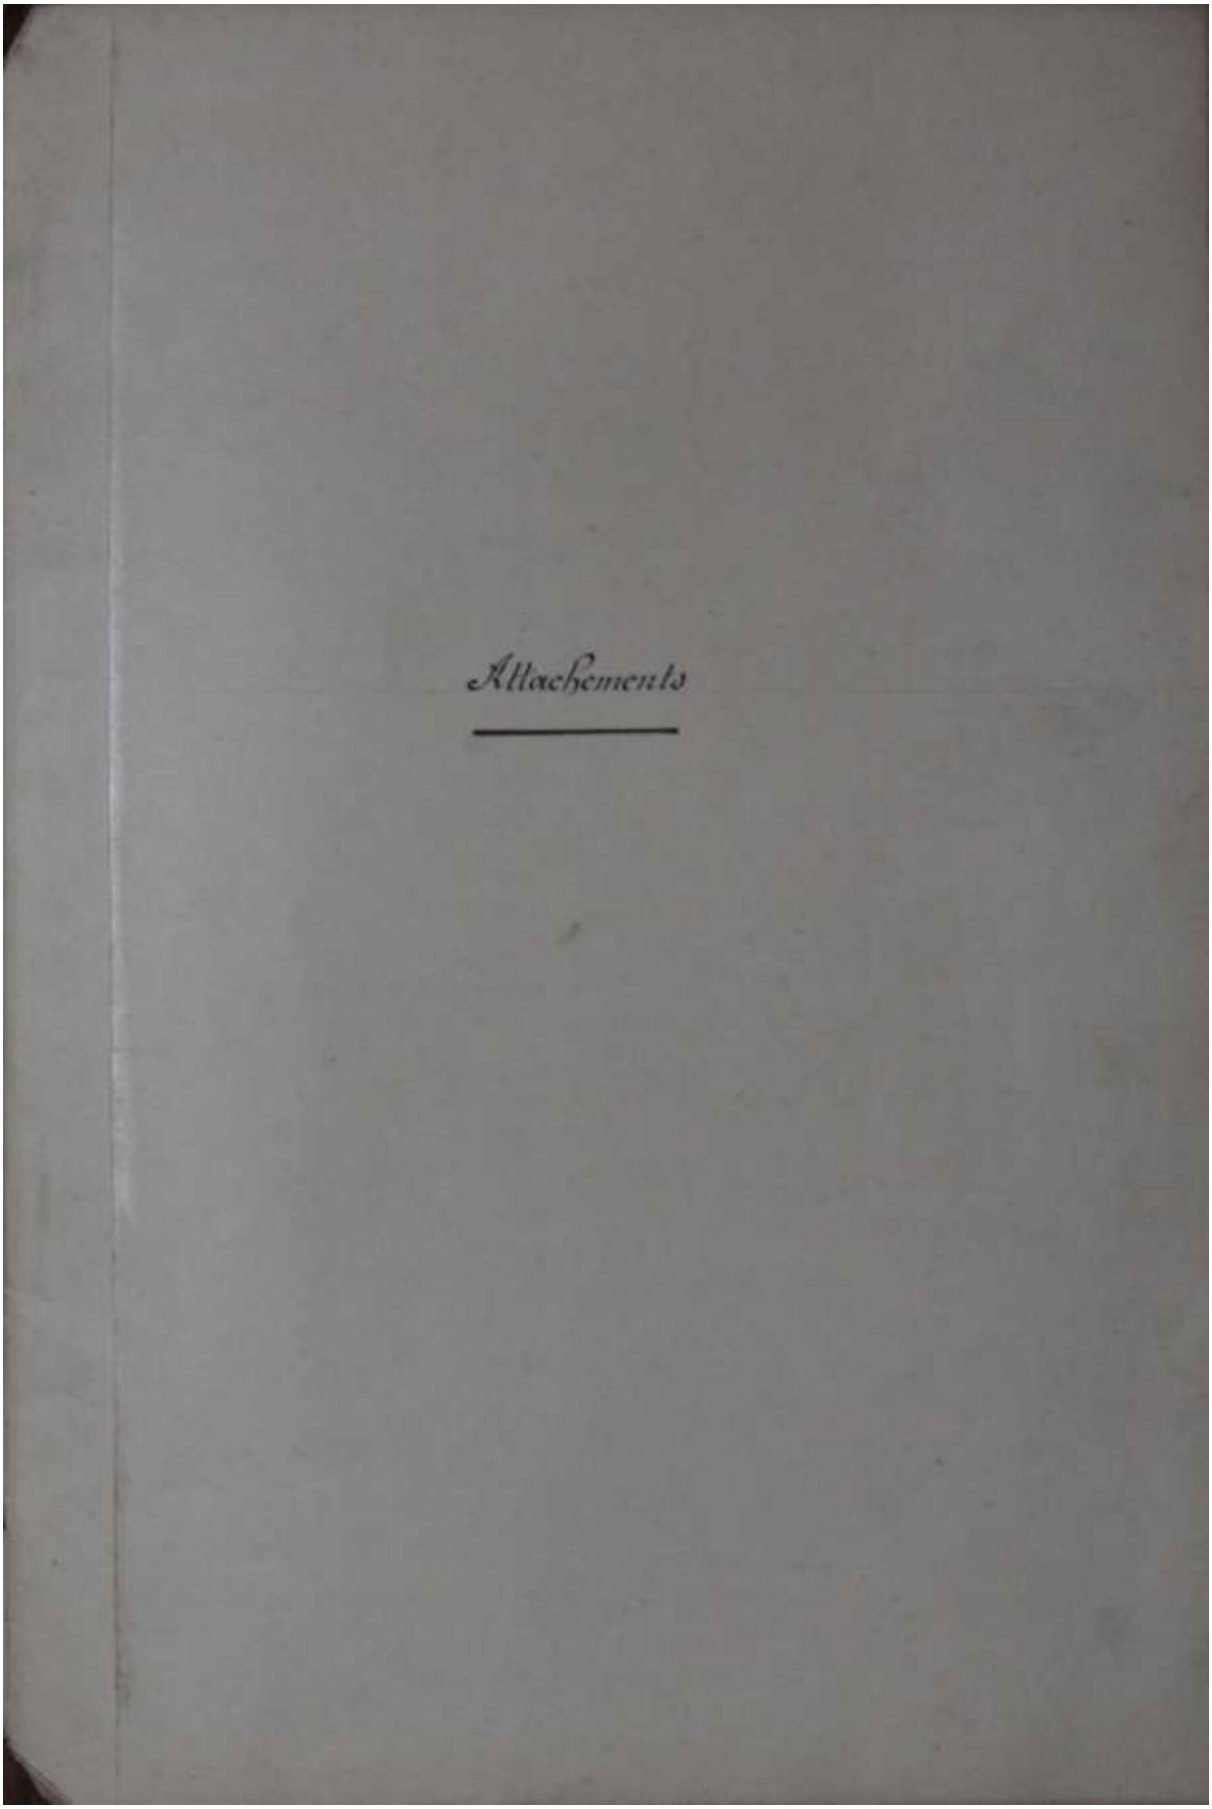
Attachements

INVENTAIRE DU FOND HALLEUX

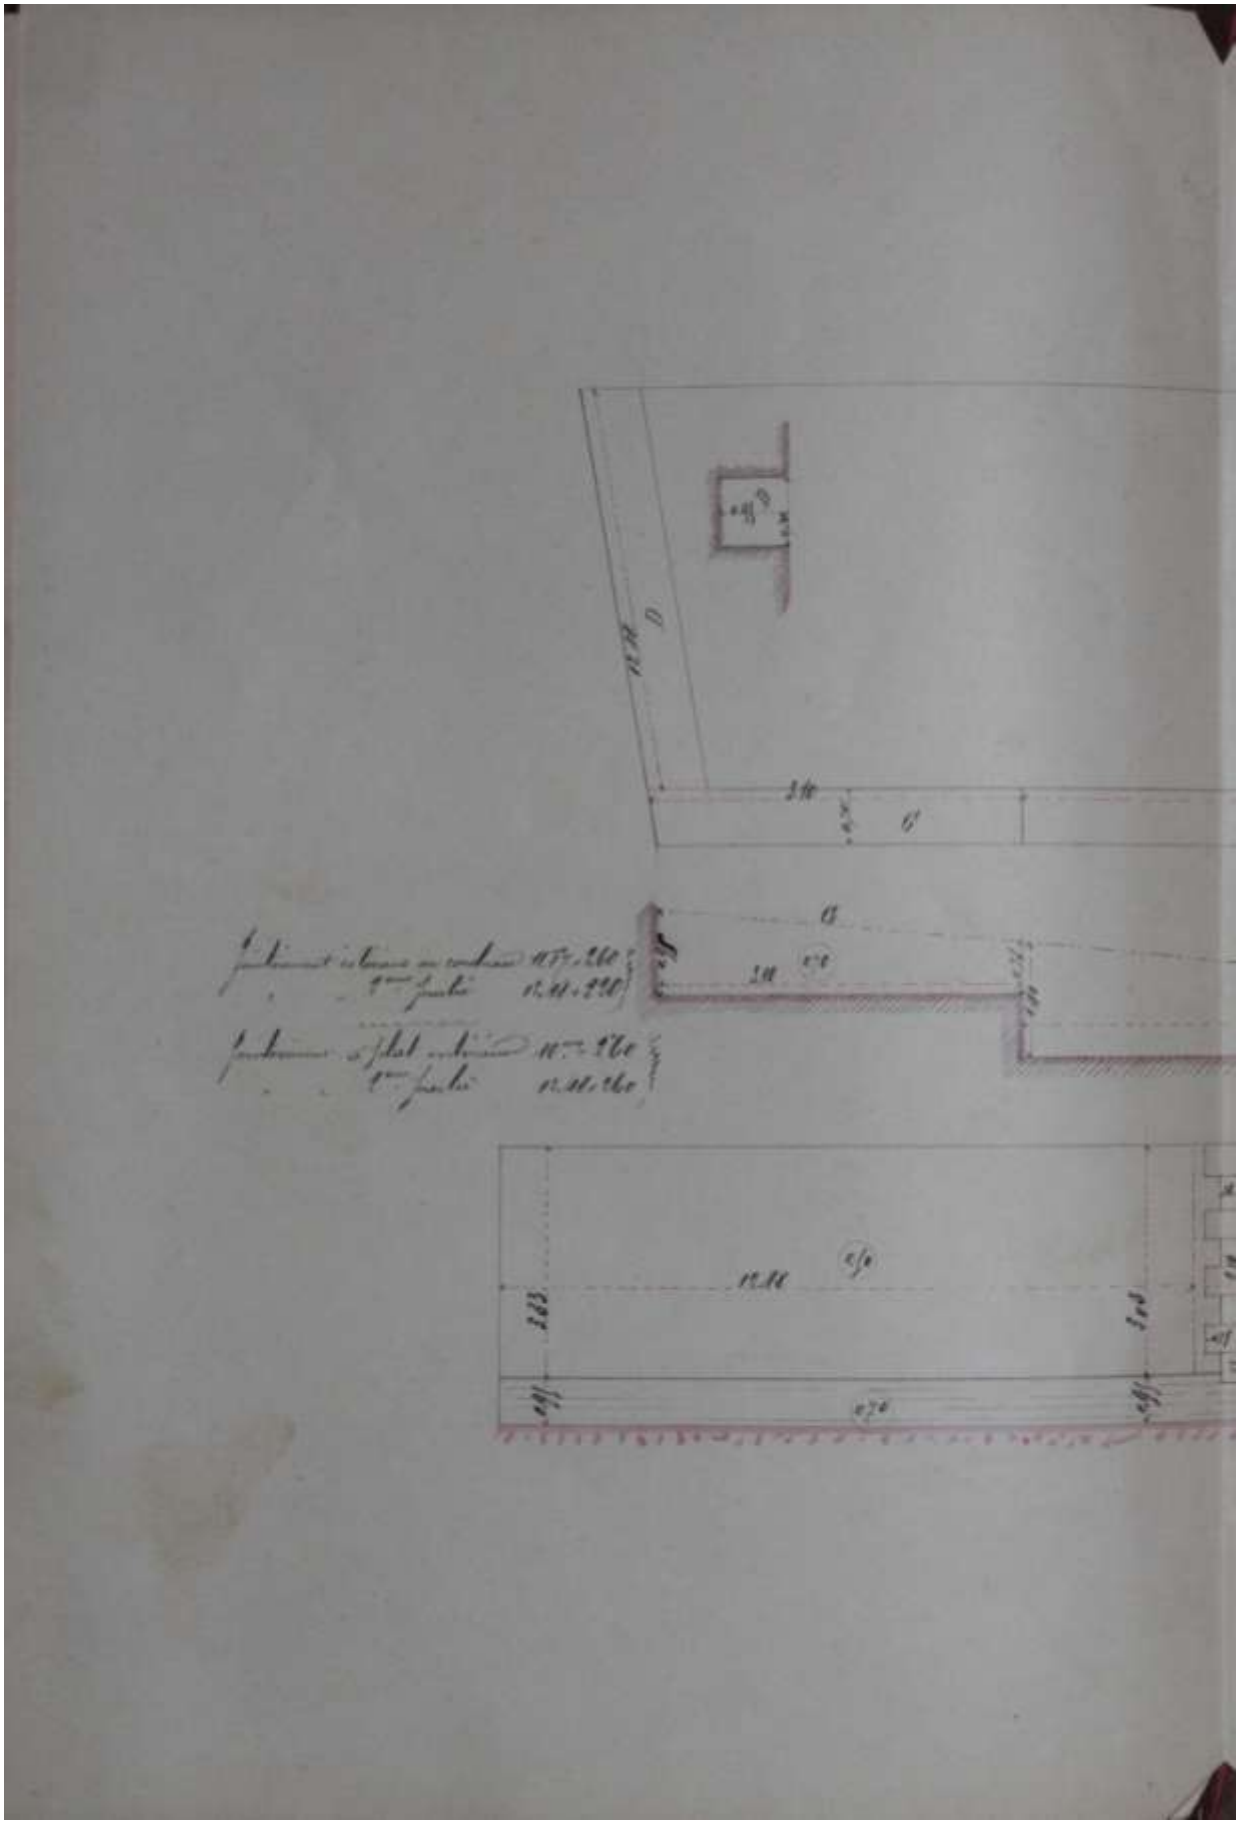

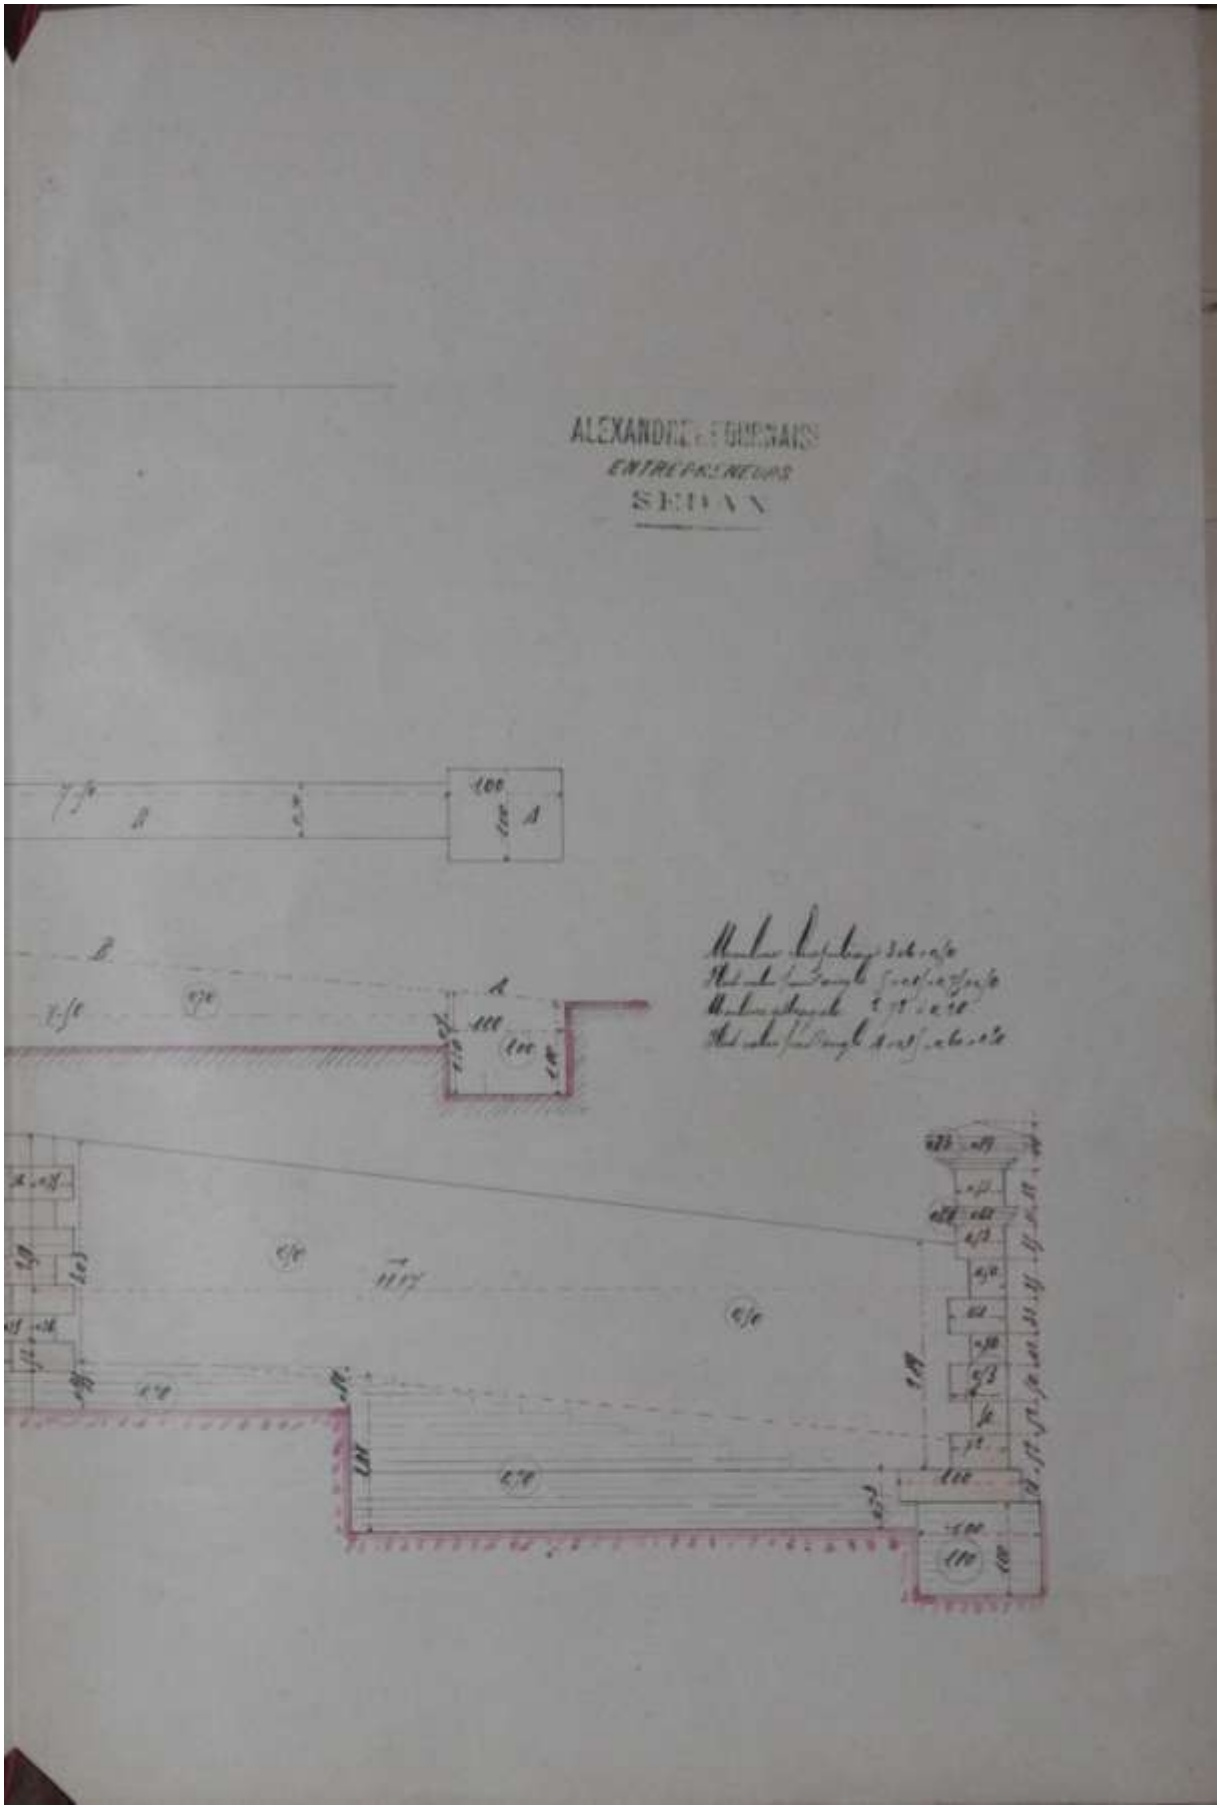
ALEXANDRE
SEDAN

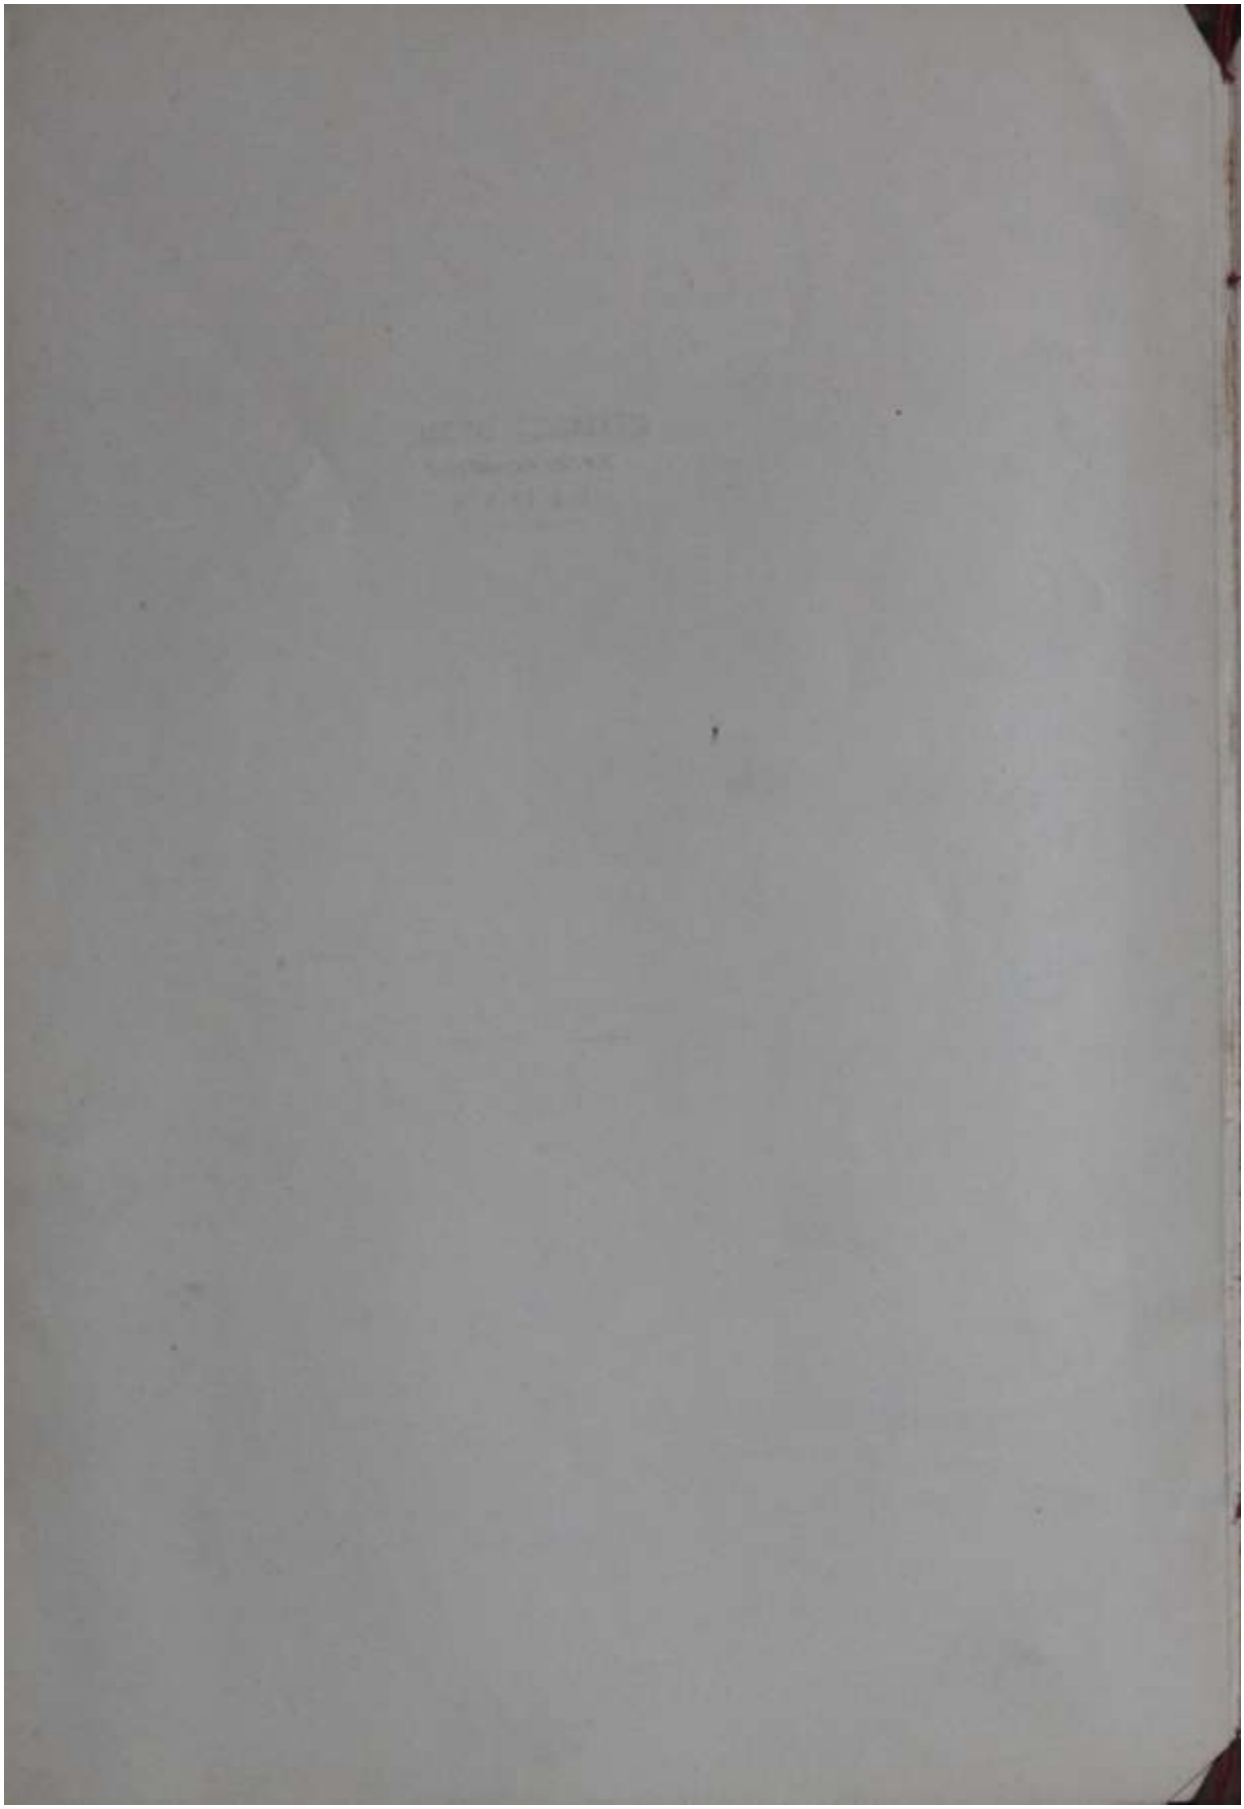

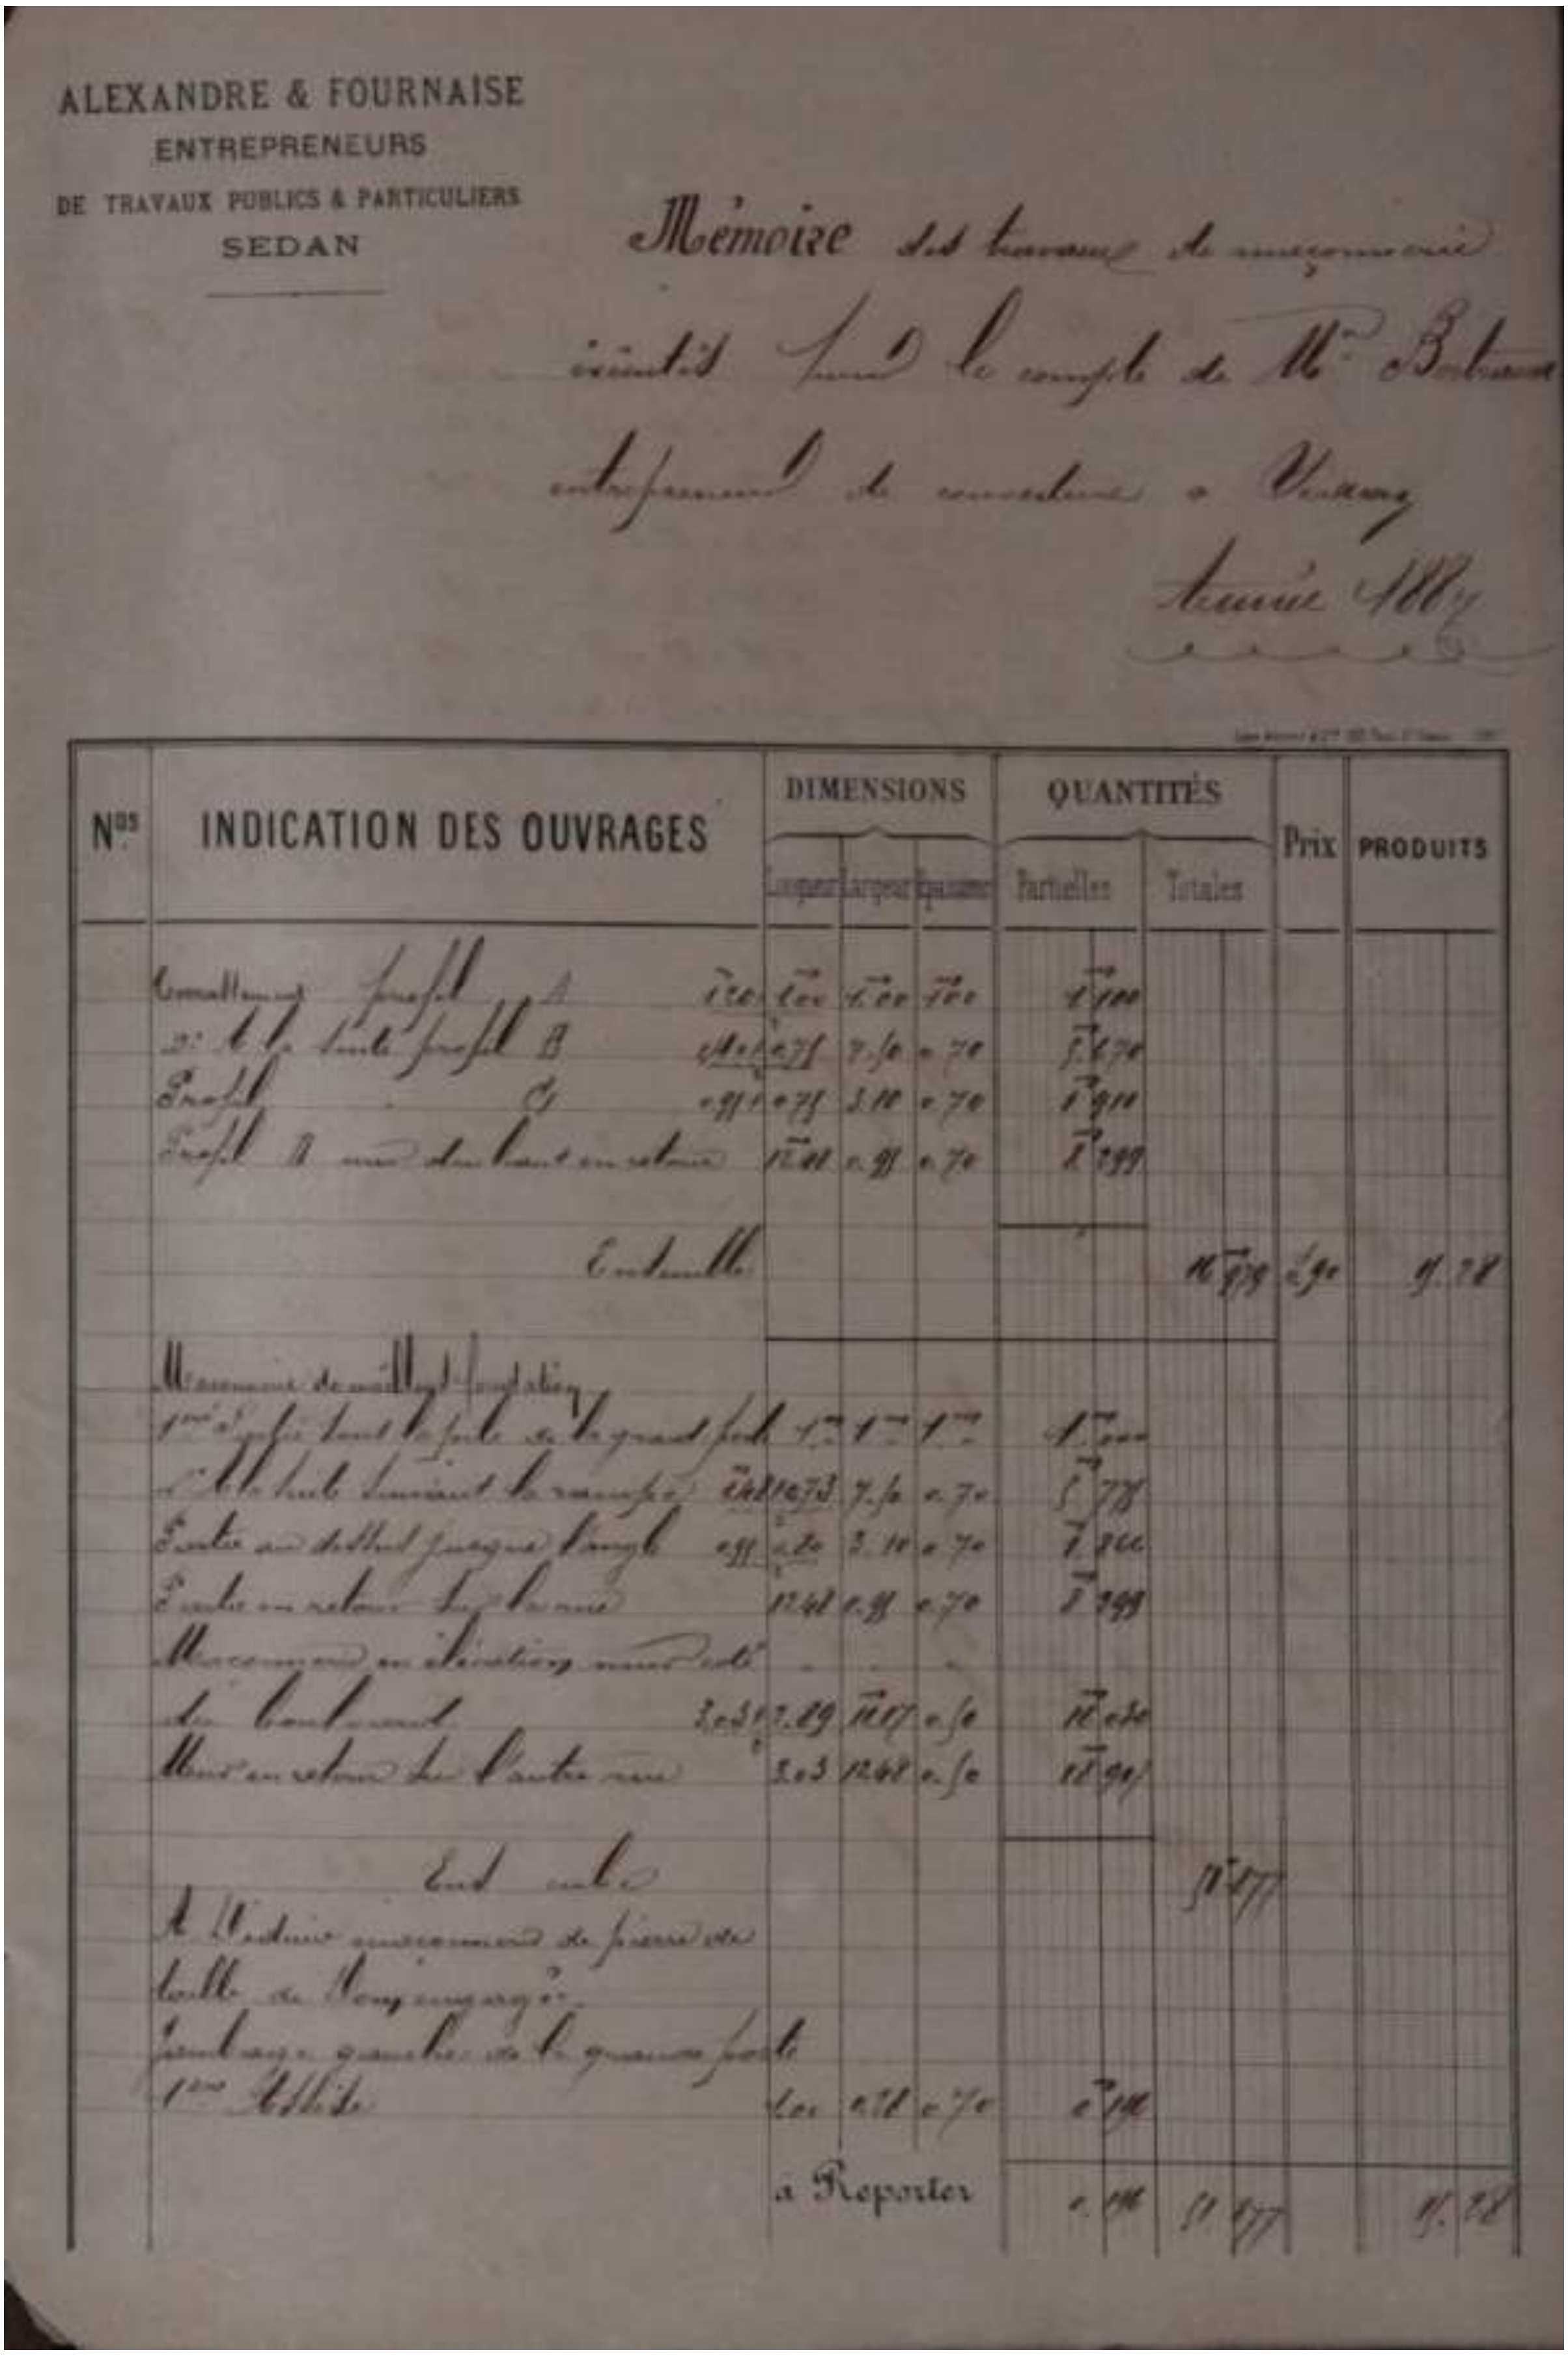

ALEXANDRE & FOURNAISE
ENTREPRENEURS
DE TRAVAUX PUBLICS & PARTICULIERS
SEDAN

Nos	INDICATION DES OUVRAGES	DIMENSIONS			QUANTITÉS		Prix	PRODUITS
		Longueur	Largeur	Épaisseur	Partielles	Totales		
	à Reporter							

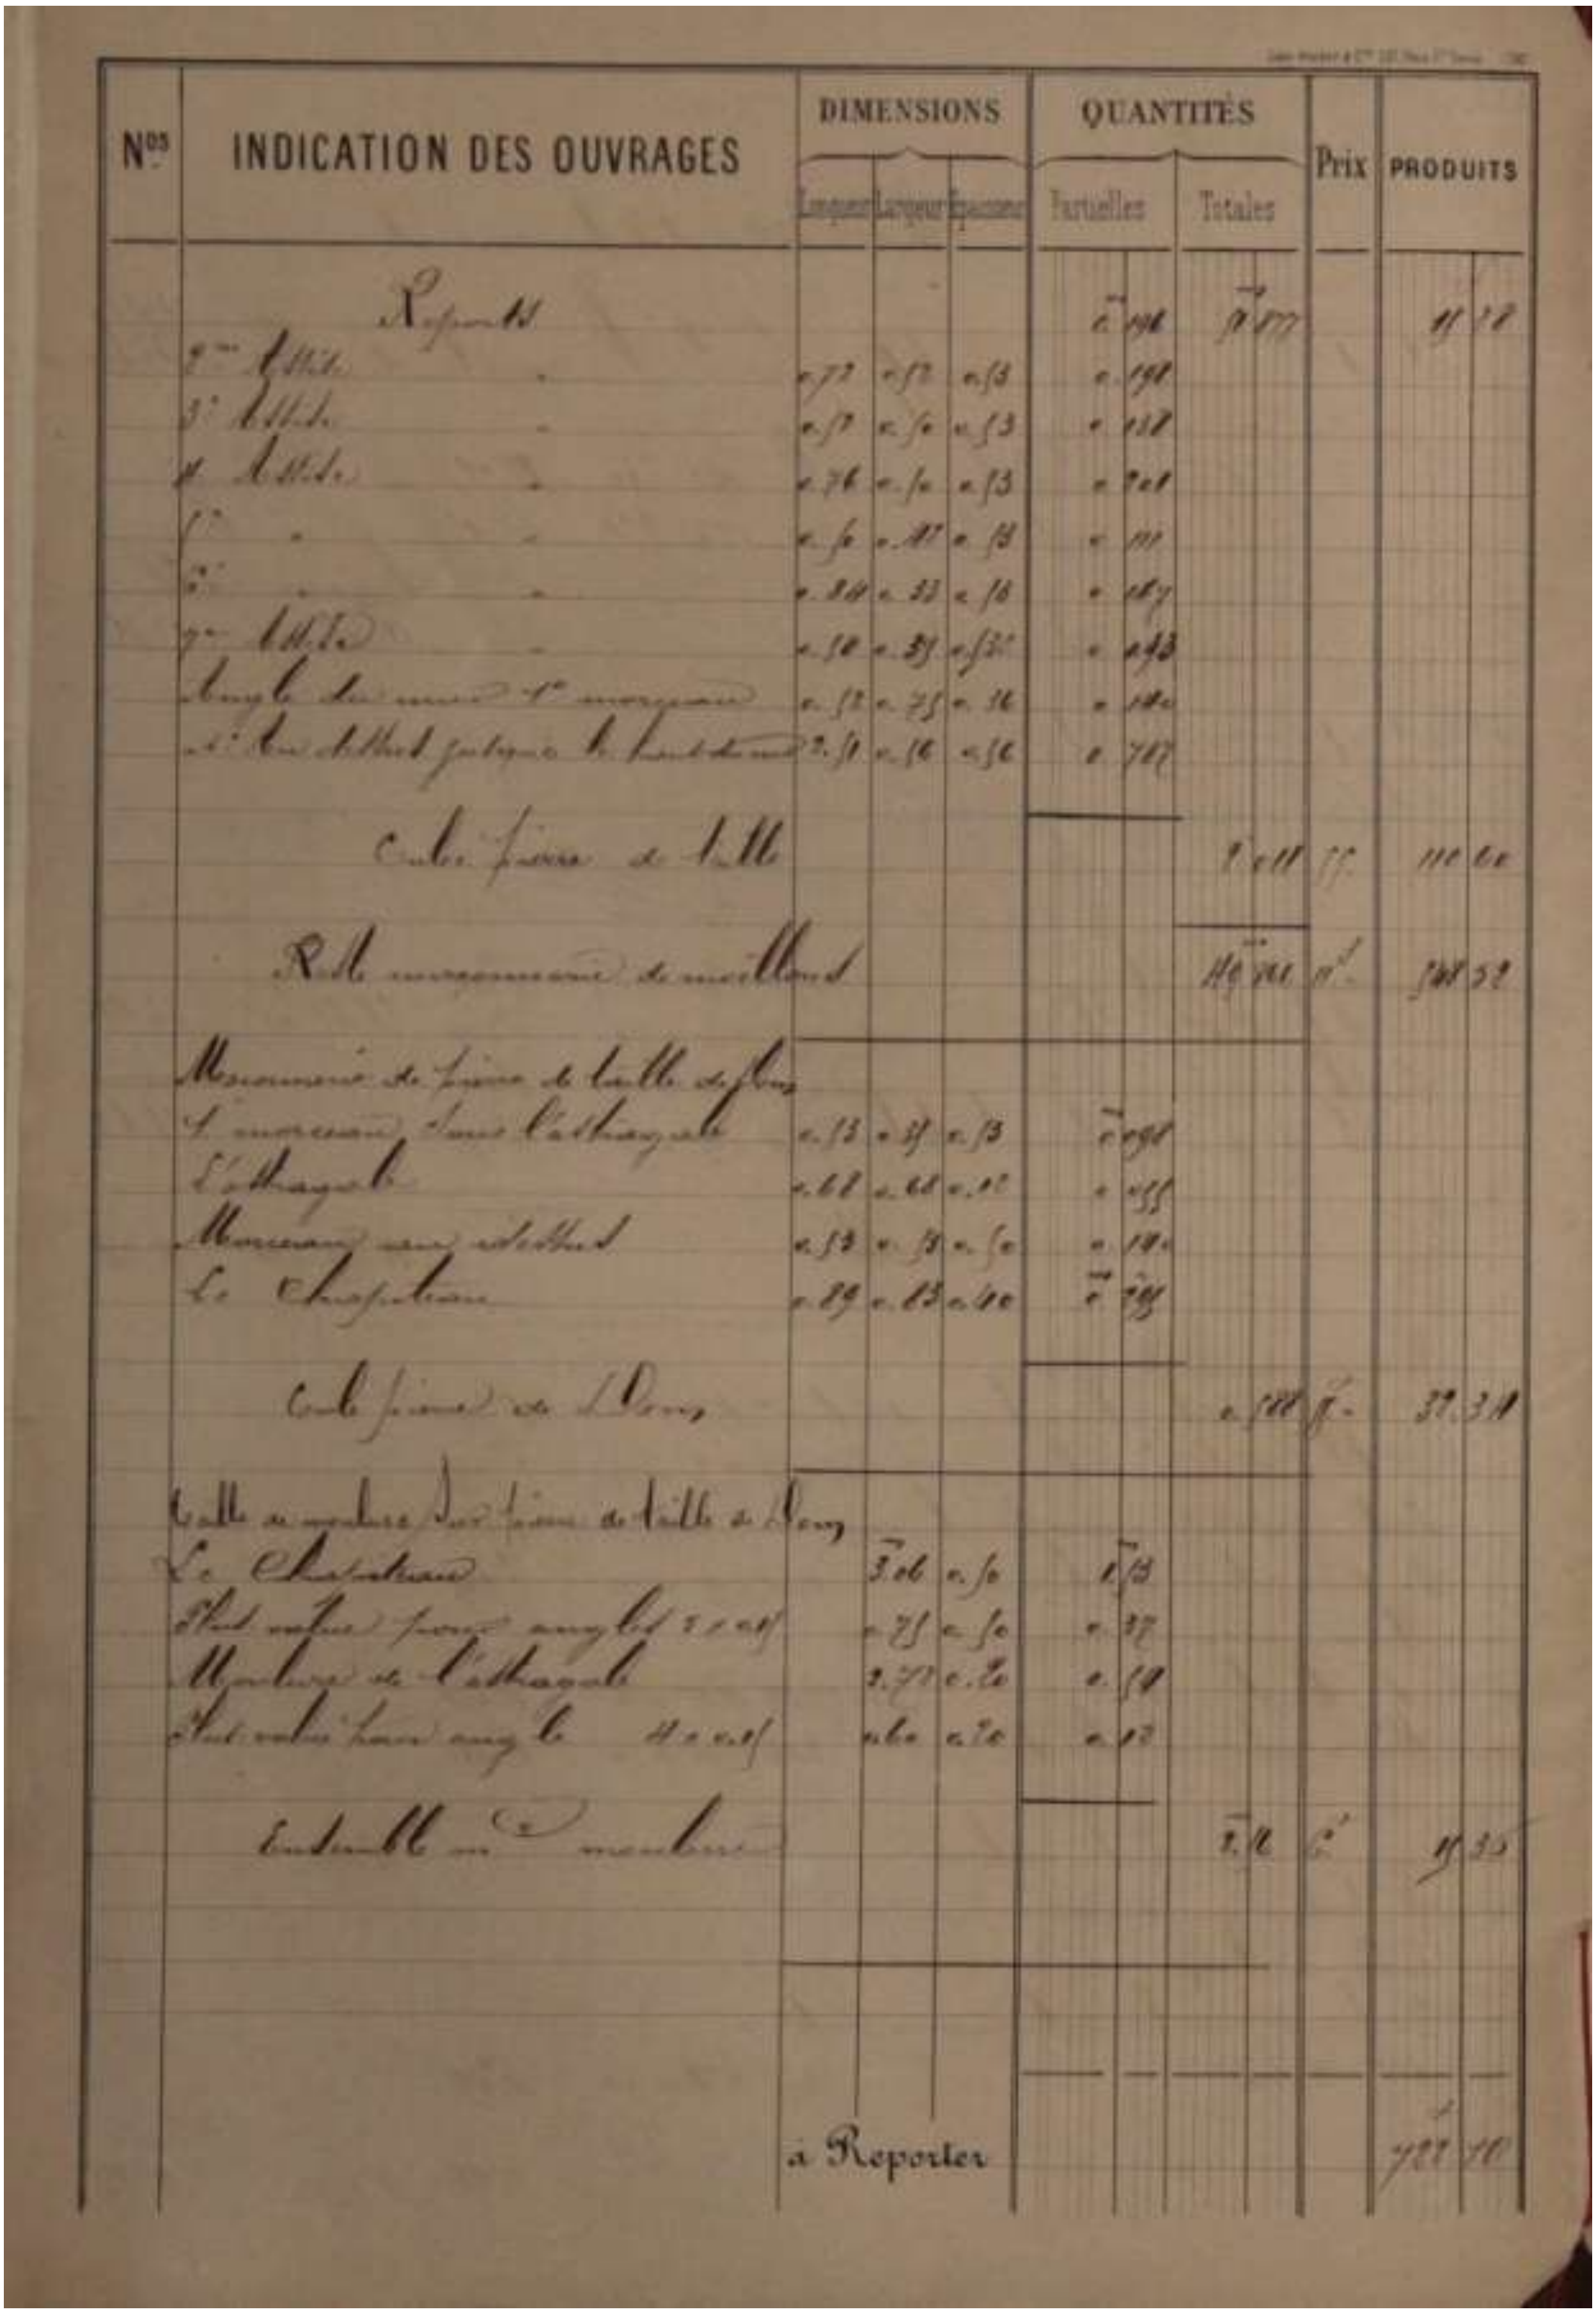

Nos	INDICATION DES OUVRAGES	DIMENSIONS Longueur	Largeur	Épaisseur	QUANTITÉS Partielles	Totales	Prix	PRODUITS
	Reporté				0.196	9.877		11.78
	2me [illegible]	0.72	0.52	0.53	0.198			
	3e [illegible]	0.57	0.50	0.53	0.152			
	4e [illegible]	0.76	0.50	0.53	0.201			
	5e	0.50	0.41	0.53	0.111			
	6e	0.84	0.33	0.56	0.157			
	7e [illegible]	0.50	0.39	0.52	0.093			
	Angle du mur 1er morceau	0.52	0.75	0.36	0.140			
	[illegible]	2.51	0.56	0.56	0.787			
	Cube pierre de taille					2.011	55	110.60
	[illegible] de moellons					14.761	16	218.52
	Maçonnerie de pierre de taille de [illegible]							
	[illegible]	0.53	0.37	0.53	0.098			
	[illegible]	0.68	0.68	0.12	0.055			
	[illegible]	0.53	0.53	0.50	0.140			
	[illegible]	0.89	0.83	0.40	0.295			
	Cube pierre de [illegible]					0.588	65	38.31
	Taille de [illegible] de pierre de taille de [illegible]							
	[illegible]		3.06	0.50	1.53			
	[illegible]		0.75	0.50	0.37			
	[illegible]		2.78	0.20	0.54			
	[illegible]		0.60	0.20	0.12			
	[illegible]					2.56	6	15.35
	à Reporter							722.10

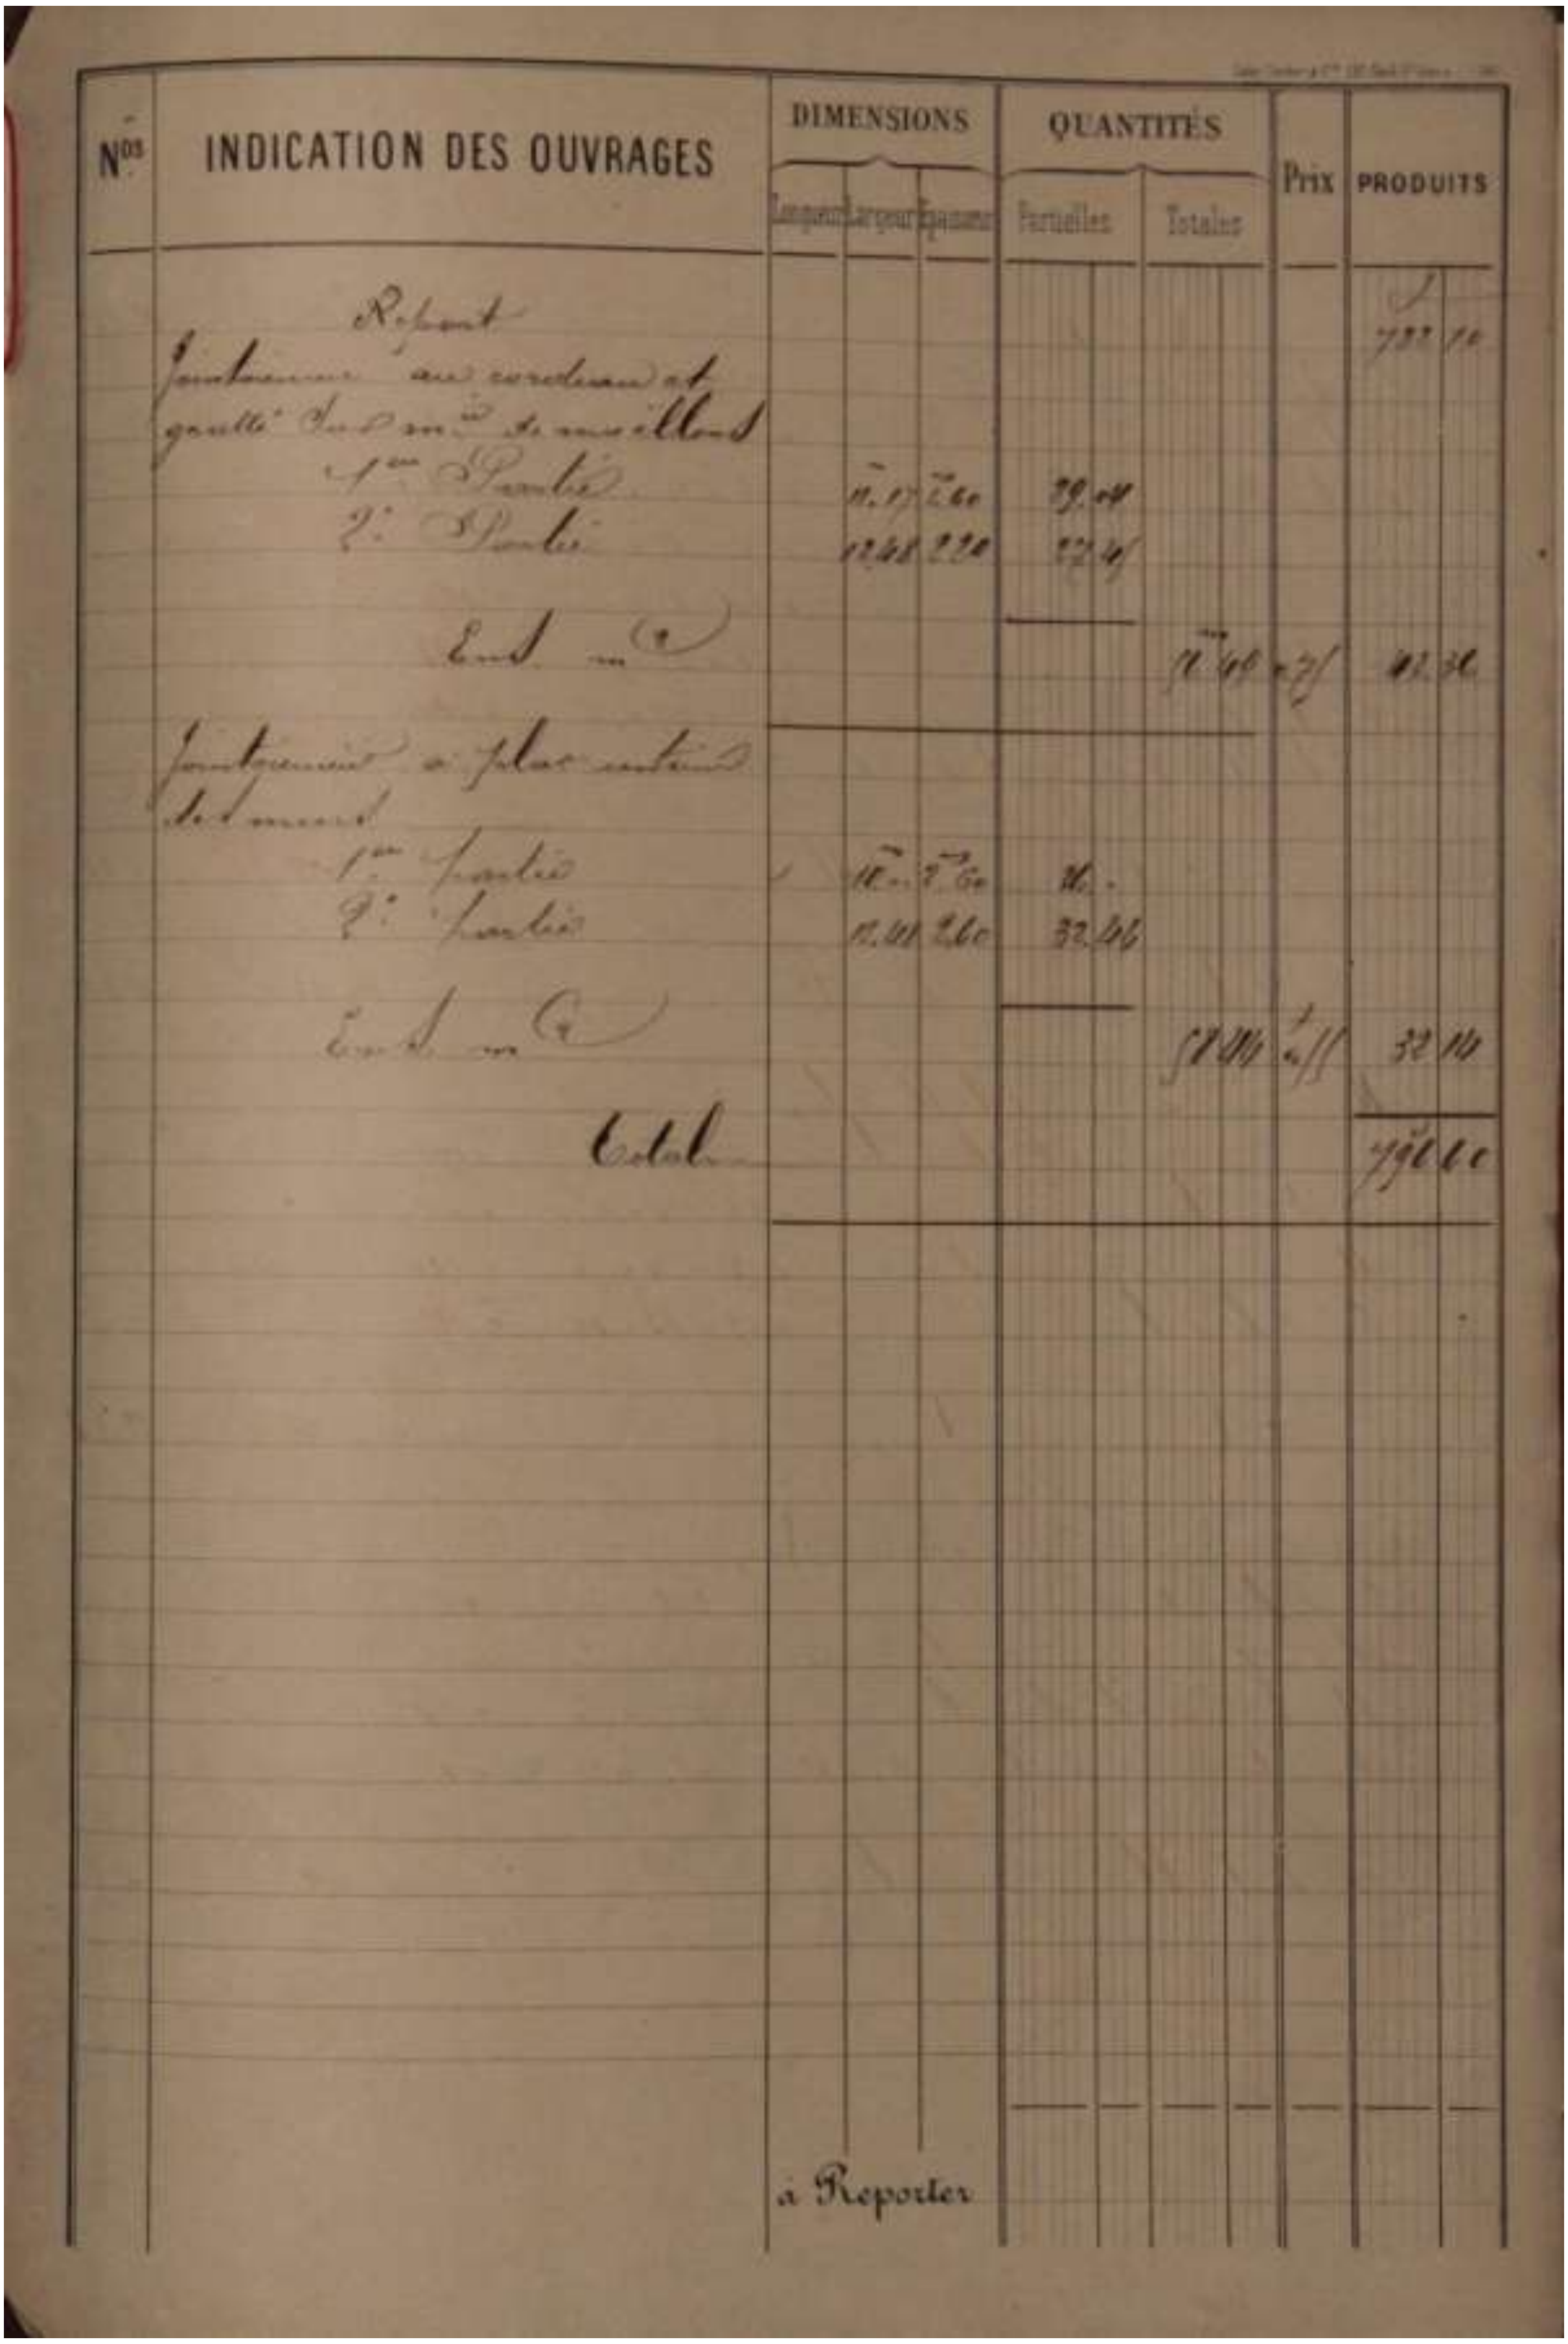

Nos	INDICATION DES OUVRAGES	DIMENSIONS Longueur	Largeur	Épaisseur	QUANTITÉS Partielles	Totales	Prix	PRODUITS
	Report							733.10
	Jointoiement au cordeau et goutte[illegible] de moellons							
	1re Partie	11.17	2.60		29.04			
	2e Partie	12.48	2.20		27.45			
	Ens. m²					56.49	0.75	42.36
	Jointoiement à plat [illegible] du mur							
	1re partie	10.—	2.60		26.—			
	2e partie	12.48	2.60		32.46			
	Ens. m²					58.46	0.55	32.14
	Total							7[illegible]8.60
	à Reporter							

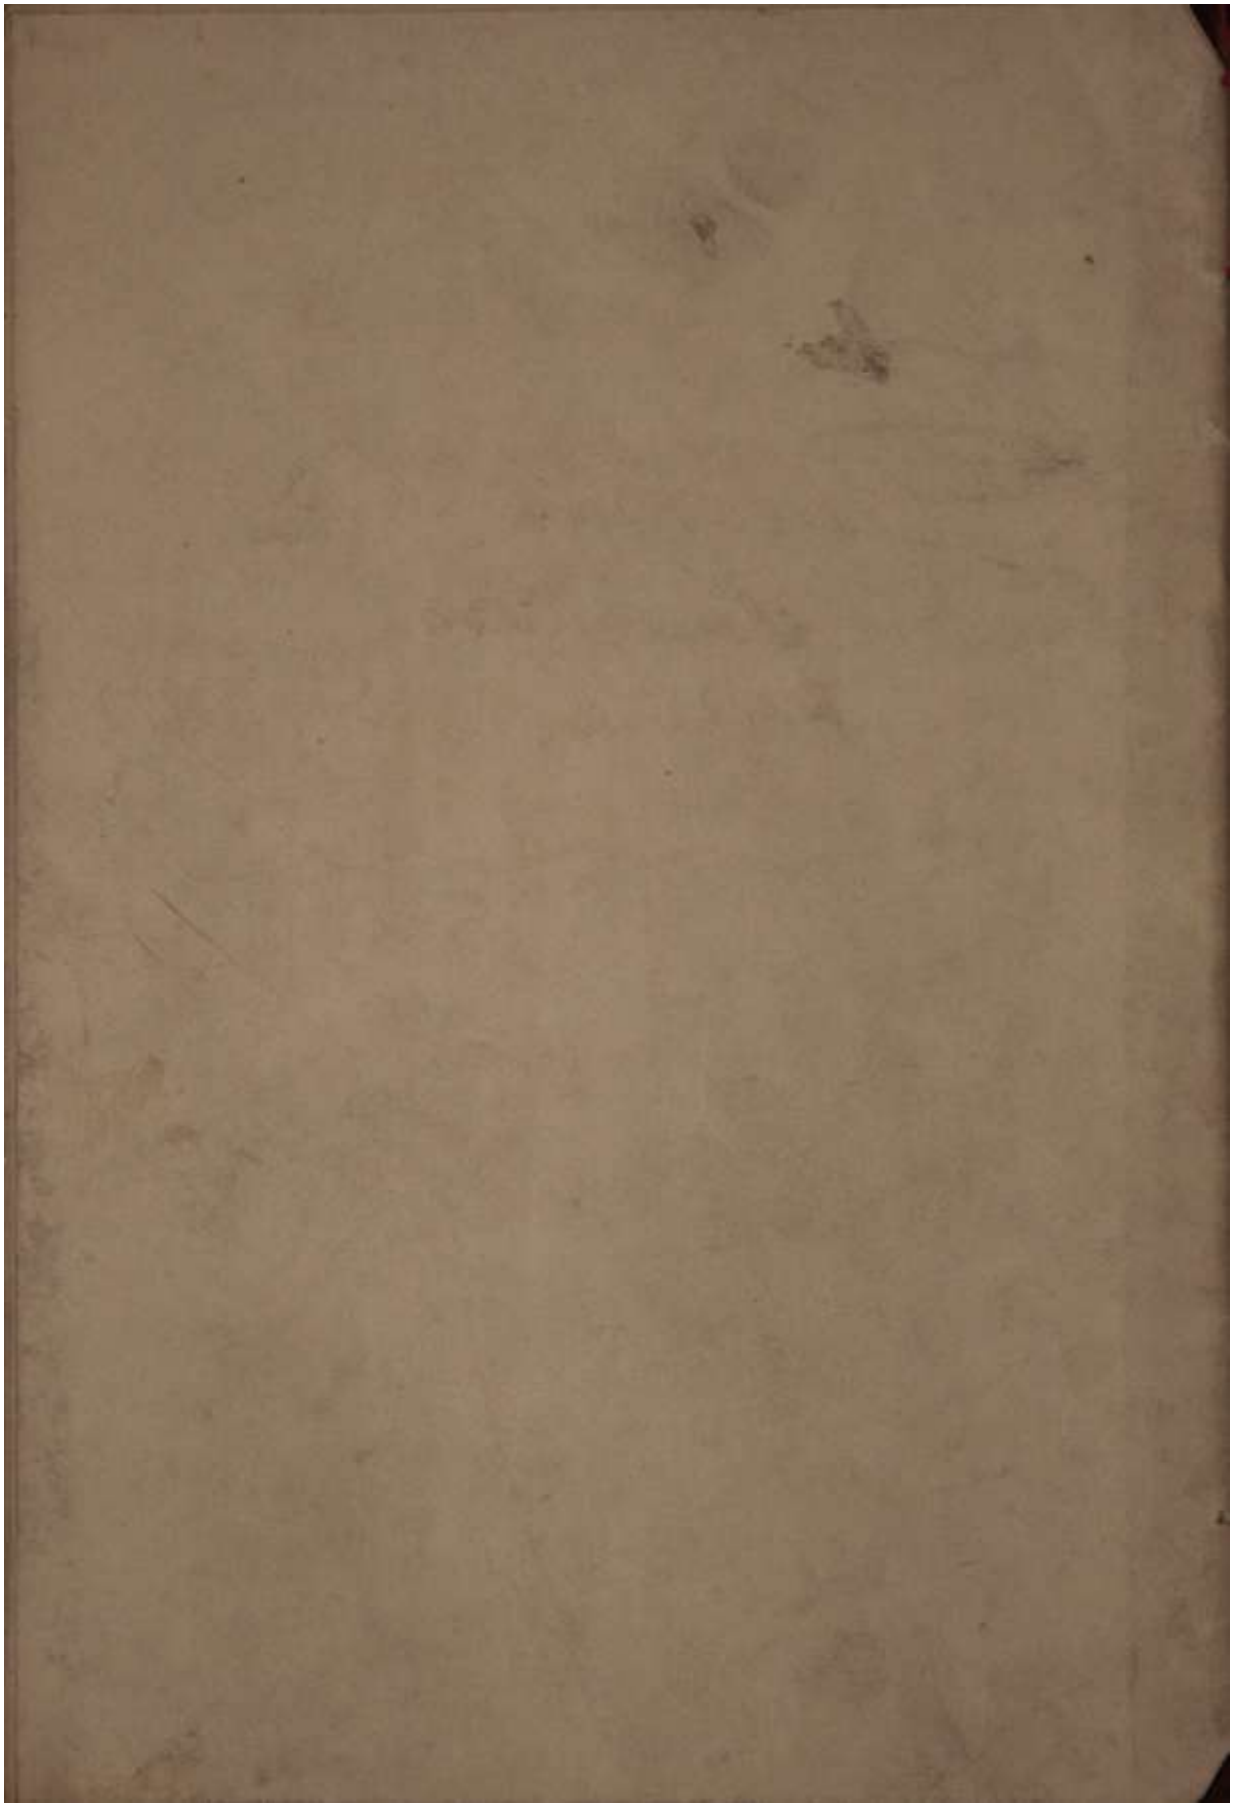

Construction d'un Lycée de Fille - Ville de Charleville

Détail estimatif des travaux

Année 1887.

Mr BERTRAND : entrepreneur de couverture à Sedan

ALEXANDRE & FOURNAISE entrepreneurs de travaux publics & particuliers à Sedan

Taille du document :
20.7 x 30.5

Nombre de pages:
17

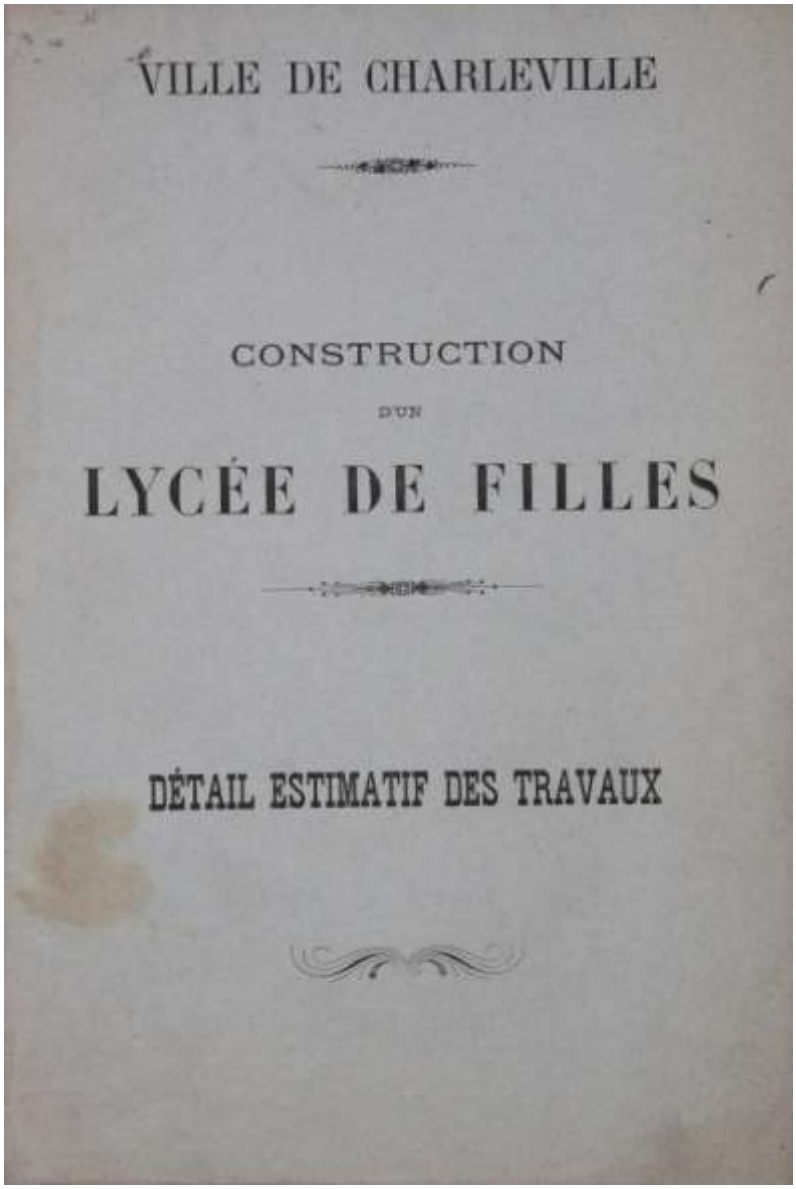
VILLE DE CHARLEVILLE

CONSTRUCTION

D'UN

LYCÉE DE FILLES

DÉTAIL ESTIMATIF DES TRAVAUX

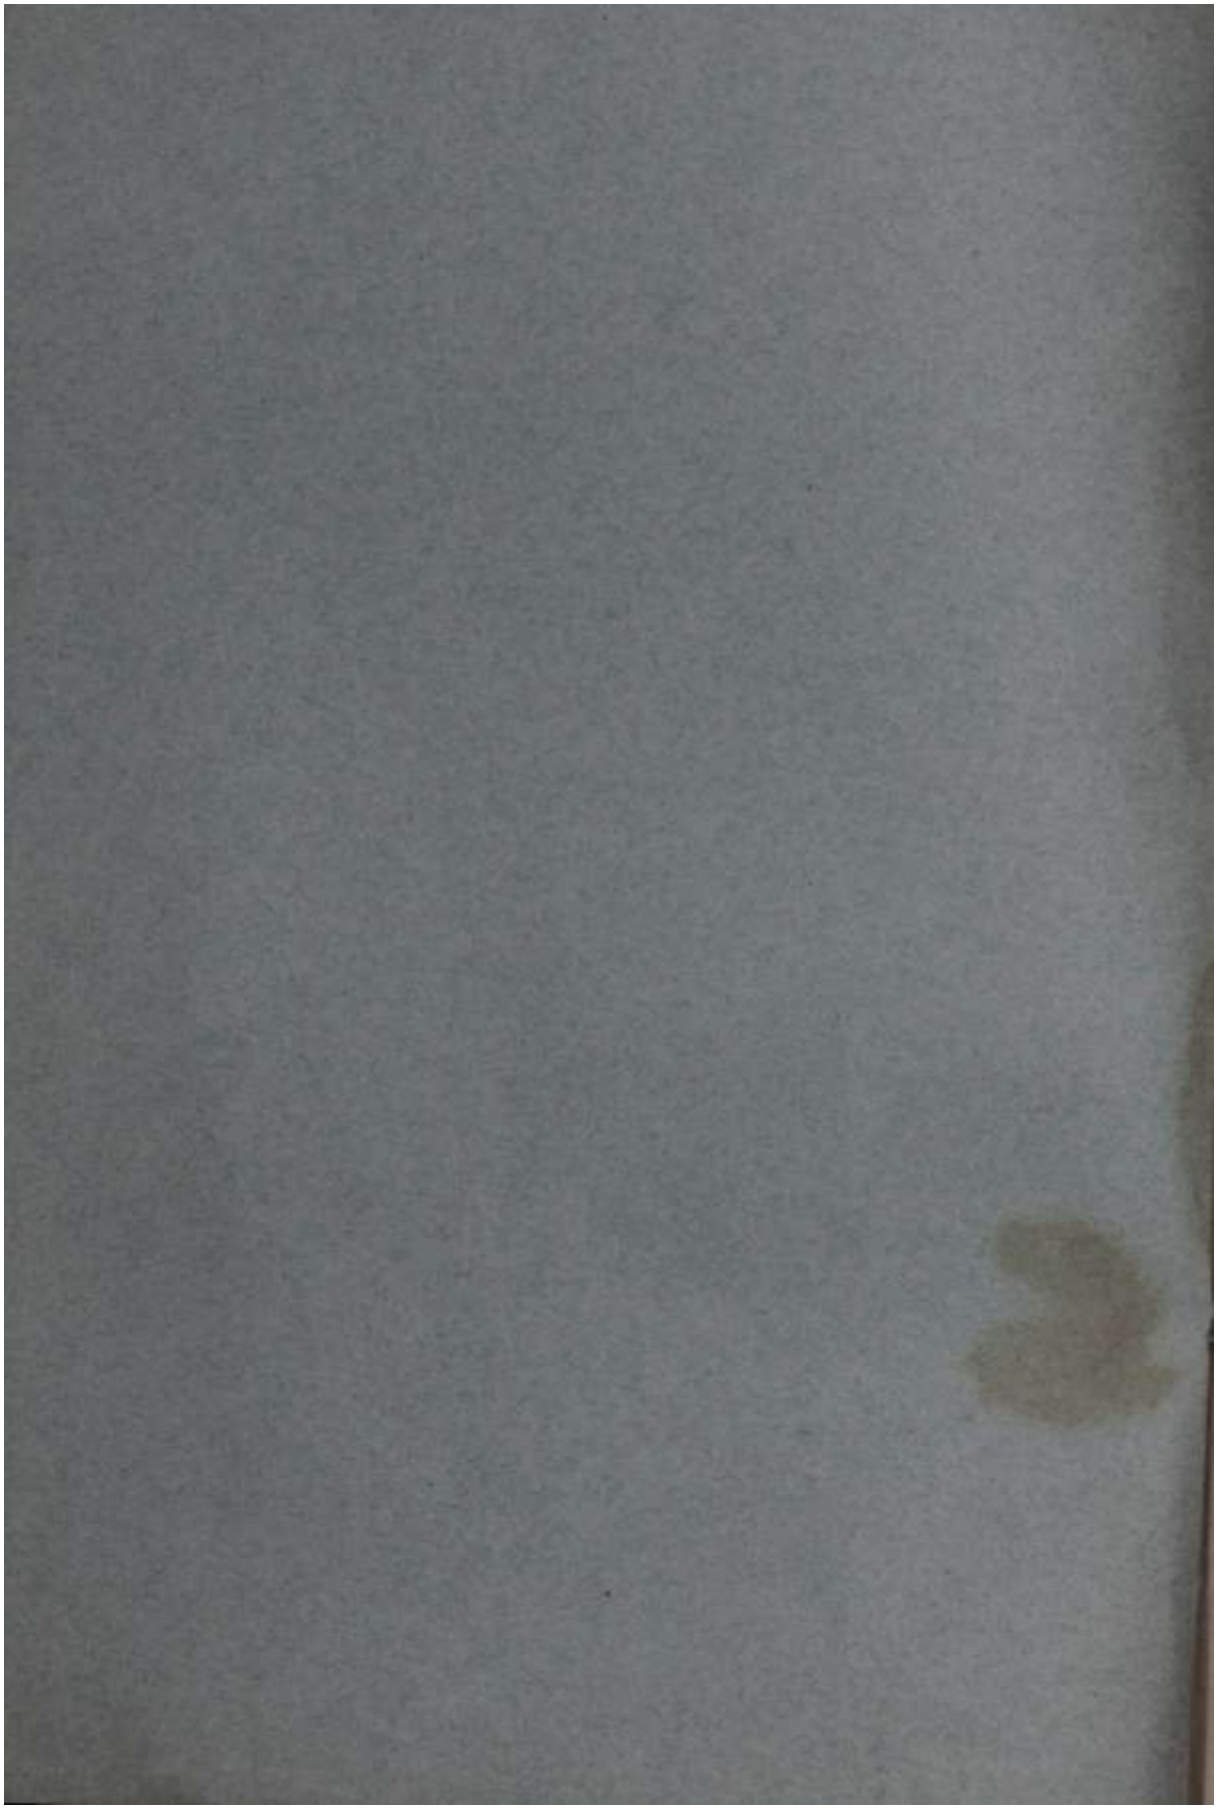

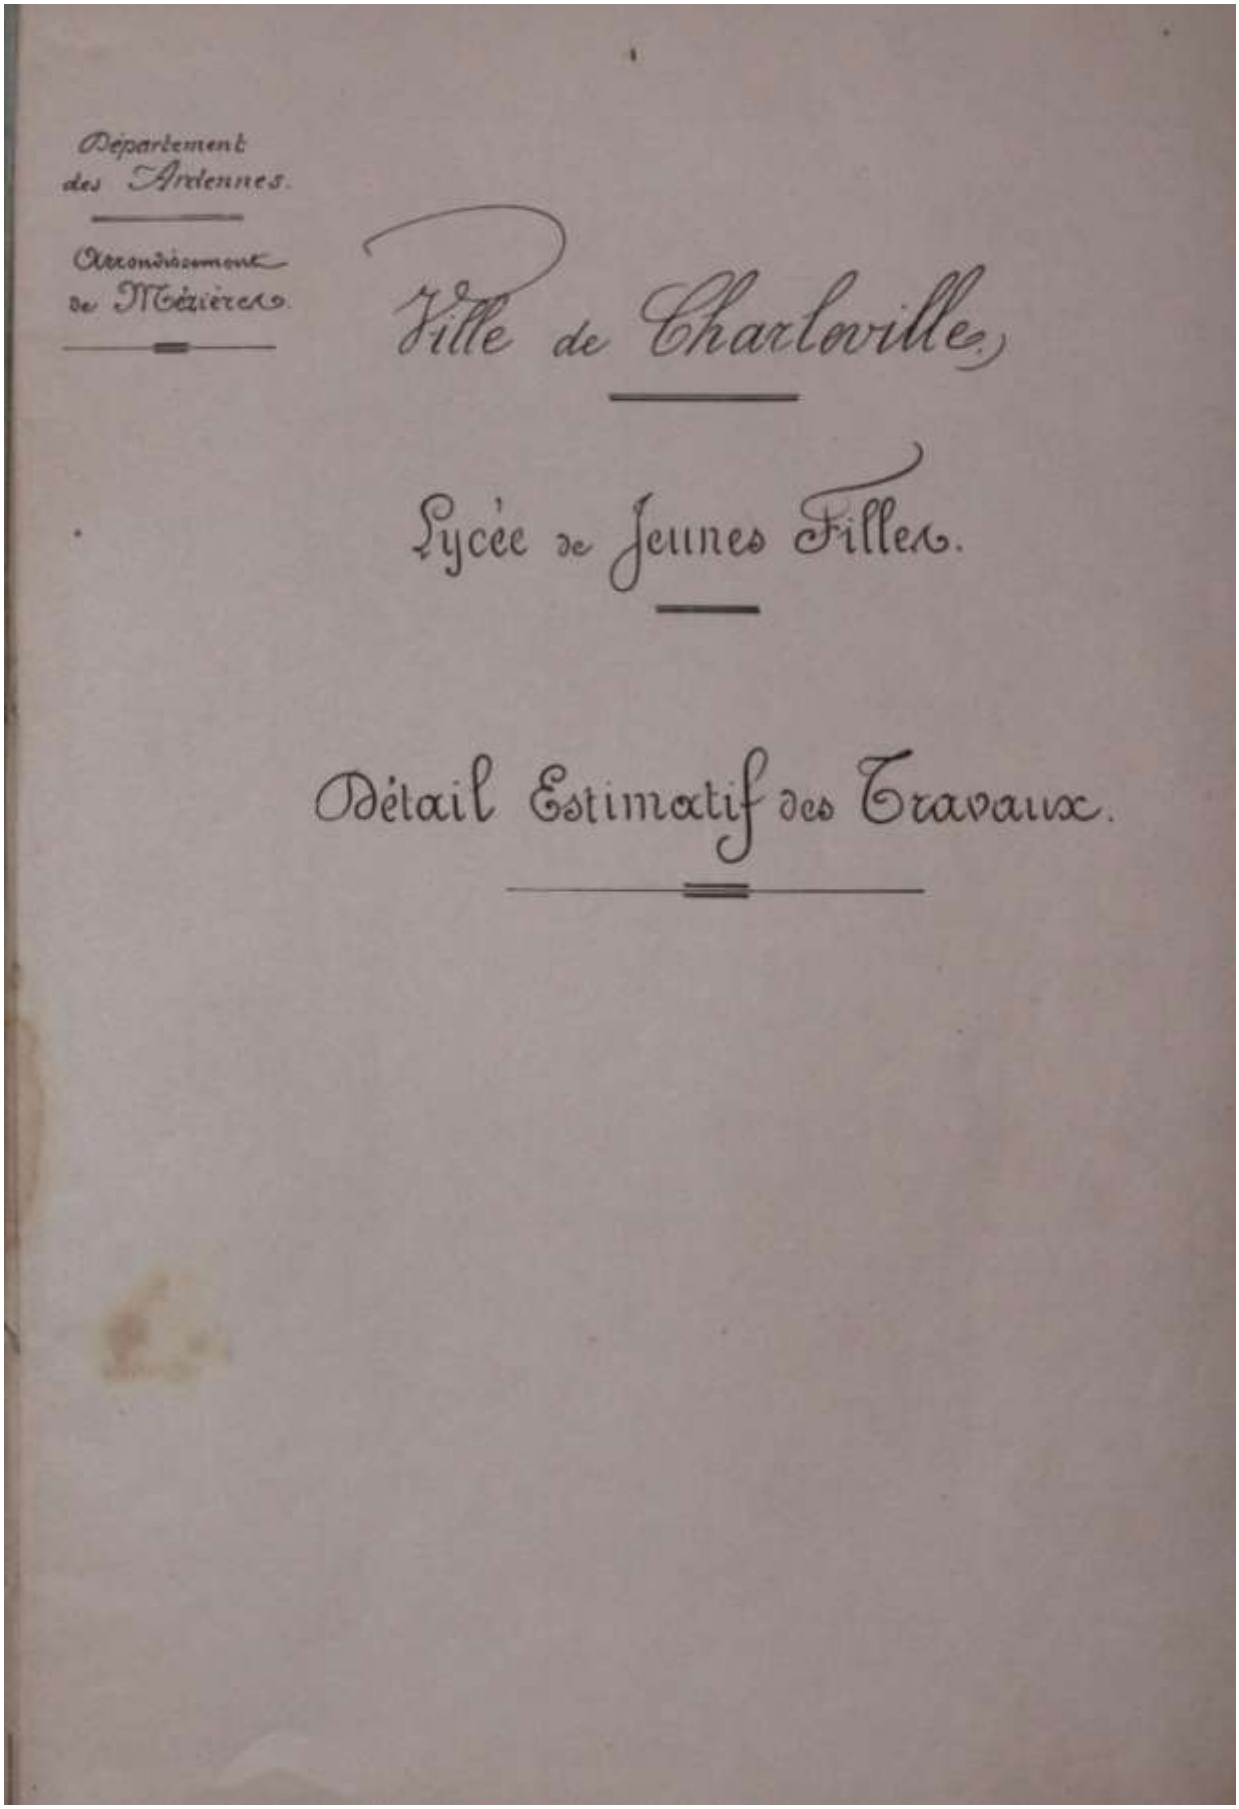

Département
des Ardennes.

Arrondissement
de Mézières.

Ville de Charleville.

Lycée de Jeunes Filles.

Détail Estimatif des Travaux.

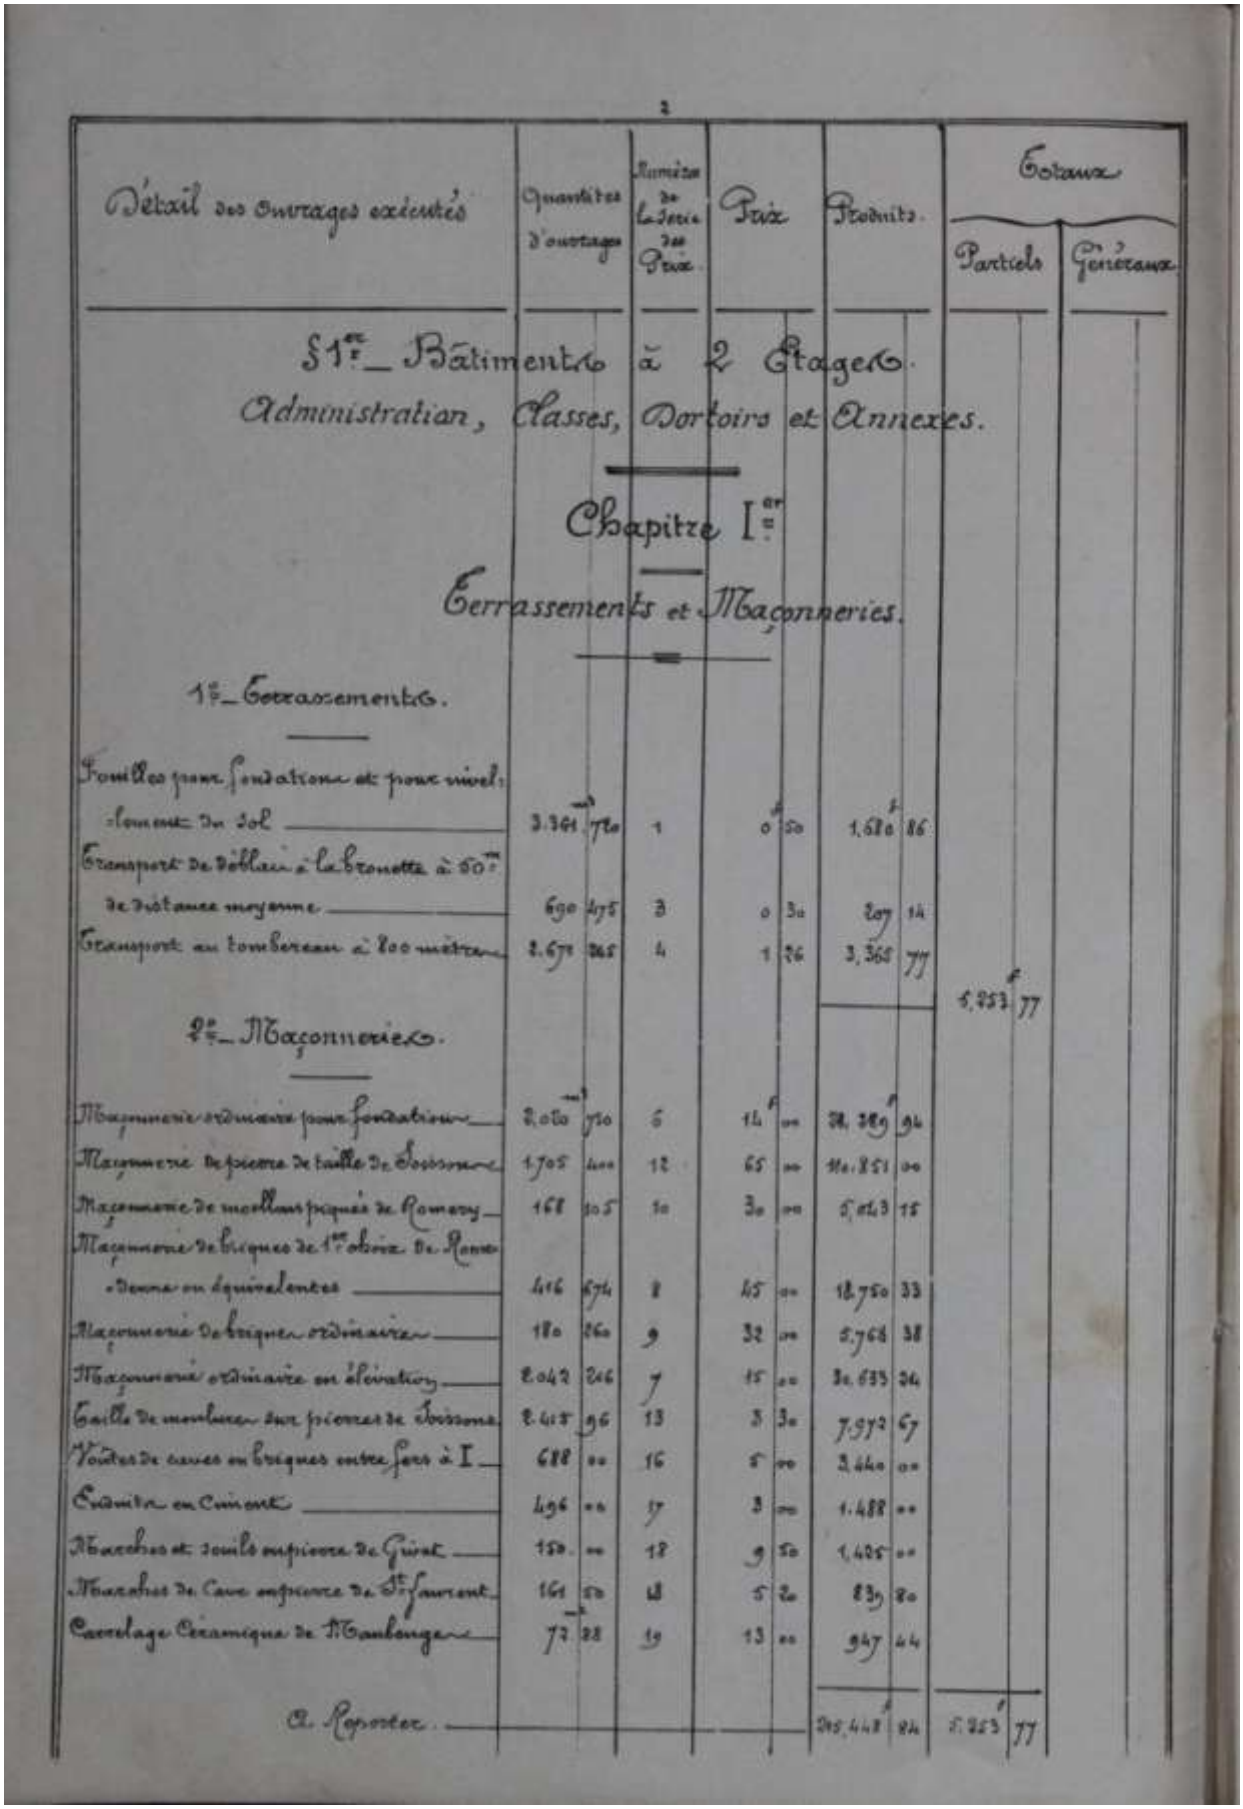

2

Détail des Ouvrages exécutés	Quantités d'ouvrages	Numéros de la Série des Prix	Prix	Produits	Totaux Partiels	Totaux Généraux
§ 1er — Bâtiments à 2 Étages. Administration, Classes, Dortoirs et Annexes.						
Chapitre Ier — Terrassements et Maçonneries.						
1° — Terrassements.						
Fouilles pour fondations et pour nivellement du sol	3.361 m³ 720	1	0 f 50	1,680 f 86		
Transport de déblais à la brouette à 50 m de distance moyenne	690 475	3	0 30	207 14		
Transport au tombereau à 800 mètres	2.671 245	4	1 26	3,365 77		
					5,253 f 77	
2° — Maçonneries.						
Maçonnerie ordinaire pour fondations	2,020 m³ 710	6	14 f 00	28,289 f 94		
Maçonnerie de pierre de taille de Soissons	1.705 400	12	65 00	110.851 00		
Maçonnerie de moellons piqués de Romery	168 105	10	30 00	5,043 15		
Maçonnerie de briques de 1er choix de Romedenne ou équivalentes	416 674	8	45 00	18.750 33		
Maçonnerie de briques ordinaires	180 260	9	32 00	5.768 38		
Maçonnerie ordinaire en élévation	2.042 216	7	15 00	30.633 24		
Taille de moulures sur pierres de Soissons	2.415 96	13	3 30	7.972 67		
Voûtes de caves en briques entre fers à I	688 00	16	5 00	3.440 00		
Enduits en Ciment	496 00	17	3 00	1.488 00		
Marches et seuils en pierre de Givet	150 00	18	9 50	1,425 00		
Marches de Cave en pierre de St Laurent	161 50	18	5 20	839 80		
Carrelage Céramique de Maubeuge	72 m² 88	19	13 00	947 44		
A Reporter				215,448 f 84	5,253 f 77	

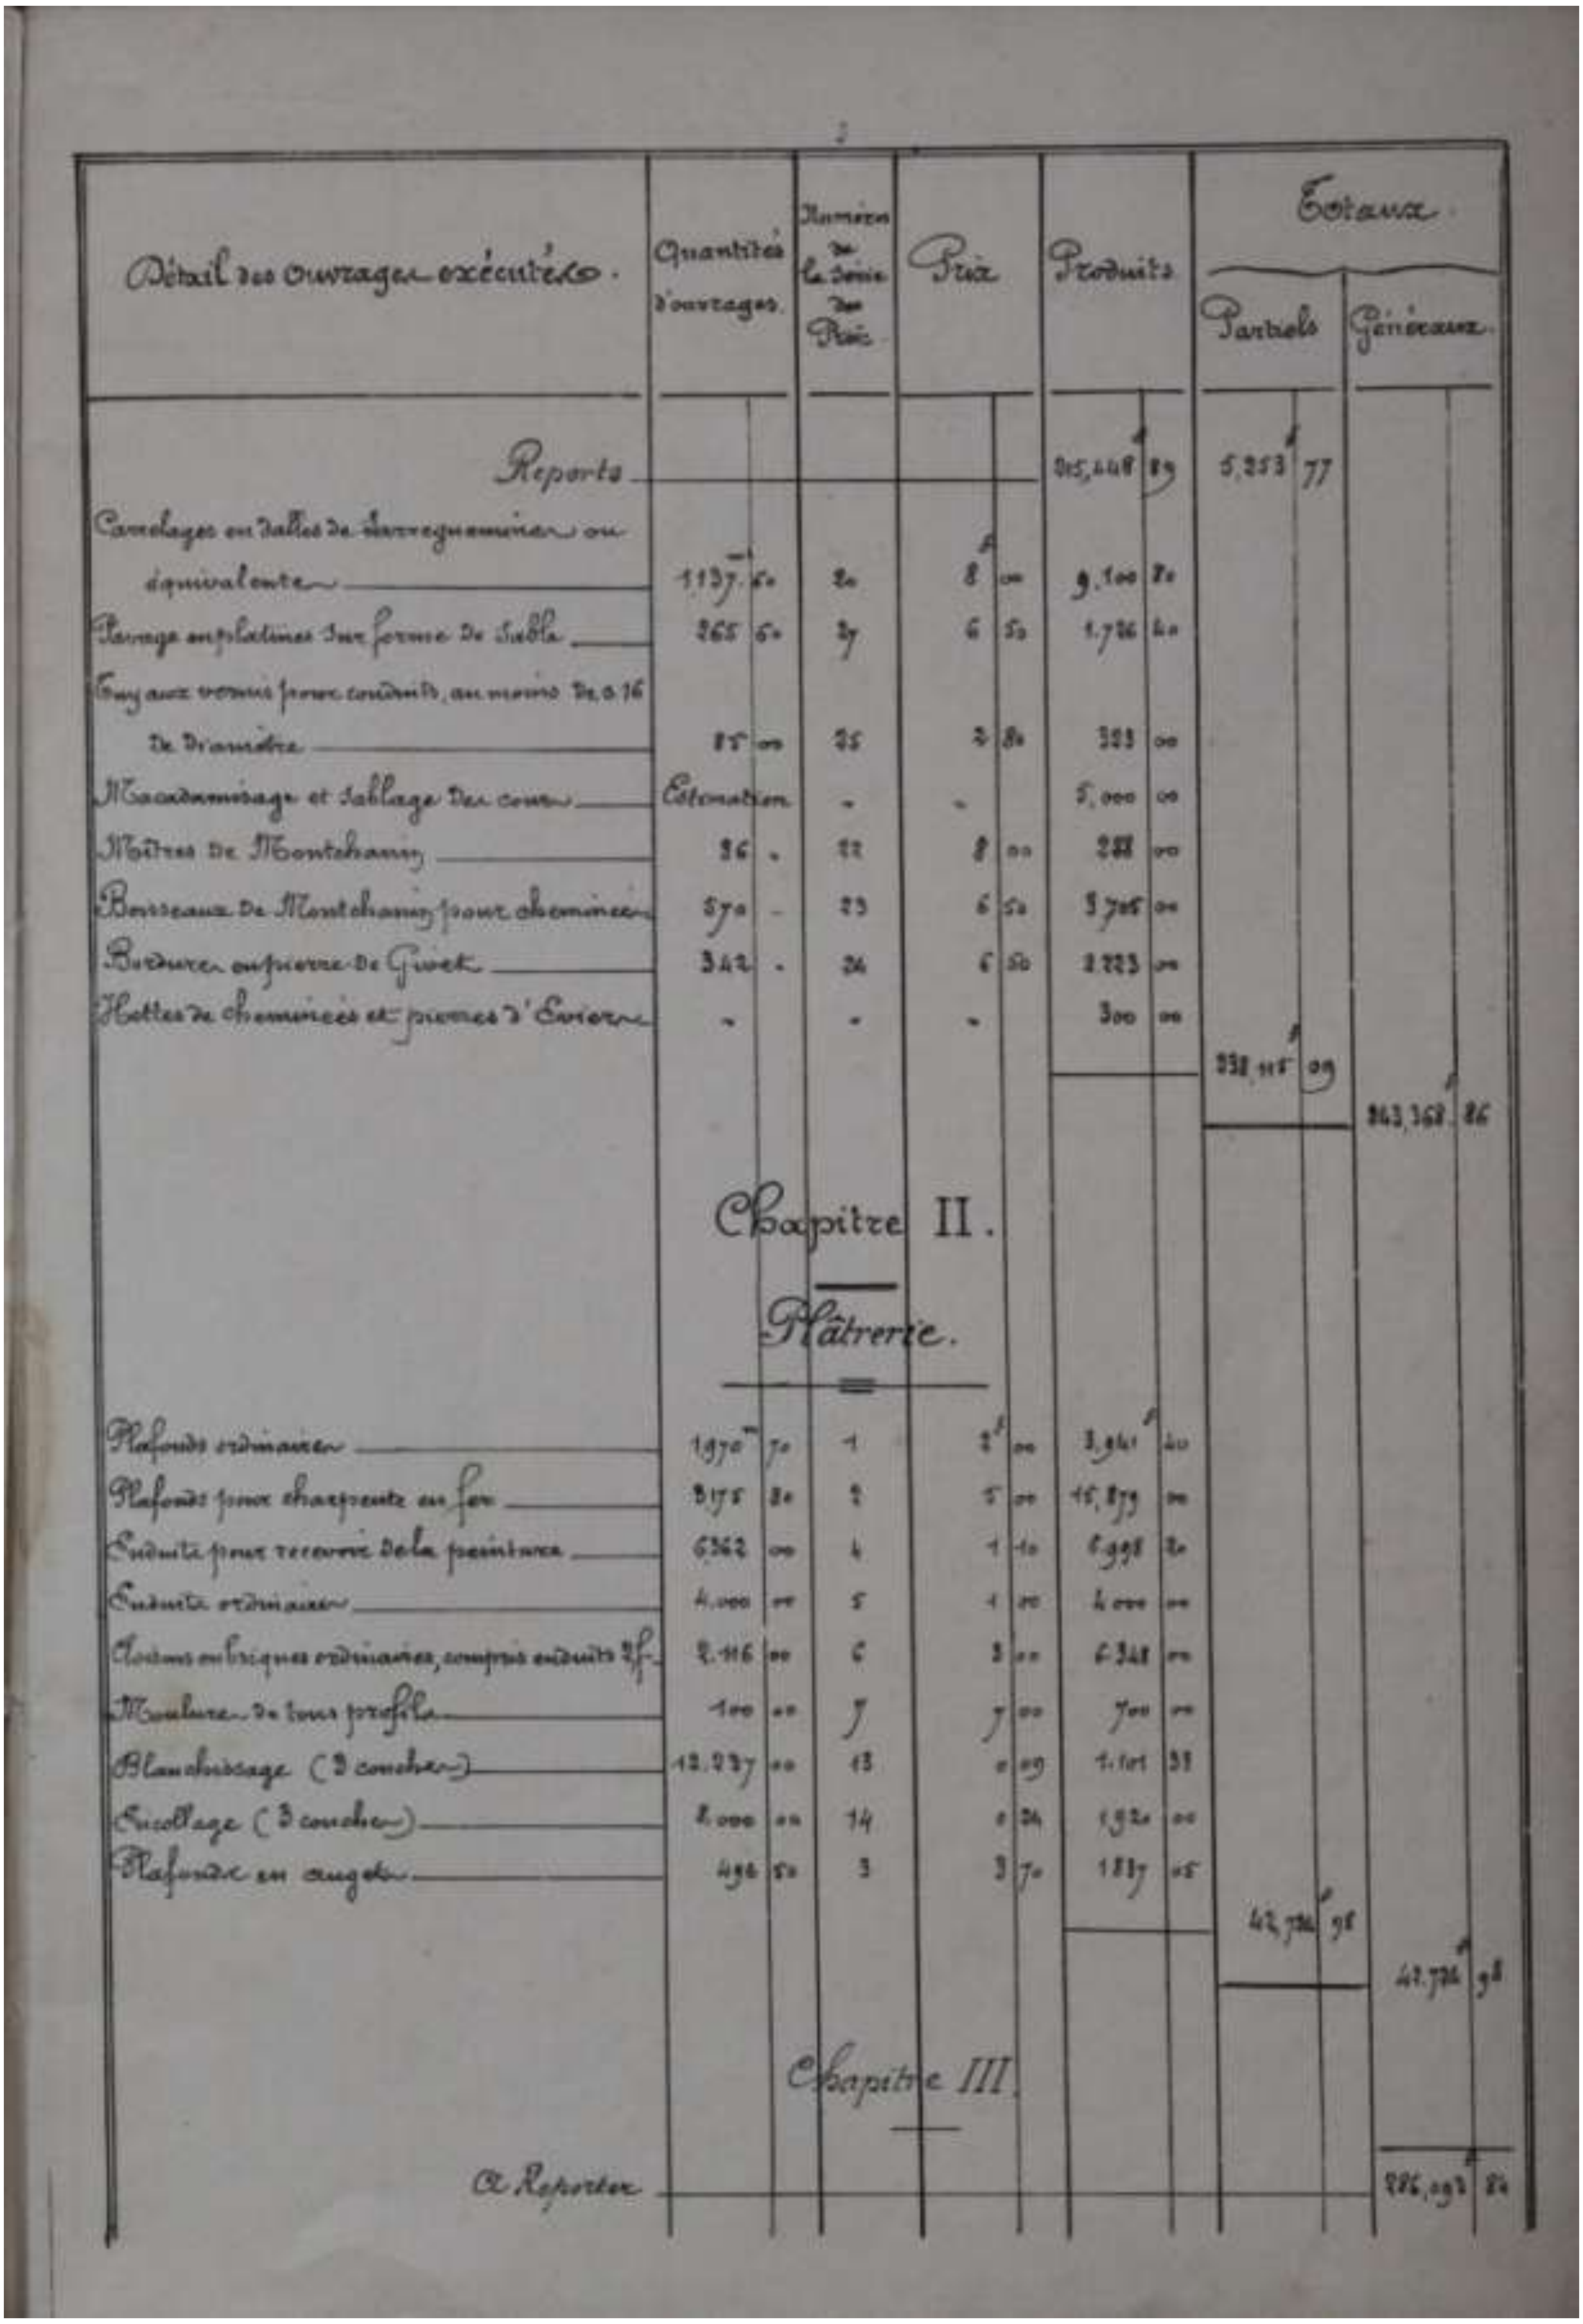

Détail des ouvrages exécutés.	Quantités d'ouvrages.	Numéros de la Série des Prix	Prix	Produits	Totaux Partiels	Totaux Généraux.
Reports				315,448 89	5,253 77	
Carrelages en dalles de Sarreguemines ou équivalente	1137 60	20	8 00	9,100 80		
Pavage en platines sur forme de sable	265 60	37	6 50	1,726 40		
Tuyaux vernis pour conduits, au moins de 0.16 de diamètre	85 00	35	3 80	323 00		
Macadamisage et sablage des cours	Estimation	-	-	5,000 00		
Mitres de Montchanin	36 .	22	8 00	288 00		
Boisseaux de Montchanin pour cheminées	570 -	23	6 50	3,705 00		
Bordures en pierre de Givet	342 .	36	6 50	2,223 00		
Hottes de cheminées et pierres d'Evier	-	-	-	300 00		
					338,115 09	
						343,368 86

Chapitre II.

Plâtrerie.

Détail des ouvrages exécutés.	Quantités d'ouvrages.	Numéros de la Série des Prix	Prix	Produits	Totaux Partiels	Totaux Généraux.
Plafonds ordinaires	1970 70	1	2 00	3,941 40		
Plafonds pour charpente en fer	3175 80	2	5 00	15,879 00		
Enduits pour recevoir de la peinture	6362 00	4	1 10	6,998 20		
Enduits ordinaires	4,000 00	5	1 00	4,000 00		
Cloisons en briques ordinaires, compris enduits 2 f.	2,116 00	6	3 00	6,348 00		
Moulure de tous profils	100 00	7	7 00	700 00		
Blanchissage (3 couches)	12,237 00	13	0 09	1,101 33		
Encollage (3 couches)	8,000 00	14	0 24	1,920 00		
Plafonds en augets	496 50	3	3 70	1837 05		
					42,724 98	
						42,724 98

Chapitre III.

A Reporter						386,093 84

4

Détail des Ouvrages exécutés	Quantités d'ouvrages	Numéros de la Série des Prix	Prix	Produits	Totaux Partiels	Totaux Généraux
Report						286,093 84
Chapitre III. Charpente.						
Charpente en sapin avec assemblage	67 184	3	80 00	5.374 72		
— d° — sans assemblage	283 735	4	75 00	21,280 12		
Charpente en chêne	96 506	1	120 00	11,580 72		
Escaliers des élèves à la marche, compris rampe et main-courante	300	9	35 00	10.500 00		
Escaliers des logements — d° — compris rampe	146	8	18 00	2,628 00		
Escaliers des greniers — d°	144	7	5 50	792 00		
Lucarnes (charpente)	42	Estimation	10 00	420 00		
					52,575 56	
						52,575 56
Chapitre IV. Couverture.						
Couverture en ardoises à crochets	3529 50	2	3 50	12,353 25		
Chassis à tabatière	80	3	20 00	1.600 00		
Lucarnes	42	Estimation	10 00	420 00		
					14,373 25	
						14,373 25
Chapitre V. Ferblanterie. — Zincage.						
Fonds de noues en zinc	60 60	1	7 00	424 20		
à Reporter				424 20		353,042 65

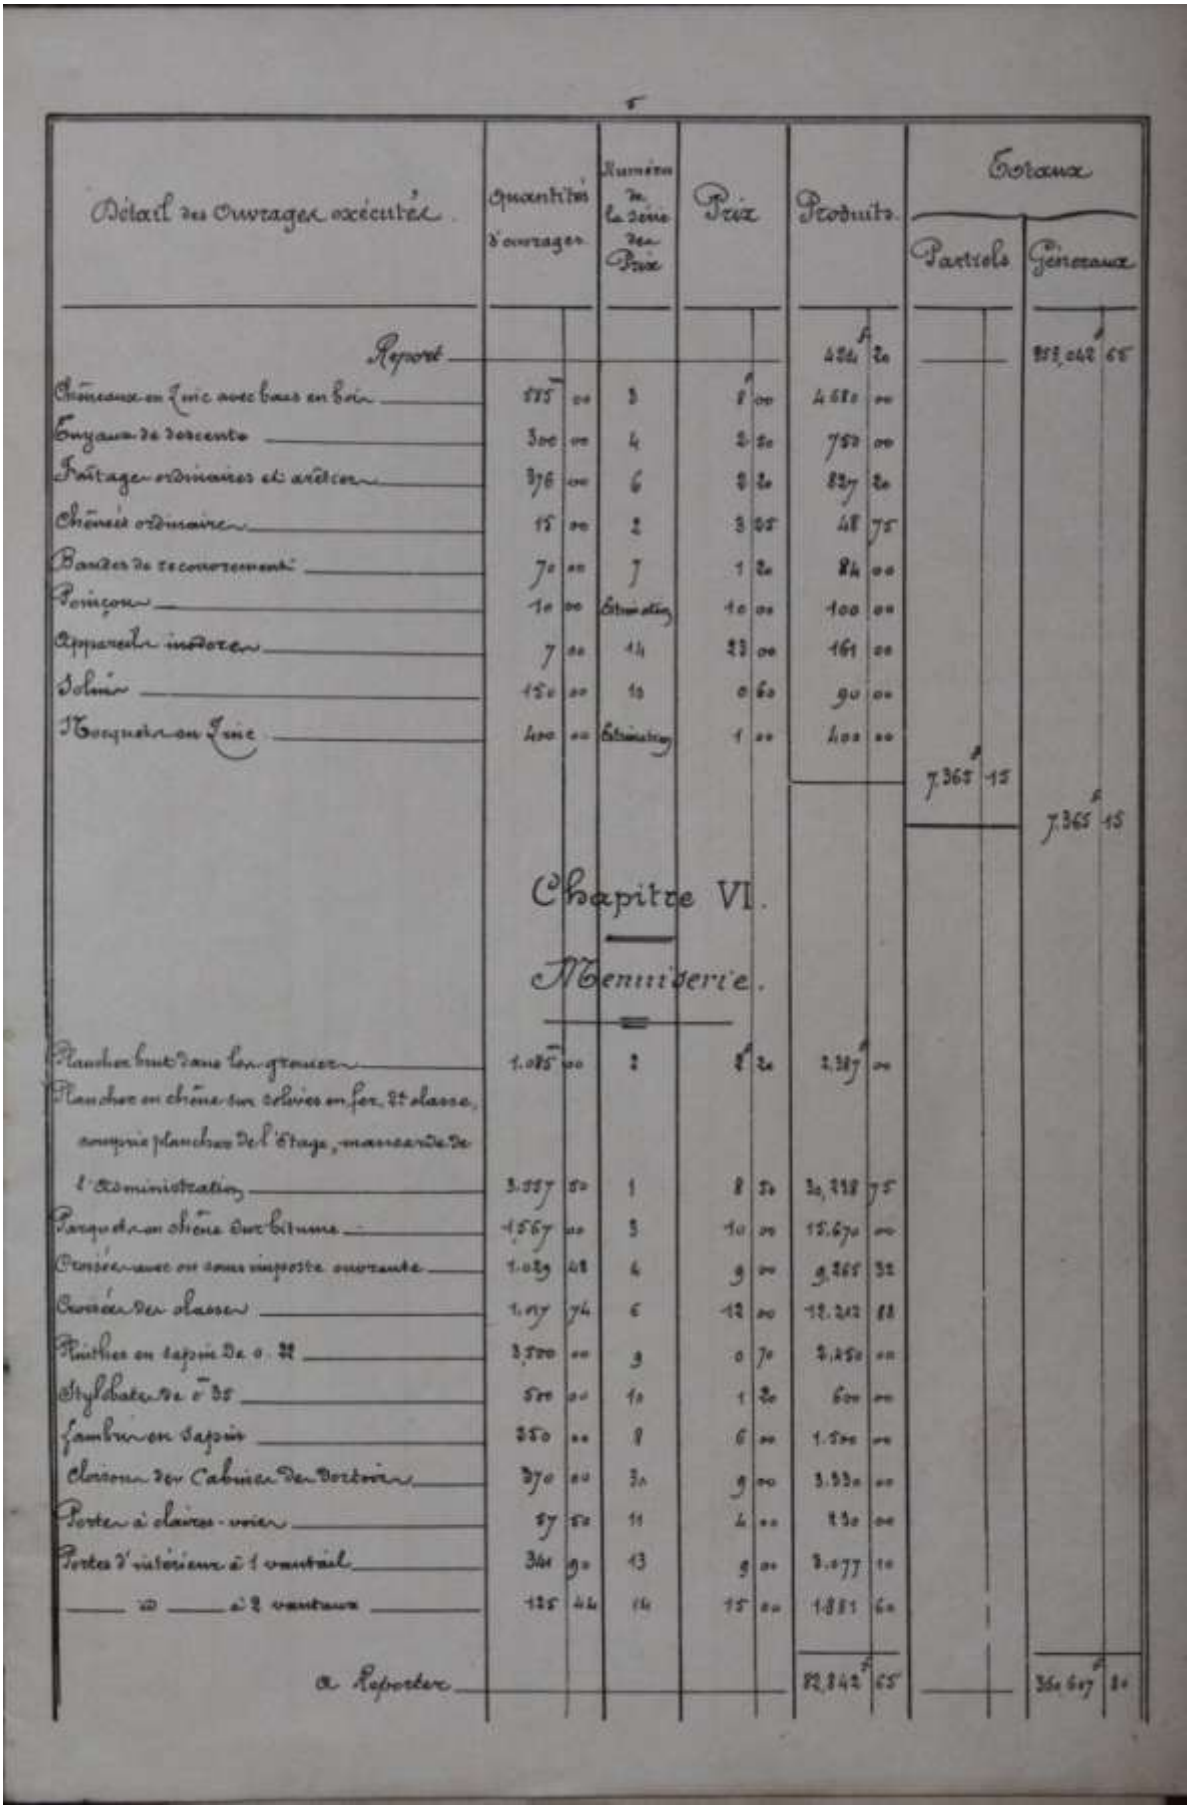

Détail des Ouvrages exécutés	Quantités d'ouvrages		Numéro de la série des Prix	Prix		Produits		Totaux Partiels		Totaux Généraux	
Report						424f	20			353,042f	65
Chéneaux en Zinc avec bacs en bois	585m	00	3	8f	00	4680	00				
Tuyaux de descente	300	00	4	2	50	750	00				
Faîtages ordinaires et arêtiers	376	00	6	2	20	827	20				
Chênées ordinaires	15	00	2	3	25	48	75				
Bandes de recouvrement	70	00	7	1	20	84	00				
Poinçons	10	00	Estimation	10	00	100	00				
Appareils inodores	7	00	14	23	00	161	00				
Solins	150	00	10	0	60	90	00				
Noquets en Zinc	400	00	Estimation	1	00	400	00				
								7.365f	15		
										7.365f	15

Chapitre VI.

Menuiserie.

Plancher brut dans les greniers	1.085m	00	2	2f	20	2.387f	00				
Plancher en chêne sur solives en fer, 2e classe, compris plancher de l'étage, mansarde de l'Administration	3.557	50	1	8	50	30,238	75				
Parquets en chêne sur bitume	1.567	00	3	10	00	15.670	00				
Croisées avec ou sans imposte ouvrante	1.029	48	4	9	00	9.265	32				
Croisées des classes	1.017	74	6	12	00	12.212	88				
Plinthes en sapin de 0.22	3.500	00	9	0	70	2.450	00				
Stylobates de 0m35	500	00	10	1	20	600	00				
Lambris en sapin	250	00	8	6	00	1.500	00				
Cloisons des Cabines des Dortoirs	370	00	30	9	00	3.330	00				
Portes à claires-voies	57	50	11	4	00	230	00				
Portes d'intérieur à 1 vantail	341	90	13	9	00	3.077	10				
— id — à 2 vantaux	125	44	14	15	00	1.881	60				
A Reporter						82,842f	65			360,607f	80

6

Détail des ouvrages exécutés.	Quantités d'ouvrages		Numéros de la Série des Prix	Prix		Produits		Totaux Partiels		Totaux Généraux	
Report						82,142	55			360,607	80
Portes dans le passage charretier	9	60	18	22	00	211	20				
Portes du passage charretier	27	70	16	30	00	831	00				
Portes-croisées	120	88	Estimation	15	00	1.813	20				
Portes cochères	20	50	18	22	00	451	00				
Boiseries en sapin	1,400	00	19	1	10	1.540	00				
Main-courante d'escalier (logements)	56	00	20	8	00	448	00				
Moulures en sapin	3,000	00	23	0	20	600	00				
Baguettes d'angles en sapin	3,000	00	22	0	30	900	00				
Rayons en sapin	200	00	27	5	50	1.100	00				
Tasseaux	200	00	28	0	20	40	00				
Sièges en chêne pour Cabinets d'aisances et Chaises-percées	15	-	Estimation	11	00	165	00				
Portes de placards	132	00	13	8	00	1.056	00				
								91.998	05		
										91.998	05
Chapitre VII. Serrurerie.											
Fers à I pour poutres et solives	157,150	000	1	0	30	47,145	00				
Gros fers pour usages divers	1.000	000	3	0	60	600	00				
Fers plats pour chaînages	5,400	000	2	0	40	2.160	00				
Balustres d'escaliers	1.000	000	8	1	10	1.100	00				
Colonnes en fonte	5.940	000	9	0	30	1.782	00				
Ferrements de la galerie de Communication	777	00	5	12	00	9.324	00	62111	00		
Serrures J.P.M. ou S.T., en 0.14	80		10	6	00	480	00				
—— d° ——, en 0.16	25		d°	6	50	162	50				
Serrures d'armoires en 0.08	30		d°	3	00	90	00				
Serrures Bonardes en 0.16	20		d°	5	00	100	00				
Serrures de sûreté en 0.19	8		d°	12	00	96	00				
A Reporter						[illegible] 928	50	62111	00	452,605	85

Détail des Ouvrages exécutés	Quantités d'ouvrages	Numéros de la Série des Prix	Prix	Produits	Totaux Partiels	Totaux Généraux
Reporté				~~63.039 50~~ 928 50	[illegible]	452,605 85
Serrures de sûreté en 0.16	10	10	11 00	110 00		
Becs de canne, bouton blanc	77	11	1 90	146 30		
— d° —, bouton cristal	30	d°	2 20	66 00		
Crémones en 0.038	360	12	3 00	1.080 00		
— d° — en 0.020	175	d°	4 00	700 00		
Paumelles en 0.14	3.200	13	0 80	2.560 00		
— d° — en 0.19	650	d°	1 20	780 00		
Charnières ordinaires de 0.09 à 0.10	300	14	0 40	120 00		
— d° — renforcées de 0.06 à 0.09	250	d°	0 60	150 00		
Pentures	40	15	1 50	60 00		
Gonds de scellement	40	16	0 60	24 00		
Equerres, branches de 0.16	60	17	0 30	18 00		
— d° — de 0.25	40	d°	0 55	22 00		
Loqueteaux à crochets	60	18	1 10	66 00		
					[illegible] ~~68.941 80~~	68.941 80
Chapitre VIII.						
Marbrerie.						
Tablettes de croisées	50m 40	1	30 00	1.512 00		
Cheminées capucines	28	2	85 00	2.380 00		
Cheminées à modillons	6	3	140 00	840 00		
					4.732 00	4.732 00
Chapitre IX.						
À Reporter						526,279 65

Détail des ouvrages exécutés	Quantités d'ouvrages	Numéros de la Série des Prix	Prix	Produits	Totaux Partiels	Totaux Généraux
Report						526,279 65
Chapitre IX.						
Peinture, _ Tentures, _ Vitrerie.						
Peinture à l'huile, 3 couches	16.612 48	2	0 90	14.951 23		
Décors, faux bois et autres	255 00	5	2 50	637 50		
Panneaux d'escalier	250 00	10	0 40	100 00		
_ id. _	490 00	id.	0 20	98 00		
Tableaux des classes	90 00	9 et 2	1 00	90 00		
Filets, galons	4.500 00	13	0 05	225 00		
Galons	5,000 00	14	0 20	1,000 00		
Toile à tenture	36 00	17	0 70	25 20		
Papier bleu	225 00	18	0 90	202 50		
Pose de papier	150	19	2 45	382 50		
Pose de bordures	4.500 00	Estimation	0 05	225 00		
Fourniture de papier (rouleaux)	850	id.	1 00	850 00		
Fourniture de bordure (rouleaux)	120	id.	1 00	120 00		
Vitrerie { Fourniture et pose de verres simple	1.175 02	20	4 00	4.700 08		
Vitrerie { _ id. _ 1/2 double	1,405 60	id.	6 00	8,433 60		
Vitrerie { _ id. _ 1/2 double cannelé	459 10	id.	10 00	4.591 00		
					36,631 61	
						36,631 61
Total						562,911 26
Somme à valoir pour travaux imprévus 1/10e						56,291 13
Montant des Travaux des Bâtiments à 2 Etages						619,202 38

§ 2. _ Gymnase.

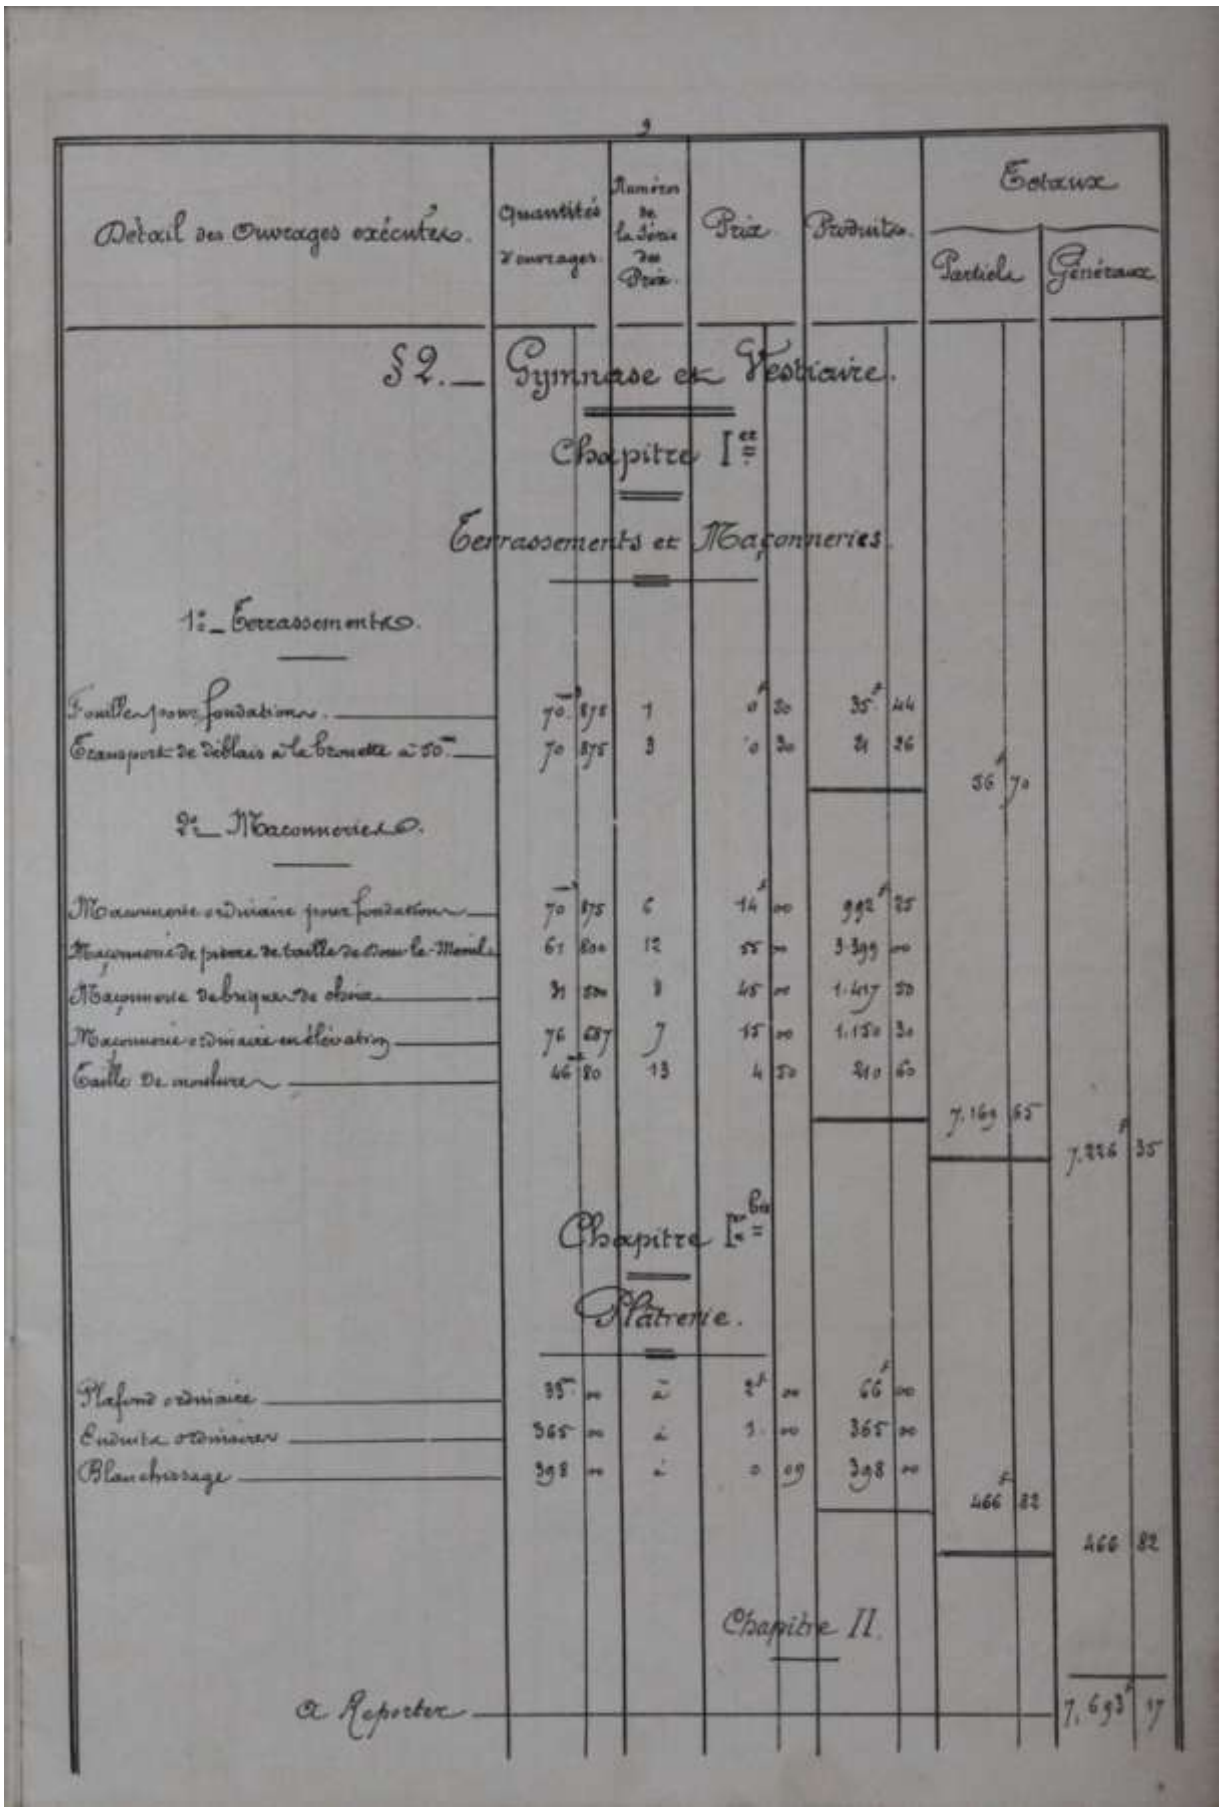

Détail des Ouvrages exécutés.	Quantités d'ouvrages	Numéros de la série des Prix	Prix	Produits	Totaux Partiels	Totaux Généraux
§ 2. — Gymnase et Vestiaire.						
Chapitre Ier						
Terrassements et Maçonneries.						
1°. — Terrassements.						
Fouille pour fondations	70 m³ 875	1	0 f 80	35 f 44		
Transport de déblais à la brouette à 50 m	70 875	3	0 30	21 26		
					56 f 70	
2°. — Maçonneries.						
Maçonnerie ordinaire pour fondations	70 m³ 875	6	14 f m	992 f 25		
Maçonnerie de pierre de taille de Comblanchien	61 800	12	55 m	3 399 m		
Maçonnerie de brique de choix	31 500	8	45 m	1 417 50		
Maçonnerie ordinaire en élévation	76 487	7	15 m	1 152 30		
Taille de moulure	46 m² 80	13	4 50	210 60		
					7 169 f 65	
						7 226 f 35
Chapitre Ier bis^						
Plâtrerie.						
Plafond ordinaire	35 m² m	2	2 f m	66 f m		
Enduits ordinaires	365 m	2	1 m	365 m		
Blanchissage	398 m	2	0 09	398 m		
					466 f 82	
						466 82
Chapitre II.						
A Reporter						7 693 f 17

INVENTAIRE DU FOND HALLEUX

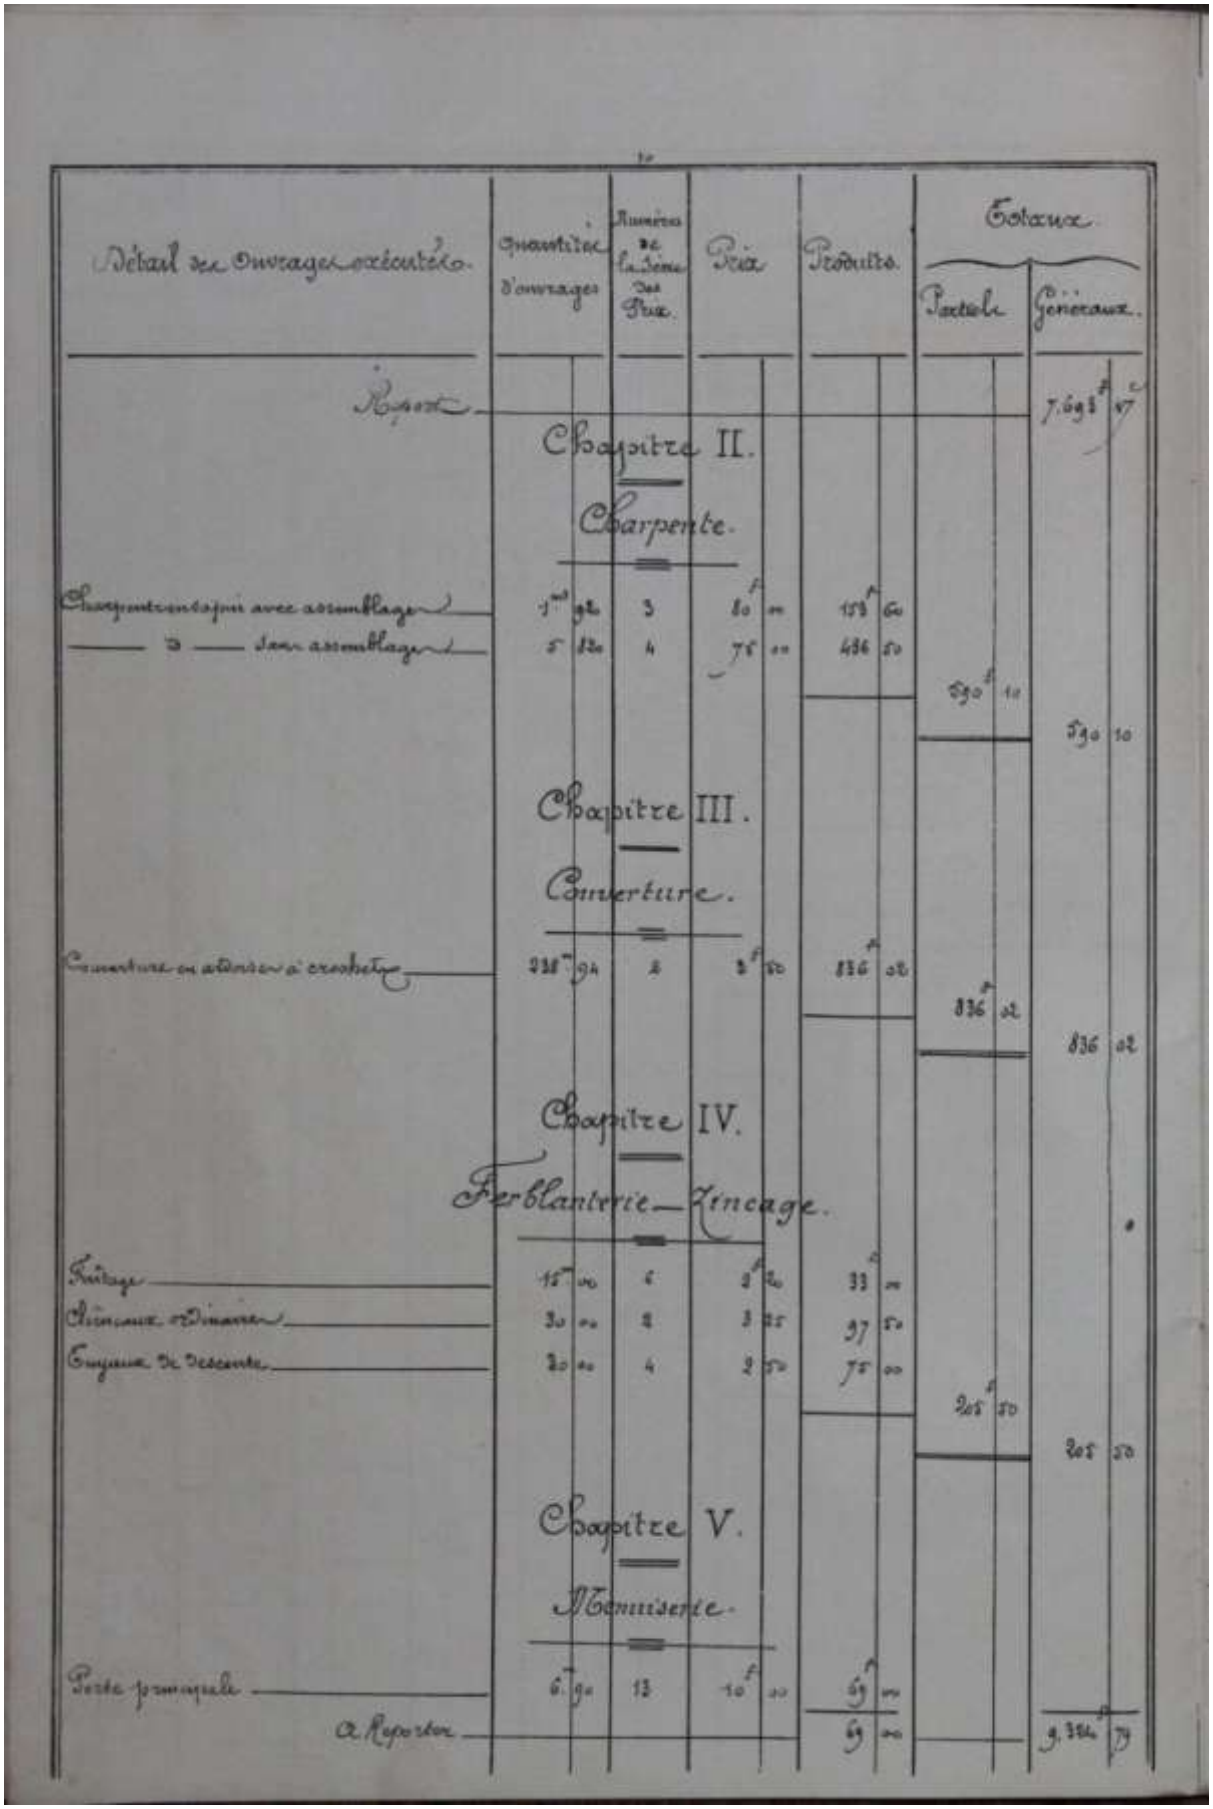

Détail des Ouvrages exécutés.	Quantités d'ouvrages	Numéros de la Série des Prix.	Prix	Produits.	Soldes Partiels	Soldes Généraux.
Report						7.693 f 17 c
Chapitre II.						
Charpente.						
Charpente en sapin avec assemblage	1m 92	3	80 f m	153 f 60		
——— D ——— sans assemblage	5 120	4	75 m	436 50		
					590 f 10	
						590 10
Chapitre III.						
Couverture.						
Couverture en ardoises à crochets	228m 94	2	3 f 50	836 02		
					836 f 02	
						836 02
Chapitre IV.						
Ferblanterie — Zincage.						
Faîtage	15m 00	6	2 f 20	33 m		
Chéneaux et Dinanderie	30 00	2	3 25	97 50		
Tuyaux de Descente	20 00	4	2 50	75 00		
					205 f 50	
						205 50
Chapitre V.						
Menuiserie.						
Porte principale	6m 90	13	10 f 00	69 m		
A Reporter				69 00		9.324 f 79 c

11

Détail des Ouvrages exécutés.	Quantités d'ouvrages	Numéros de la Série des Prix	Prix	Produits	Totaux Partiels	Totaux Généraux
Report				69f 00		9.384f 79
Portes sur les Préaux	6m 90	13	8f 00	55 20		
Croisées	22 40	14	9 00	201 60		
					325f 80	
						325 80
Chapitre VI. Serrurerie.						
Croisées en fer à I	31 45	Estimation	13f 00	408f 85	1.205f 85	
Serrures en 0.14	4	10	6 00	24 00		
Crémones en 0.018	9	12	3 00	27 00		
Paumelles en 0.14	18	13	0 80	14 40		
— id — 0.19	6	id.	1 20	7 20		
Goussets de scellement	6	16	0 60	3 60		
Pentures	6	15	1 50	9 00		
Charpente métallique	2.000k 00	Estimation	0 70	1400 00	Gros-œuvre	
					~~1.894f 05~~ 81 20	
						1,894 05
Chapitre VII. Peinture et Vitrerie.						
Peinture à 3 couches	272m 40	2	0 90	245f 16		
Vitrerie, verre demi-double	65 85	6	6 00	395 10		
					640 26	
						640 26
Total						12.184f 90
Somme à valoir pour dépenses imprévues 1/10e						1.218 49
Montant des Travaux du Gymnase et du Vestiaire						13.403f 39

53. Préaux, etc.

INVENTAIRE DU FOND HALLEUX

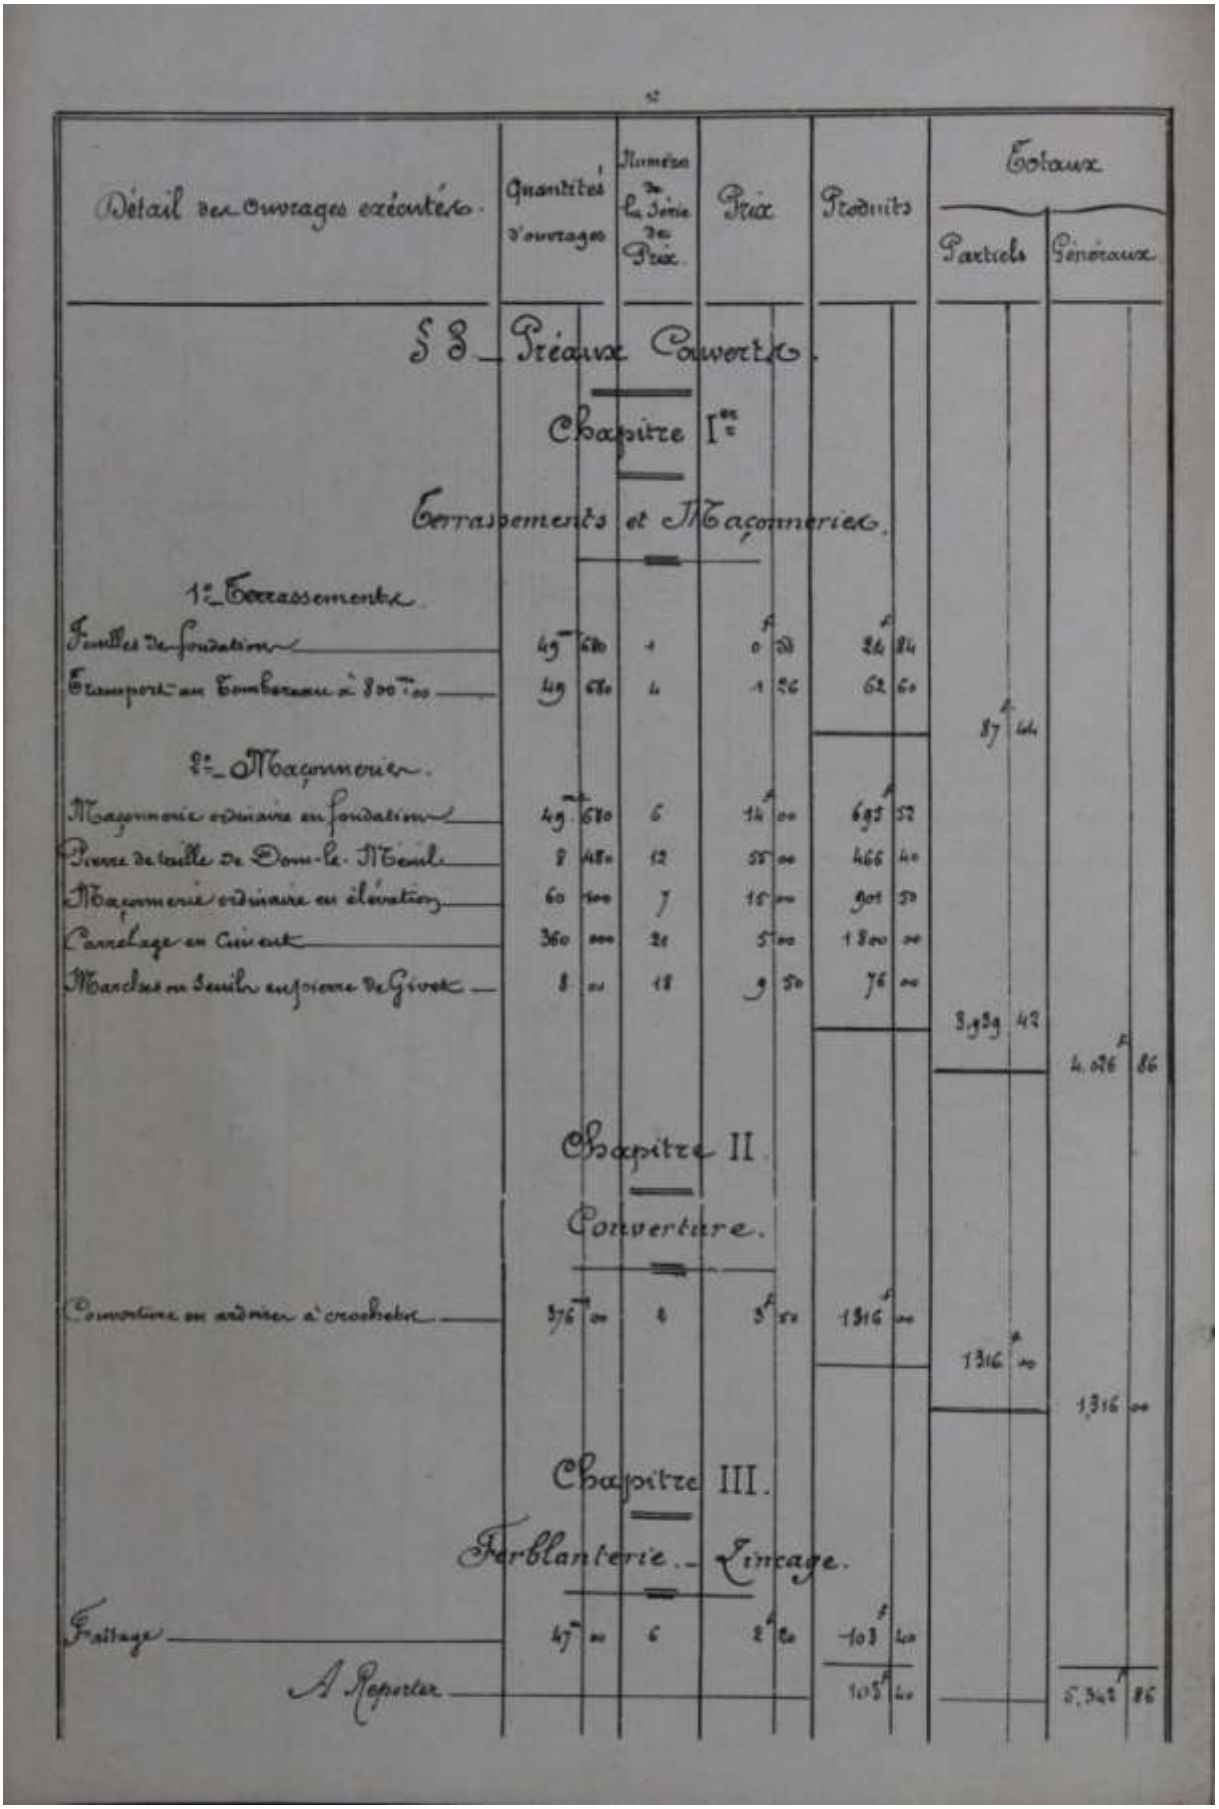

Détail des Ouvrages exécutés.	Quantités d'ouvrage	Numéro de la Série de Prix	Prix	Produits	Totaux Partiels	Totaux Généraux
§ 8 _ Préaux Couverts.						
Chapitre Ier						
Terrassements et Maçonneries.						
1er Terrassements.						
Fouilles de fondation	49 m. 680	1	0 f 50	24 f 84		
Transport au tombereau à 800 m.	49 680	4	1 25	62 f 60		
					87 f 44	
2e Maçonnerie.						
Maçonnerie ordinaire en fondation	49 m. 680	6	14 f 00	695 f 52		
Pierre de taille de Dom-le-Mesnil	8 m. 480	12	55 00	466 40		
Maçonnerie ordinaire en élévation	60 100	7	15 00	901 50		
Carrelage en Ciment	360 m. 000	21	5 f 00	1800 00		
Marches en Seuils en pierre de Givet	8 m. 00	18	9 f 50	76 f 00		
					3939 f 42	
						4026 f 86
Chapitre II.						
Couverture.						
Couverture en ardoises à crochets	376 m. 00	4	5 f 50	1316 f 00		
					1316 f 00	
						1316 00
Chapitre III.						
Ferblanterie. _ Zinçage.						
Faitage	47 m. 00	6	2 f 20	103 f 40		
A Reporter				1053 f 40		5342 f 86

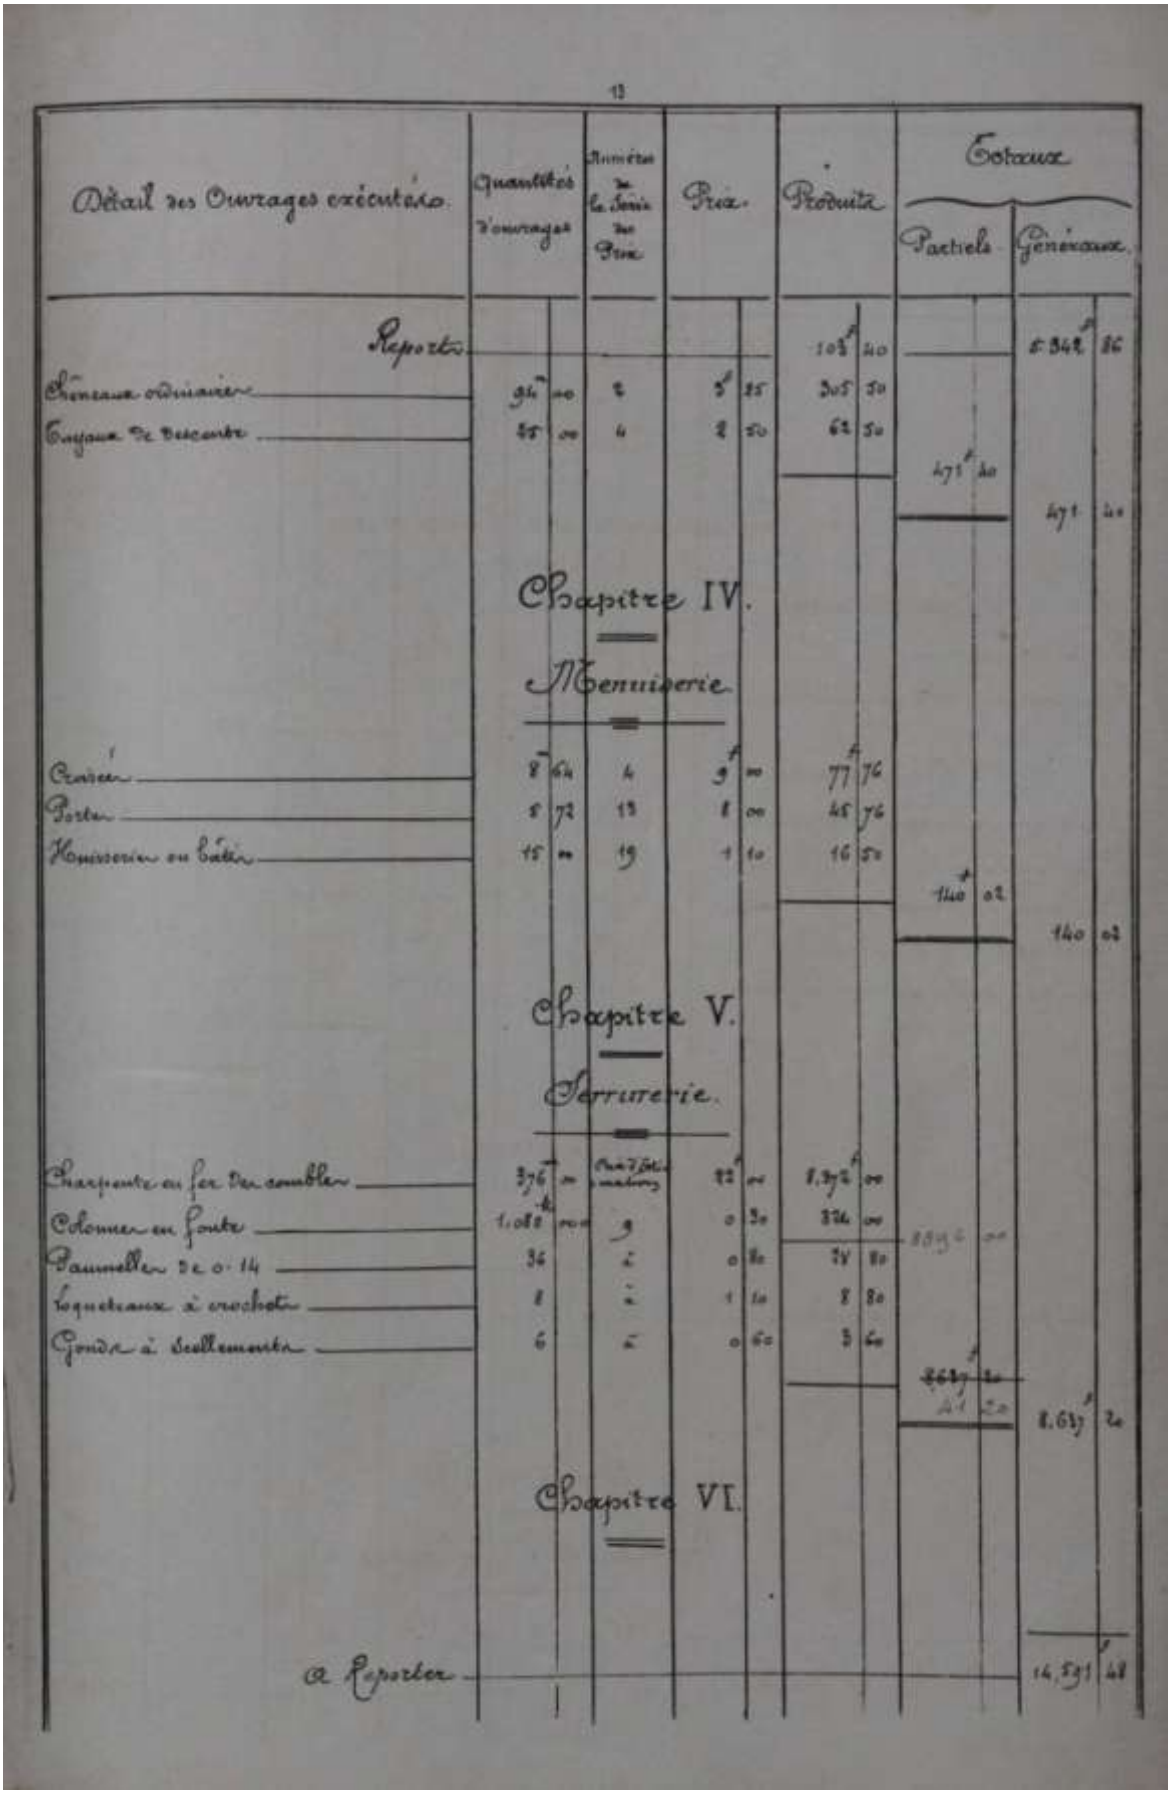

13

Détail des Ouvrages exécutés	Quantités d'ouvrages	Numéros de la Série des Prix	Prix	Produits	Totaux Partiels	Totaux Généraux
Reporté				103 f 40		5 342 f 86
Chêneaux ordinaires	94 m 00	2	3 f 25	305 50		
Noyaux de Descente	55 00	4	2 50	62 50		
					471 f 40	
						471 40
Chapitre IV.						
Menuiserie						
Croisées	8 m 64	4	9 f 00	77 f 76		
Portes	5 72	13	8 00	45 76		
Huisseries en bâtis	15 00	19	1 10	16 50		
					140 f 02	
						140 02
Chapitre V.						
Serrurerie						
Charpente en fer des combles	376 m	Nouveaux matériaux	22 f 00	8 272 f 00		
Colonnes en fonte	1.088 k 00	9	0 30	326 00		
Pannelles de 0·14	36	2	0 80	28 80		
Equerres à crochets	8	2	1 10	8 80		
Gonds à scellements	6	2	0 60	3 60		
					8 617 f 20	
						8 617 f 20
Chapitre VI.						
A Reporter						14 591 f 48

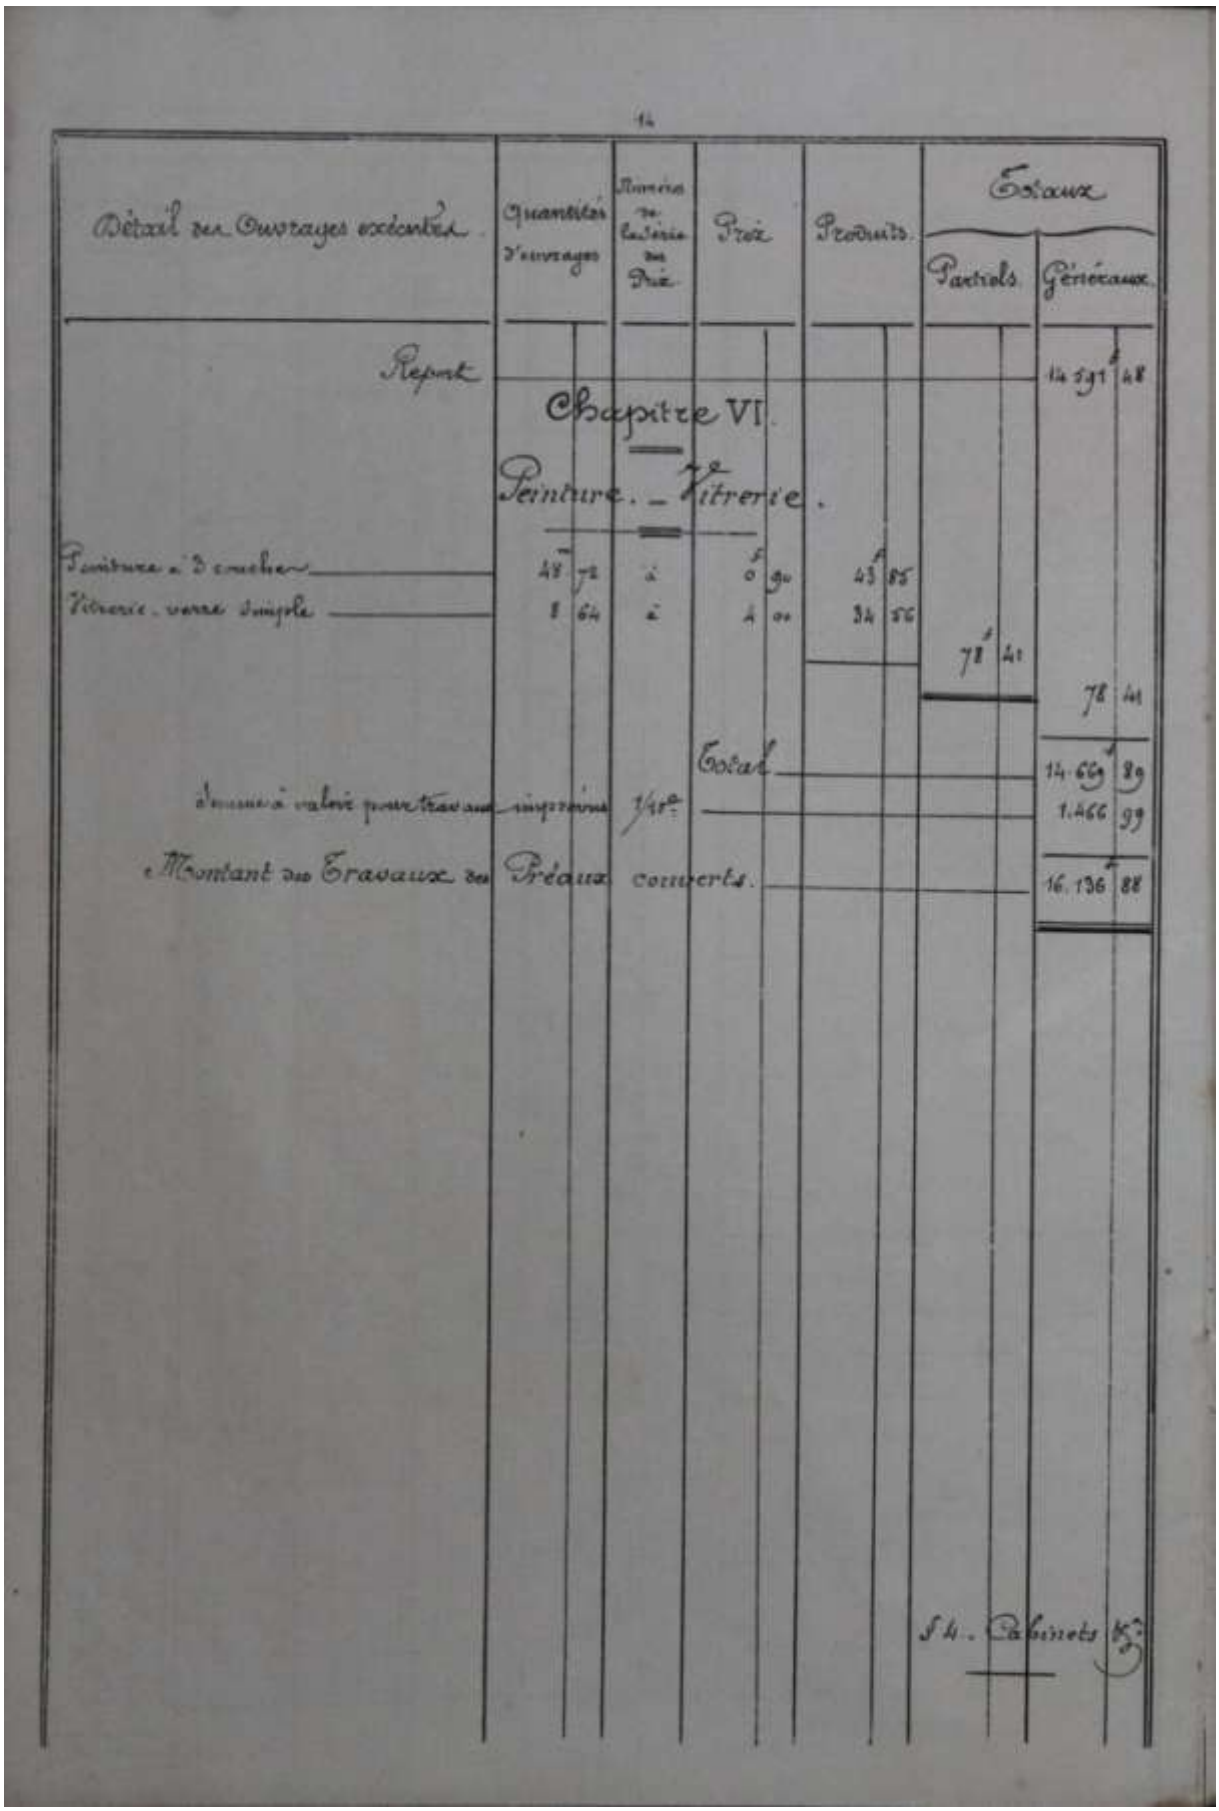

14

Détail des Ouvrages exécutés	Quantités d'ouvrages	Numéro de la série des Prix	Prix	Produits	Ecaux Partiels	Ecaux Généraux
Report						14 591 48
Chapitre VI.						
Peinture. – Vitrerie.						
Peinture à 3 couches	48 72	à	0 90	43 85		
Vitrerie. verre simple	8 64	à	4 00	34 56		
					78 41	
						78 41
			Total			14 669 89
Somme à valoir pour travaux imprévus 1/10e						1 466 99
Montant des Travaux des Préaux couverts.						16 136 88

54. Cabinets

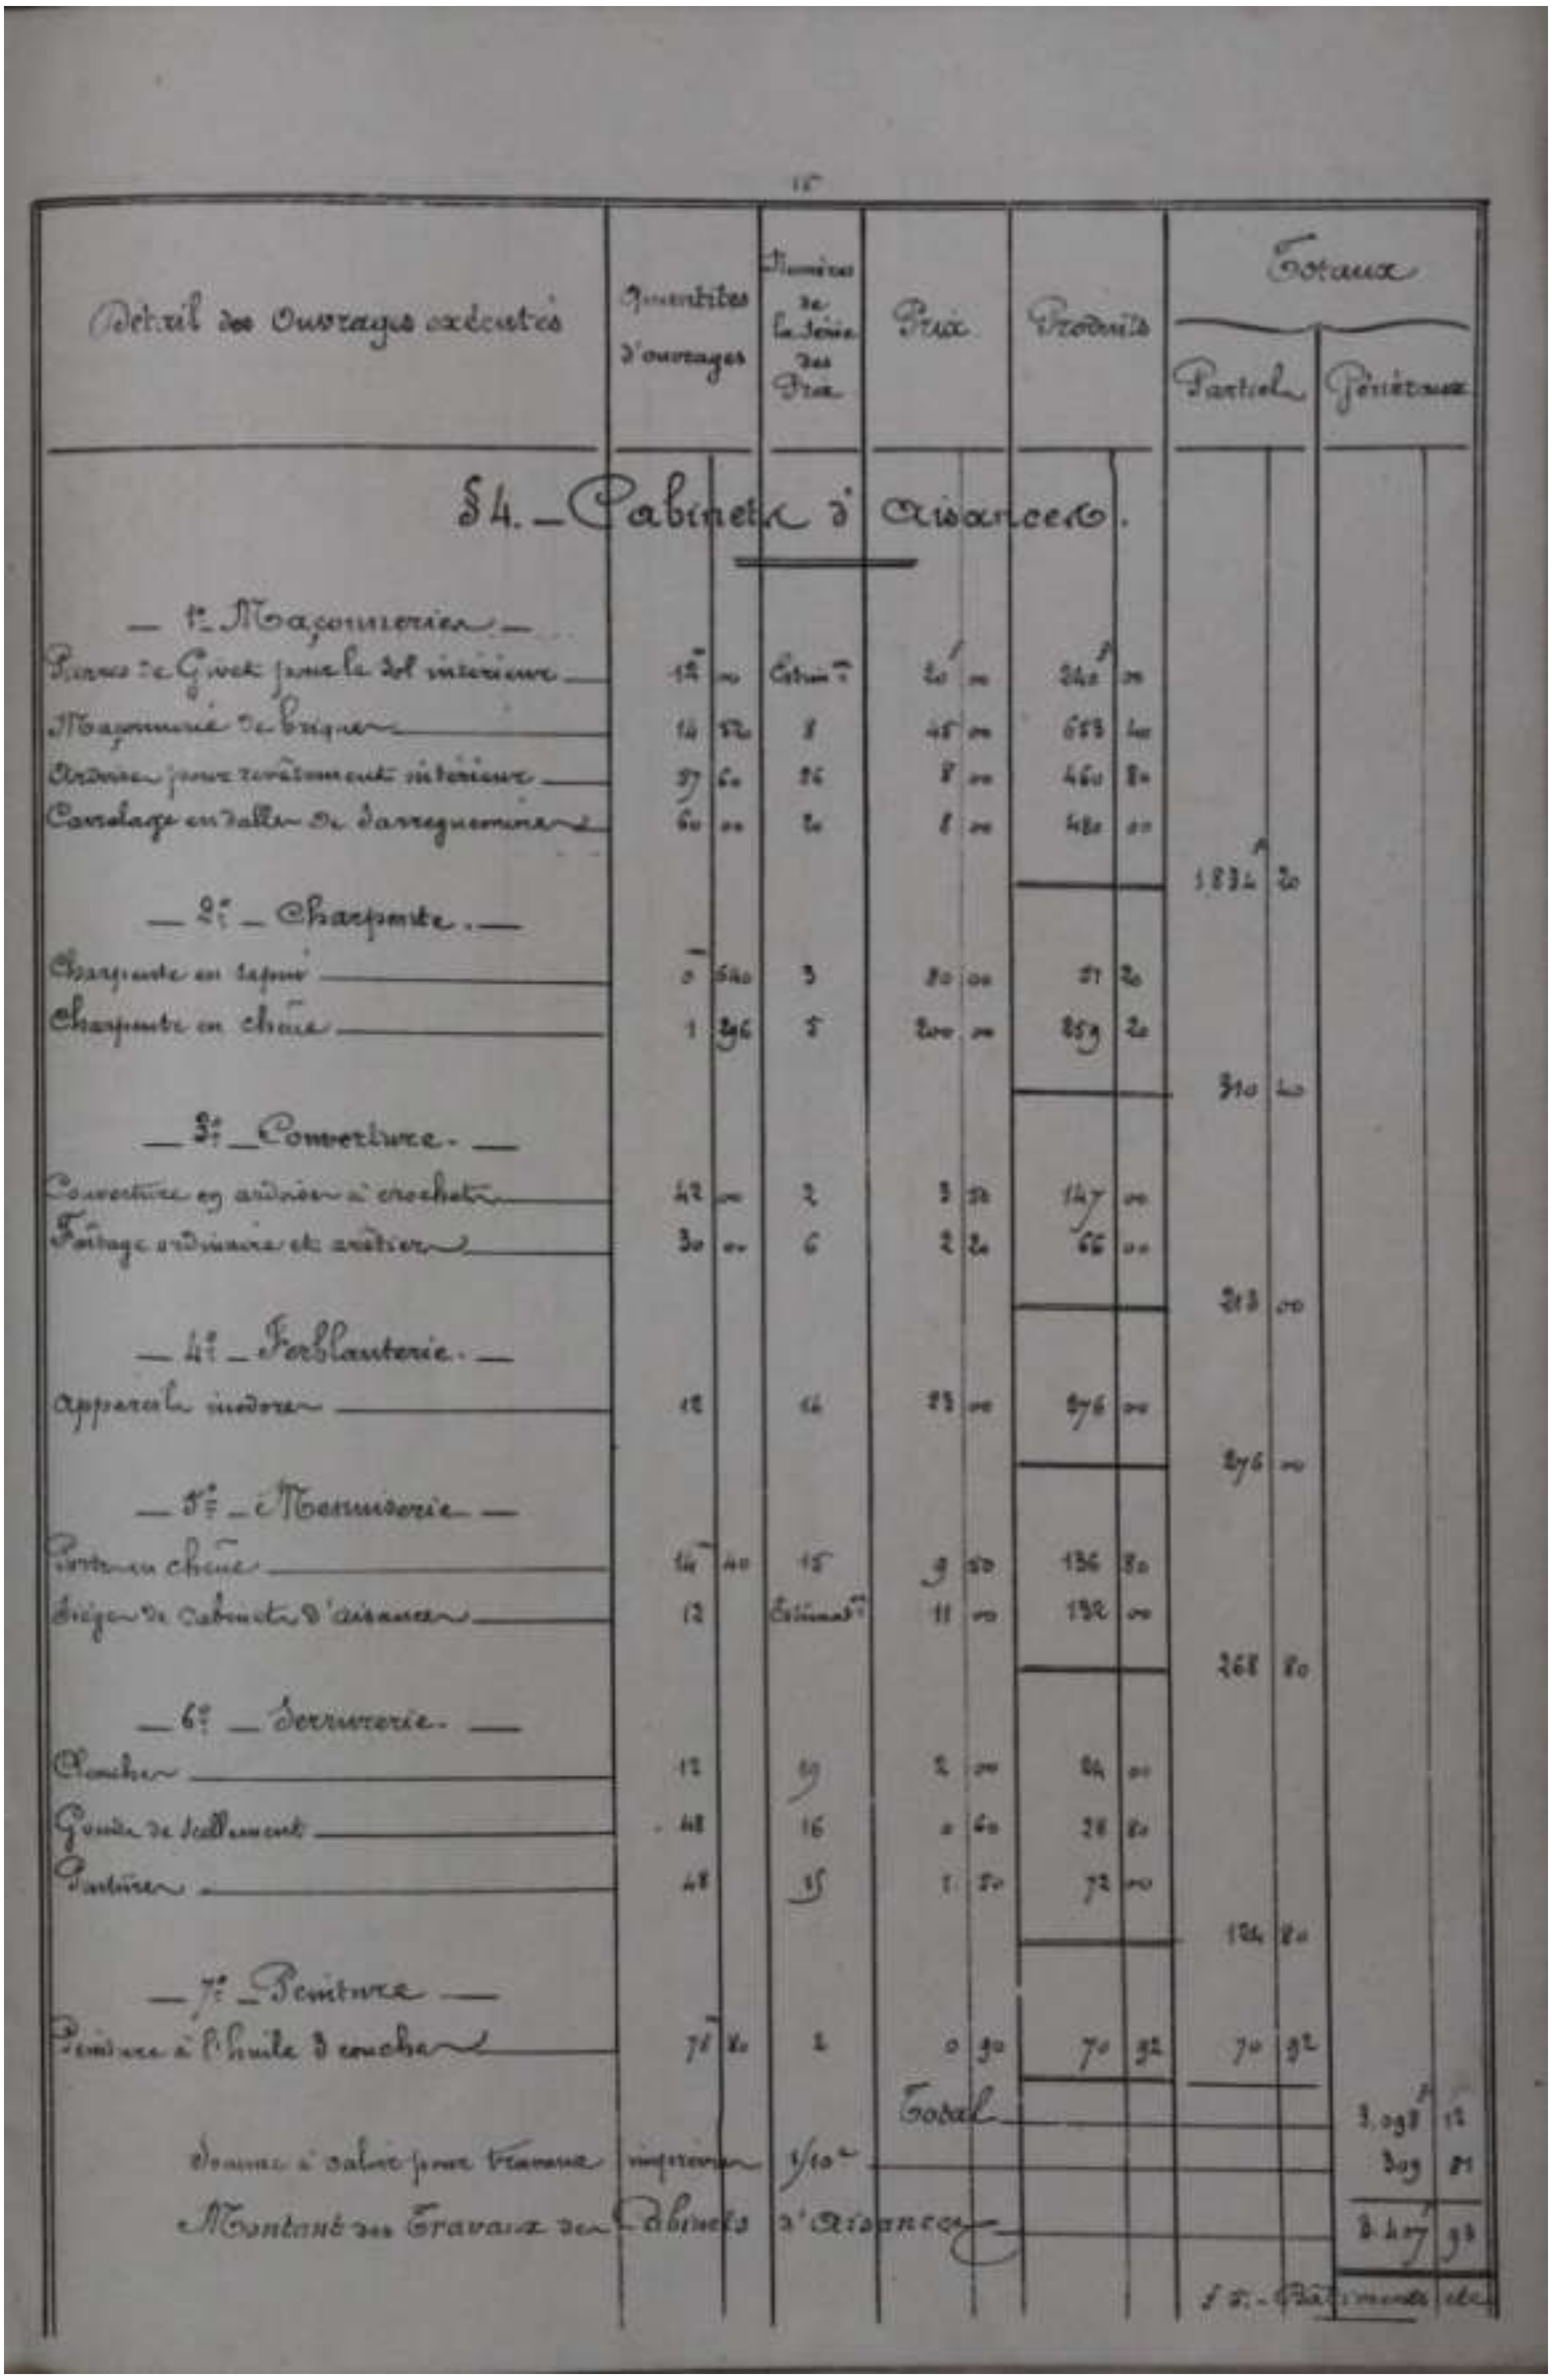

15

Détail des Ouvrages exécutés	Quantités d'ouvrages	Numéros de la Série des Prix	Prix	Produits	Totaux Partiels	Totaux Généraux
§ 4. – Cabinets d'aisances.						
— 1° Maçonnerie —						
Pierres de Givet pour le sol intérieur	12m² —	Estimé	20f —	240f —		
Maçonnerie de brique	14 52	8	45 —	653 40		
Ardoise pour revêtement intérieur	57 60	86	8 —	460 80		
Carrelage en dalles de Sarreguemines	60 —	20	8 —	480 —		
					1834f 20	
— 2° – Charpente. —						
Charpente en sapin	0 540	3	80 00	51 20		
Charpente en chêne	1 296	5	200 —	259 20		
					310 40	
— 3° – Couverture. —						
Couverture en ardoises à crochets	42 —	2	3 50	147 —		
Faîtage ordinaire et arêtier	30 —	6	2 20	66 —		
					213 00	
— 4° – Ferblanterie. —						
Appareils inodores	12	44	23 —	276 —		
					276 —	
— 5° – Menuiserie —						
Portes en chêne	14 40	15	9 50	136 80		
Sièges de cabinets d'aisances	12	Estimat.	11 —	132 —		
					268 80	
— 6° – Serrurerie. —						
Clenches	12	59	2 —	24 —		
Guides de scellement	48	16	0 60	28 80		
Pentures	48	35	1 50	72 —		
					124 80	
— 7° – Peinture —						
Peinture à l'huile 3 couches	78 80	1	0 90	70 92	70 92	
Total						3,098f 12
Somme à valoir pour travaux imprévus 1/10e						309 81
Montant des Travaux des Cabinets d'aisances						3.407 93

§ 5. – Bâtiments etc.

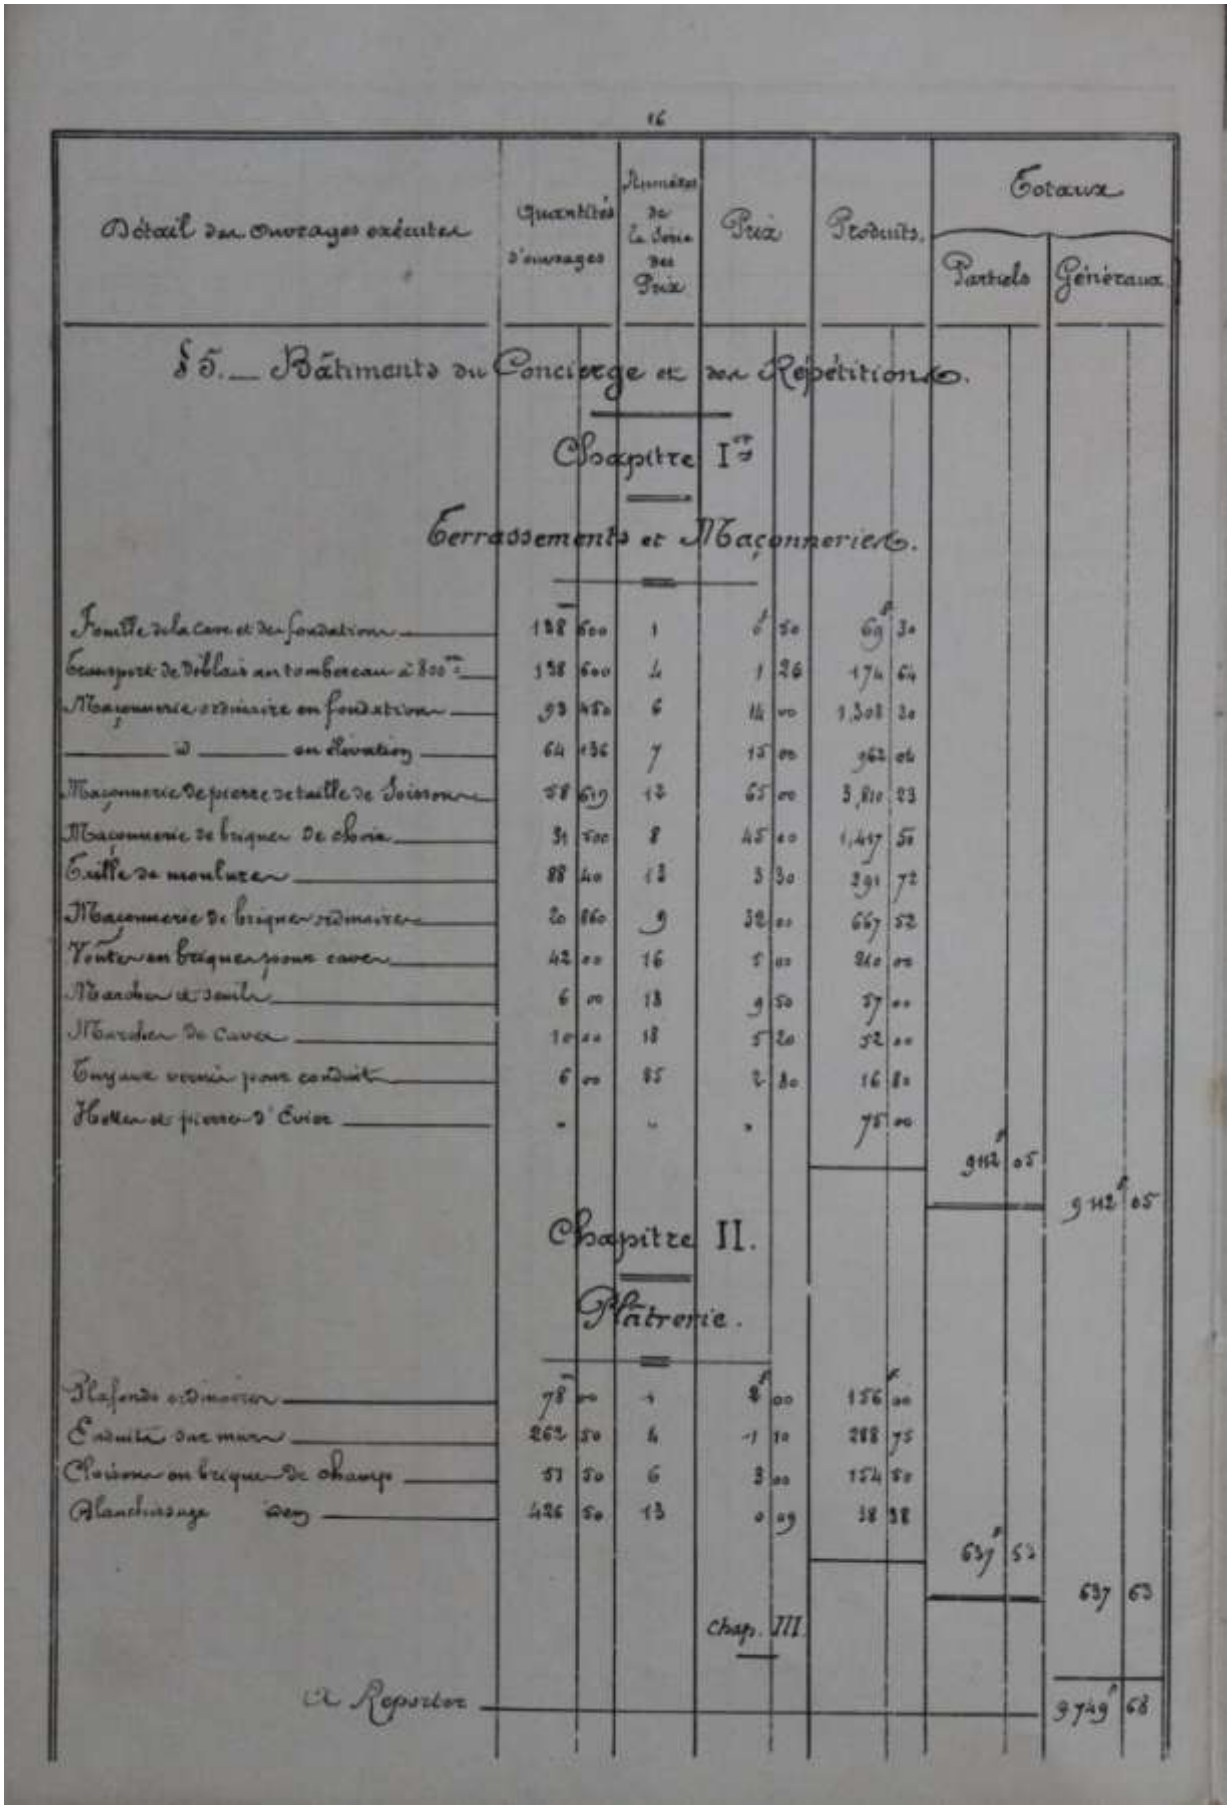

16

Détail des ouvrages exécutés	Quantités d'ouvrages	Numéros de la Série des Prix	Prix	Produits	Totaux Partiels	Totaux Généraux
§ 5. — Bâtiments du Concierge et des Répétitions.						
Chapitre Ier						
Terrassements et Maçonneries.						
Fouille de la cave et de fondations	138 600	1	0 50	69 30		
Remploi de déblais au tombereau à 800m	138 600	4	1 26	174 64		
Maçonnerie ordinaire en fondations	93 450	6	14 00	1 303 20		
id en élévation	64 136	7	15 00	962 04		
Maçonnerie de pierre de taille de Soignon	58 617	12	65 00	3 810 23		
Maçonnerie de brique de choin	31 500	8	45 00	1 417 50		
Taille de moulures	88 40	13	3 30	291 72		
Maçonnerie de brique ordinaire	20 860	9	32 00	667 52		
Voûte en brique pour cave	42 00	16	5 00	210 00		
Marches de seuil	6 00	18	9 50	57 00		
Marches de Cave	10 00	18	5 20	52 00		
Tuyaux vernis pour conduit	6 00	85	2 80	16 80		
Hottes de pierre d'Euville	-	-	-	75 00		
					9112f 05	
						9 112f 05
Chapitre II.						
Plâtrerie.						
Plafonds ordinaires	78m 00	1	8f 00	156 00		
Enduits sur murs	262 50	4	1 10	288 75		
Cloisons en brique de champ	51 50	6	3 00	154 50		
Blanchissage des	426 50	13	0 09	38 38		
					637f 63	
						637 63
			Chap. III.			
A Reporter						9749f 68

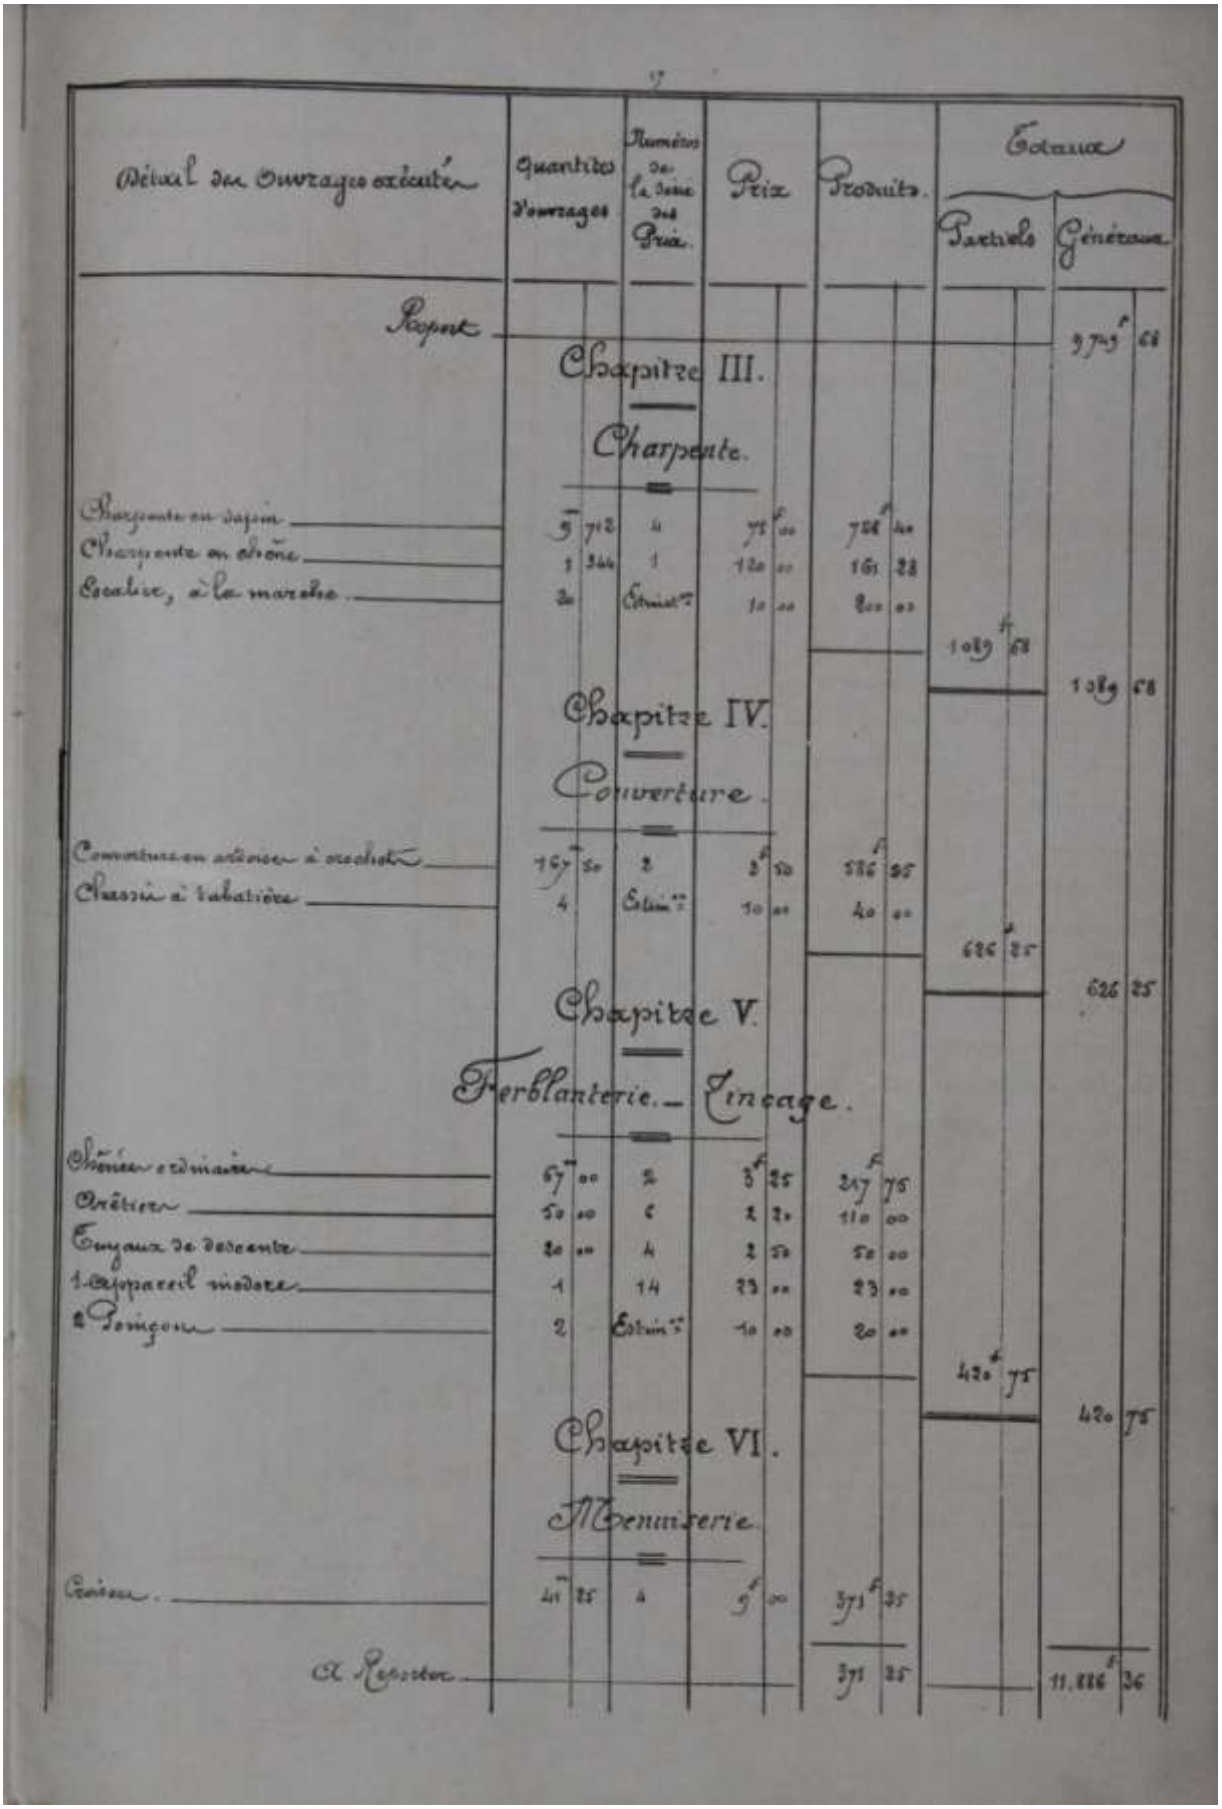

Détail des Ouvrages exécutés	Quantités d'ouvrages	Numéros de la Série des Prix	Prix	Produits.	Totaux Partiels	Totaux Généraux
Report						9749 f 68
Chapitre III. Charpente.						
Charpente en sapin	9 m 712	4	75 f 00	728 f 40		
Charpente en chêne	1 344	1	120 00	161 28		
Escalier, à la marche	2	Estim.t	10 00	20 00		
					1089 f 68	
						1089 68
Chapitre IV. Couverture.						
Couverture en ardoises à crochets	107 m 50	2	3 f 50	376 f 25		
Chassis à tabatière	4	Estim.t	10 00	40 00		
					626 f 25	
						626 25
Chapitre V. Ferblanterie. — Lincage.						
Chéneau ordinaire	67 m 00	2	3 f 25	217 f 75		
Arêtiers	50 00	6	2 20	110 00		
Tuyaux de descente	20 00	4	2 50	50 00		
1 Appareil modore	1	14	23 00	23 00		
2 Poingons	2	Estim.t	10 00	20 00		
					420 f 75	
						420 75
Chapitre VI. Menuiserie.						
Cadres	41 m 25	4	9 f 00	371 f 25		
A Reporter				371 25		11.886 f 36

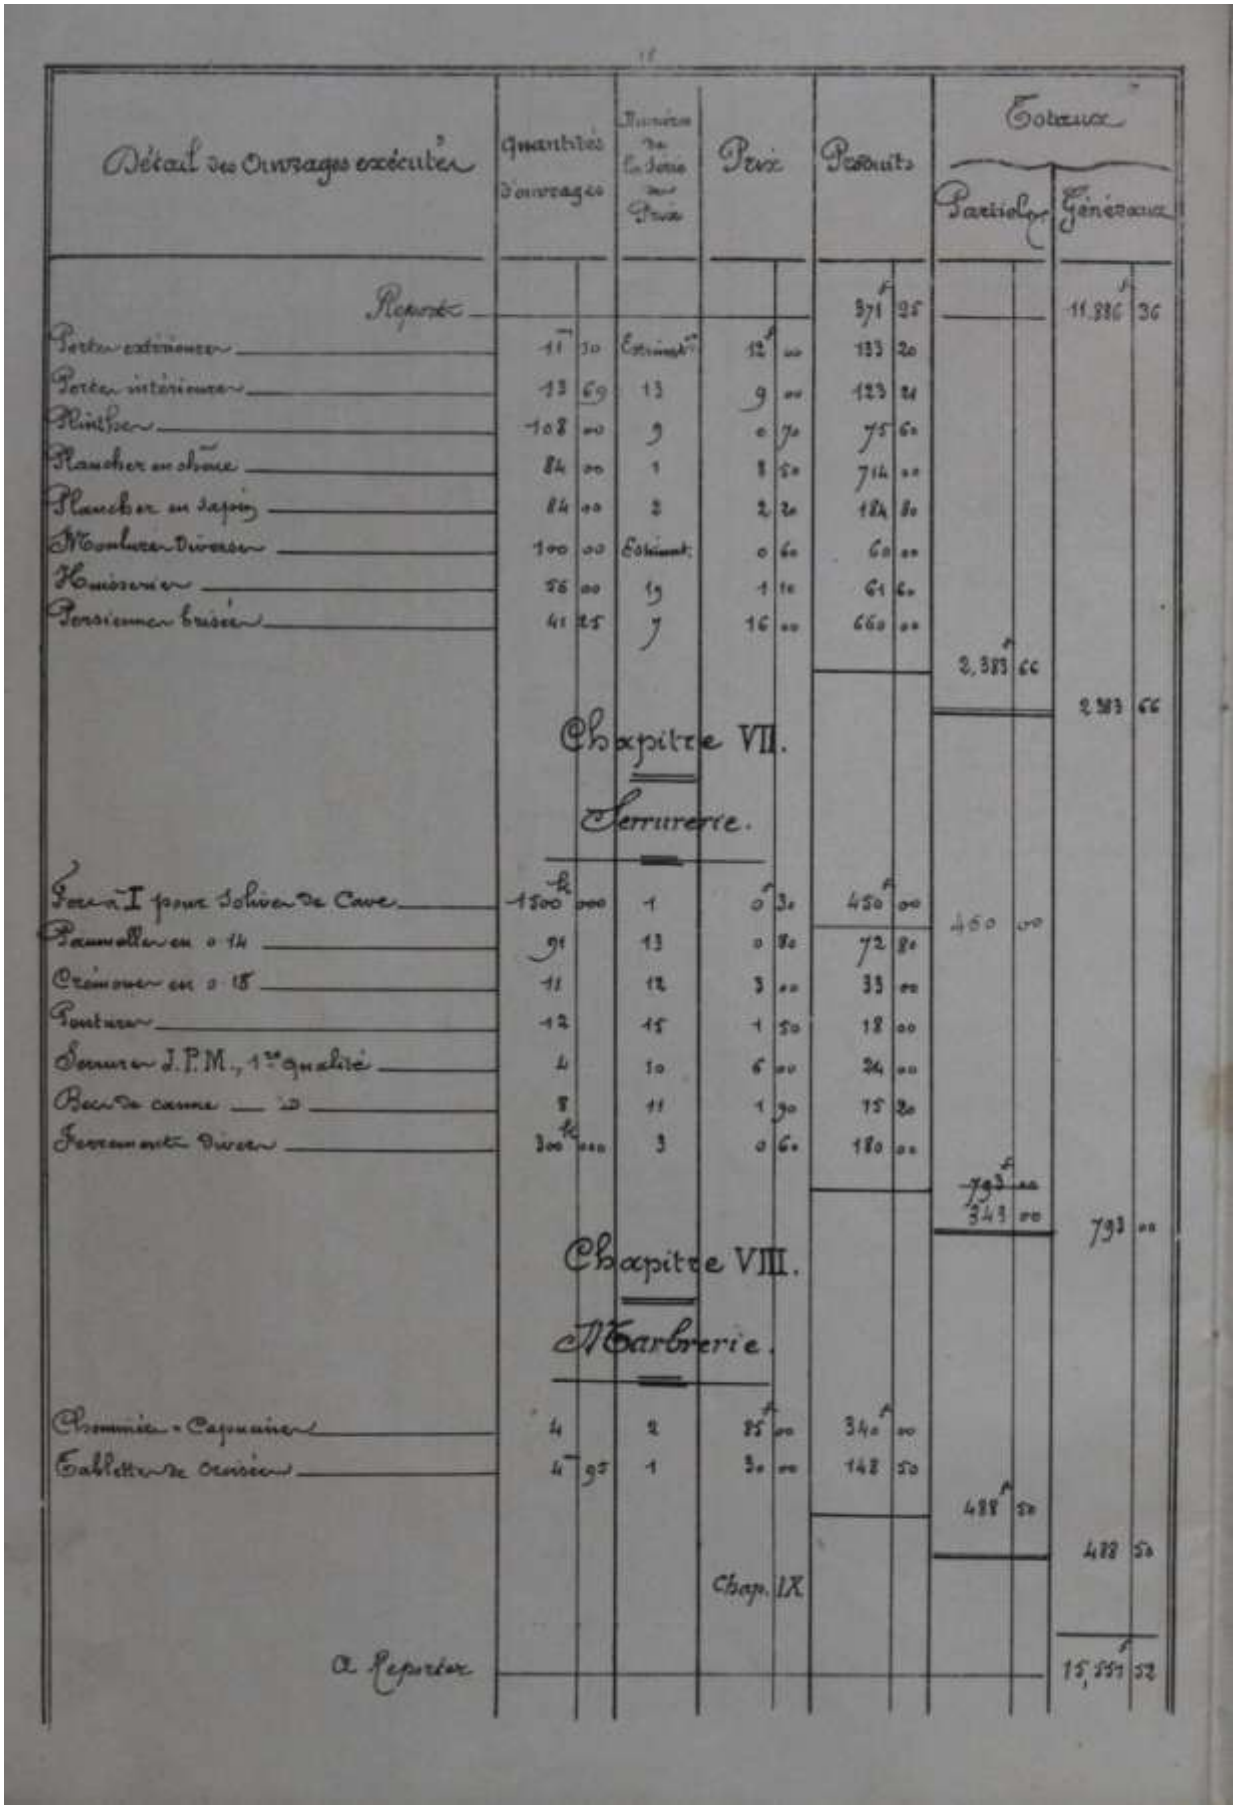

Détail des Ouvrages exécutés	Quantités d'ouvrages	Numéros de la Série des Prix	Prix	Produits	Colonnes Partielles	Colonnes Générales
Reporté				371 f 25		11.886 f 36
Portes extérieures	11 m 30	Estimat.	12 f 00	133 20		
Portes intérieures	13 69	13	9 00	123 21		
Rimbes	108 00	9	0 70	75 60		
Plancher en chêne	84 00	1	8 50	714 00		
Plancher en sapin	84 00	2	2 20	184 80		
Moulures Diverses	100 00	Estimat.	0 60	60 00		
Huisseries	56 00	13	1 10	61 60		
Persiennes brisées	41 25	7	16 00	660 00		
					2.383 f 66	
						2.383 66
Chapitre VII.						
Serrurerie.						
Fer en I pour Solives de Cave	1500 k 000	1	0 f 30	450 f 00	460 00	
Pannelles en 0 14	91	13	0 80	72 80		
Crémones en 0 18	11	12	3 00	33 00		
Fenêtres	12	15	1 50	18 00		
Serrures J.P.M., 1re qualité	4	10	6 00	24 00		
Becs de cane — D	8	11	1 30	15 80		
Ferrements Divers	300 k 000	3	0 60	180 00		
					793 f 00	
					343 00	793 00
Chapitre VIII.						
Marbrerie.						
Cheminée - Capucine	4	2	85 f 00	340 f 00		
Tablette de Cheminée	4 m 95	1	30 00	148 50		
					488 f 50	
						488 50
			Chap. IX.			
A Reporter						15.551 52

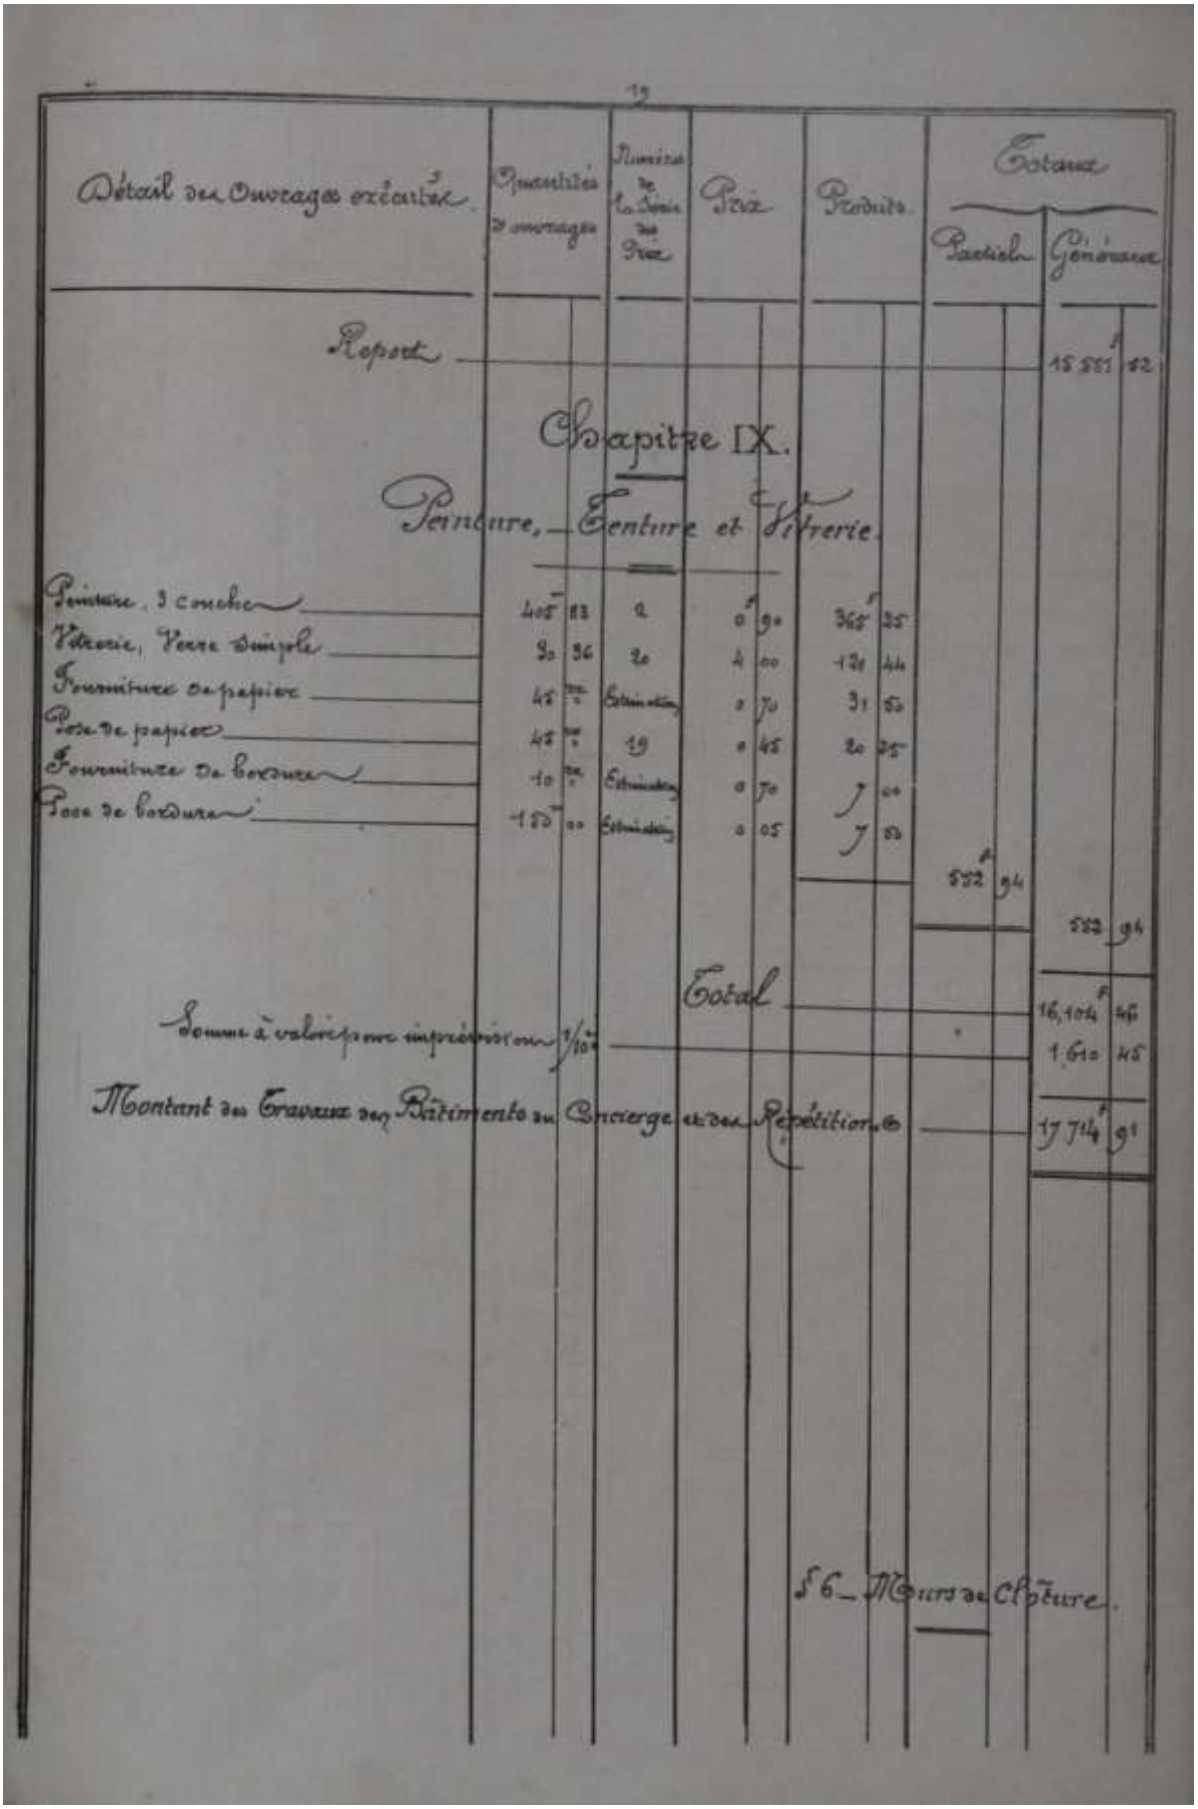

Détail des Ouvrages exécutés	Quantités d'ouvrages	Numéro de la Série des Prix	Prix	Produits	Estimation Partielle	Estimation Générale
Report						15 881 f 82
Chapitre IX.						
Peinture, Tenture et Vitrerie.						
Peinture, 3 couches	405 m 13	2	0 f 90	365 f 25		
Vitrerie, Verre simple	30 36	20	4 00	121 44		
Fourniture de papier	45 m/c	Estimation	0 70	31 50		
Pose de papier	45 m/c	19	0 45	20 25		
Fourniture de bordure	10 m/c	Estimation	0 70	7 00		
Pose de bordure	150 m 00	Estimation	0 05	7 50		
					552 f 94	
						552 94
			Total			16,104 f 45
Somme à valoir pour imprévision 1/10e						1 610 45
Montant des Travaux des Bâtiments du Concierge et des Répétitions						17 714 f 91
§ 6 — Murs de Clôture.						

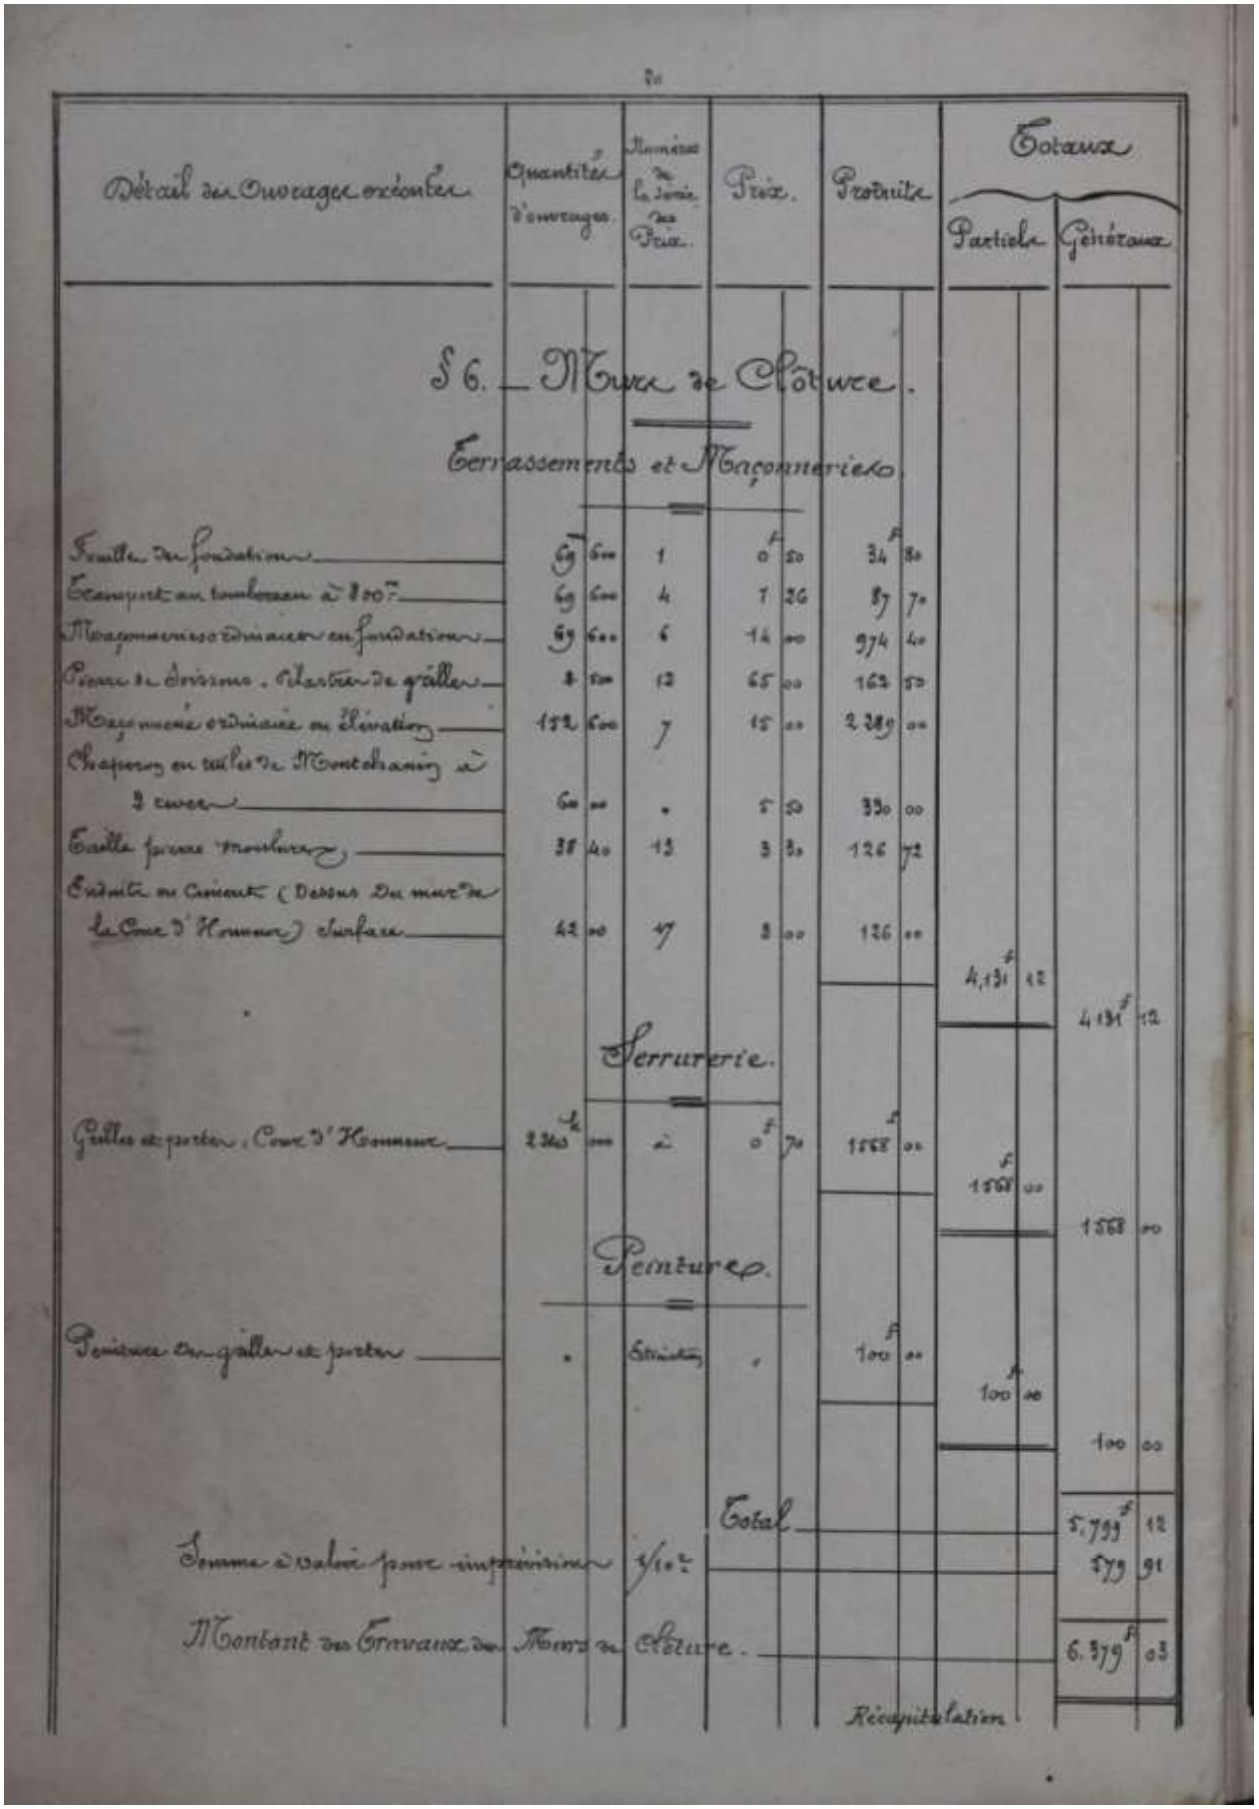

Détail des Ouvrages exécutés	Quantités d'ouvrages	Numéros de la série des Prix	Prix	Produits	Totaux Partiels	Totaux Généraux
§ 6. — Murs de Clôture.						
Terrassements et Maçonneries						
Fouille des fondations	69 600	1	0f 50	34f 80		
Transport au tombereau à 800m	69 600	4	1 26	87 70		
Maçonneries ordinaires en fondations	69 600	6	14 00	974 40		
Pierre de Soissons. Pilastres de grilles	2 500	12	65 00	162 50		
Maçonnerie ordinaire en élévation	152 600	7	15 00	2 289 00		
Chaperon en tuiles de Montchanin à 3 rives	60 00	.	5 50	330 00		
Taille pierre moulures	38 40	13	3 30	126 72		
Enduits en Ciment (Dessus du mur de la Cour d'Honneur) surface	42 00	17	3 00	126 00		
					4,131f 12	
						4131f 12
Serrurerie.						
Grilles et portes, Cour d'Honneur	2 240k 000	à	0f 70	1568f 00		
					1568f 00	
						1568 00
Peinture.						
Peinture des grilles et portes	.	Estimation	.	100f 00		
					100f 00	
						100 00
			Total			5,799f 12
Somme à valoir pour imprévisions		1/10e				579 91
Montant des Travaux des Murs de Clôture.						6.379f 03

Récapitulation

21

Récapitulation.

	Administration, classes, dortoirs et Annexes	Gymnase et Vestiaire	Murs de clôture	Préaux Couverts	Cabinets d'aisances	Concierge etc Répétitions	Total par Natures d'ouvrages
Terrasse et Maçonnerie	263,368 86	7,226 35	4,131 12	4,026 86	1,834 20	9,112 05	289,699 44
Plâtrerie	42,724 98	466 82	»	»	»	637 63	43,829 43
Charpente	52,575 56	590 10	»	»	310 40	1,089 68	54,565 74
Couverture	14,373 25	836 02	»	1,316 00	213 00	626 25	17,364 52
Ferblanterie, Zincage	7,565 15	205 50	»	471 40	276 00	420 75	8,938 80
Menuiserie	91,998 05	325 80	»	140 02	268 80	2,383 65	95,116 32
Serrurerie	68,941 80	1,894 05	1,568 00	8,637 20	124 80	793 00	81,958 85
Marbrerie	4,732 00	»	»	»	»	488 50	5,220 50
Peinture, Tenture, Vitrerie	36,631 61	640 86	400 00	78 41	70 92	552 94	38,374 74
						Total	614,767 75
Imprévus 1/10e							61,476 78
						Ensemble	676,244 53

Ajoutant : Calorifères à air chaud (prévision du Devis) — 21,000 00

Fosses d'aisances et Barrières de séparation des Cours (Estimation) — 5,000 00

Montant de la Dépense — 702,244 53

Dressé par l'architecte soussigné.
Charleville, le 1er Mars 1885.
Signé : Petitfils.

Vu :
Charleville le 1er Mars 1885
Le Maire
Signé : V. Laurent.

Vu :
Le Contrôleur des Travaux
Paris, le 12 Novembre 1885
Signé : Gautier.

Vu et Approuvé
Le Ministre
de l'Instruction Publique,
des Beaux Arts et des Cultes
Signé : René Goblet.

Facture du commerce de bois JACQUEMART—Torcy/Sedan

Vendu à Messieurs ALEXANDRE & FOURNAISE à Sedan.

Torcy, le 5 Mai 1883

Taille du document : 21.2 x 26.5

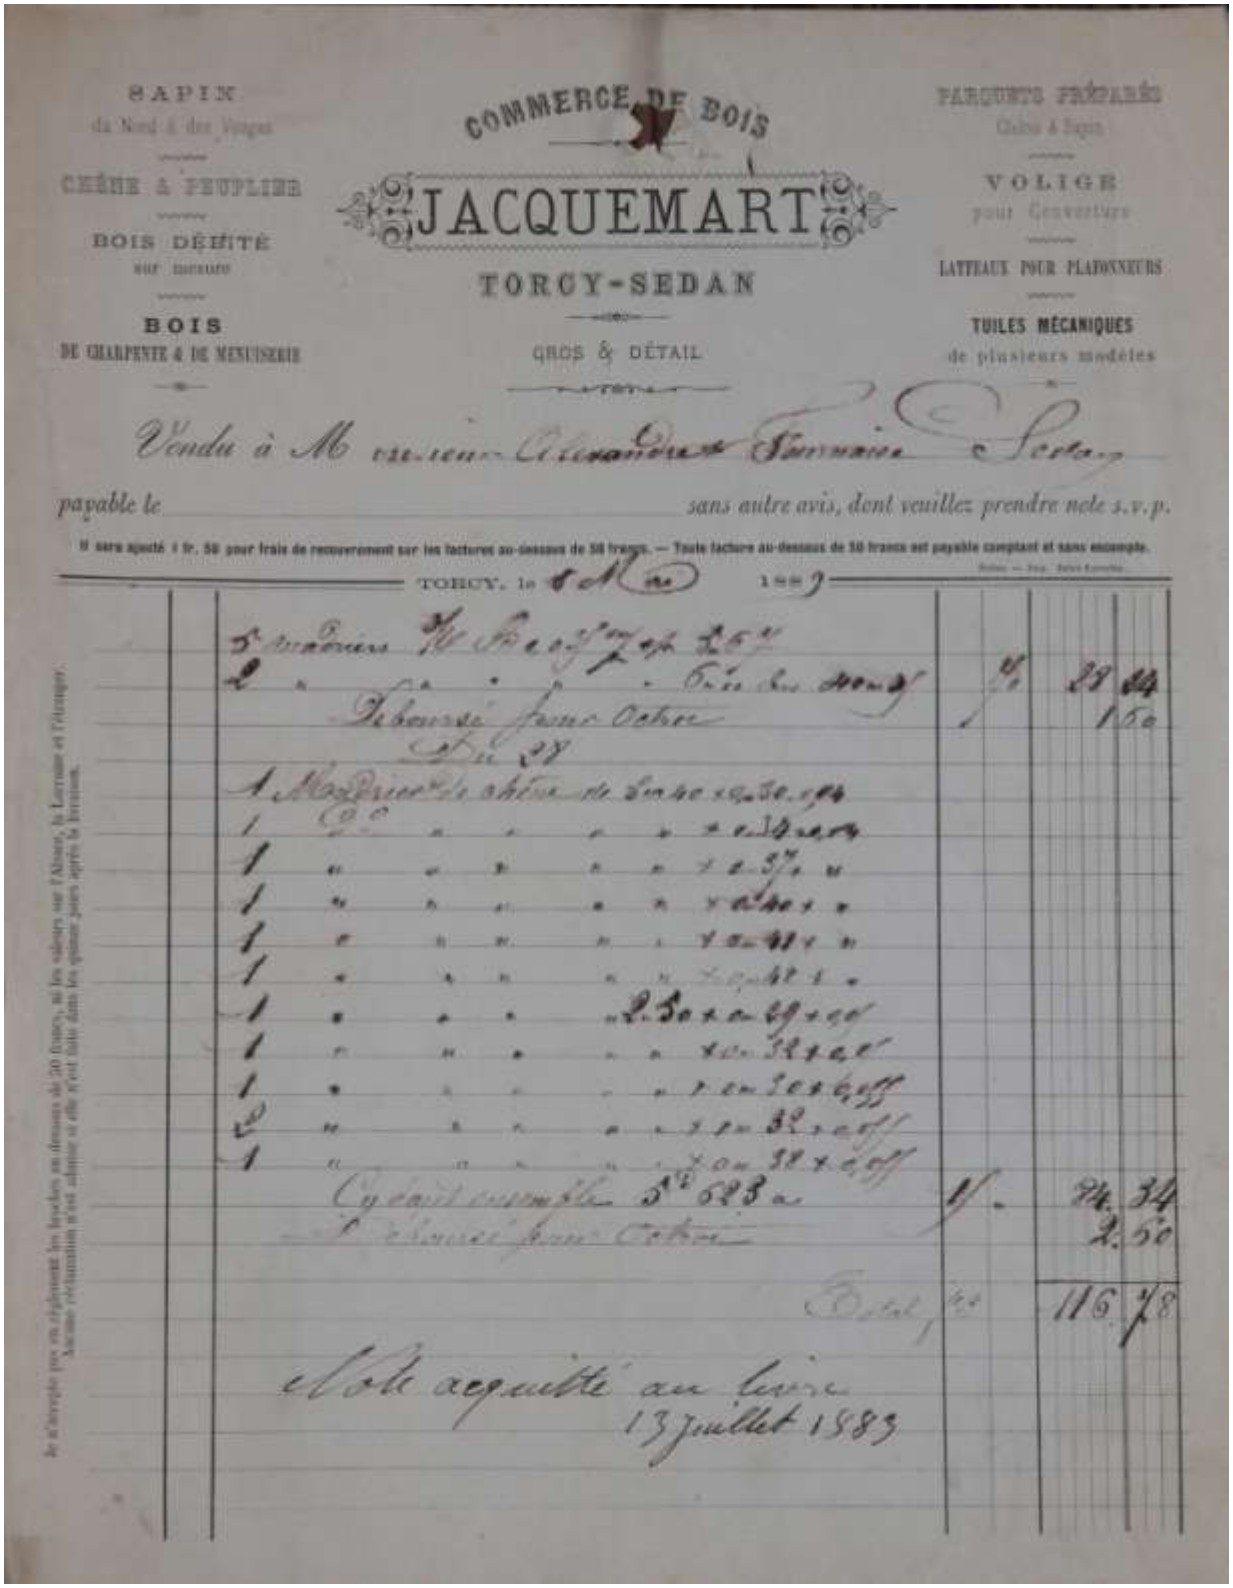

Facture du commerce de bois JACQUEMART—Torcy/Sedan

Vendu à Messieurs ALEXANDRE & FOURNAISE à Sedan.

Torcy, le 22 juin 1883

Taille du document : 21.2 x 26.5

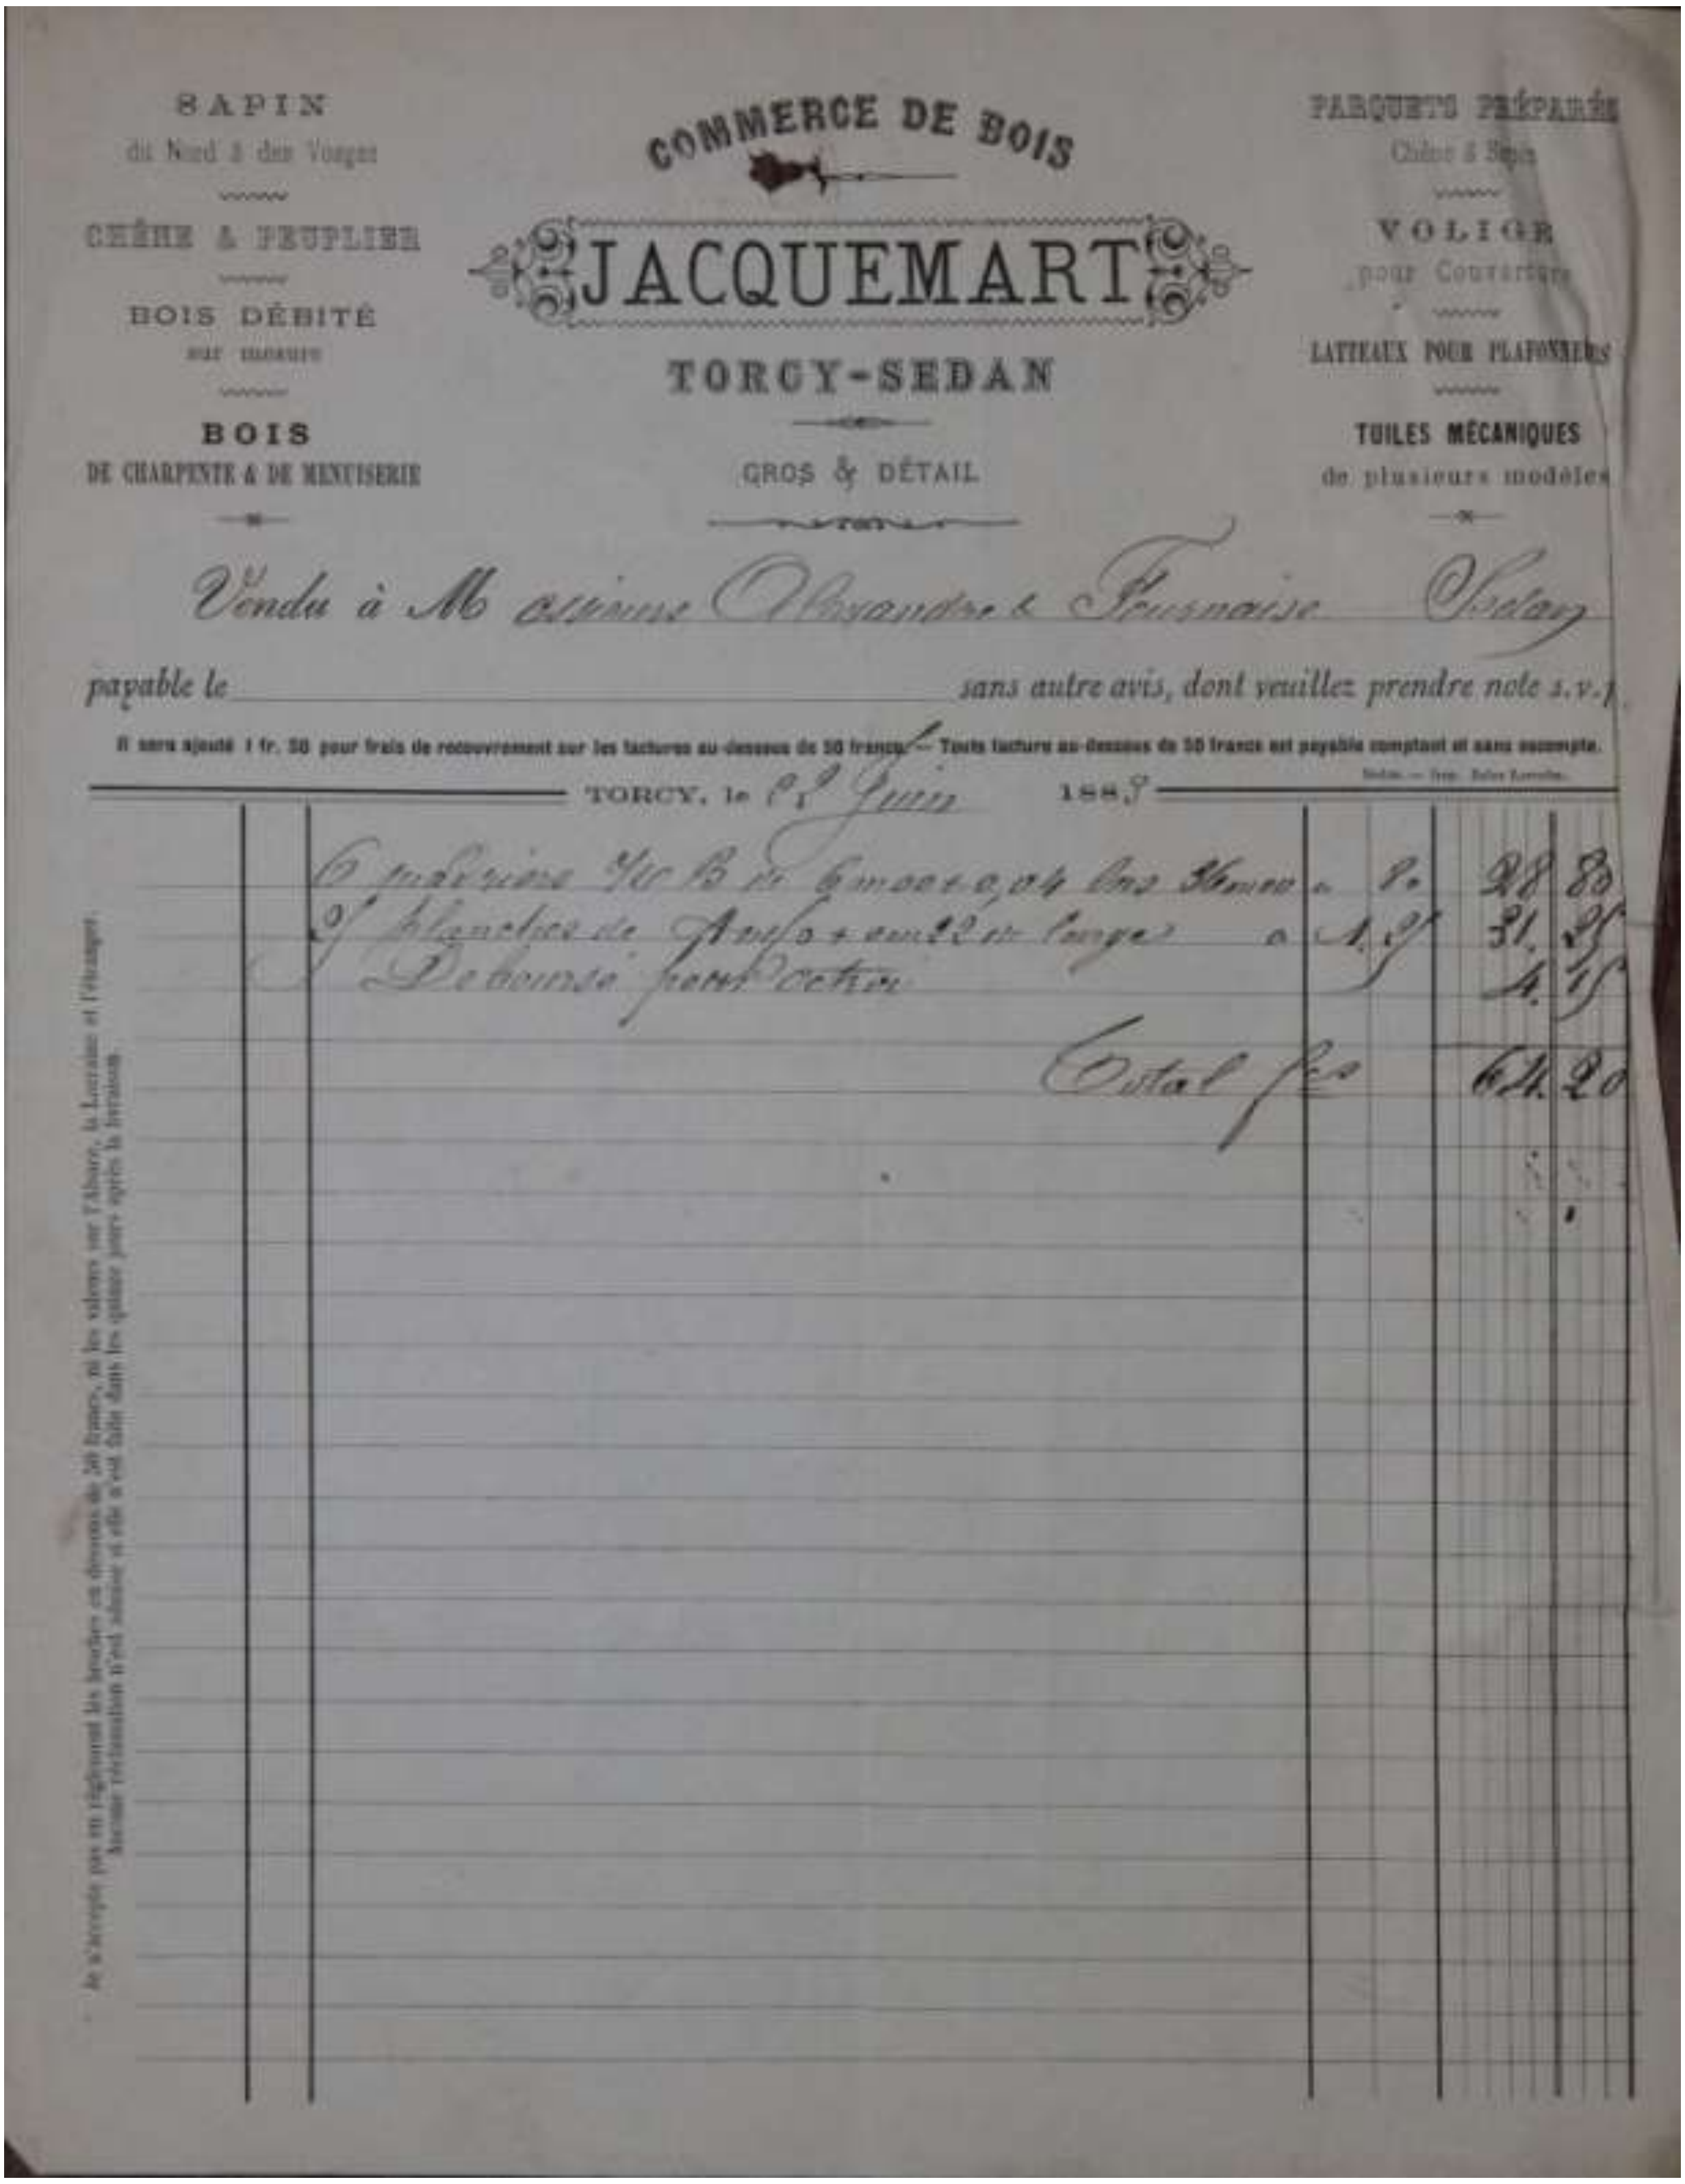

SAPIN du Nord & des Vosges
CHÊNE & PEUPLIER
BOIS DÉBITÉ sur mesure
BOIS DE CHARPENTE & DE MENUISERIE

COMMERCE DE BOIS
JACQUEMART
TORCY-SEDAN
GROS & DÉTAIL

PARQUETS PRÉPARÉS Chêne & Sapin
VOLIGE pour Couverture
LATTEAUX POUR PLAFONNEURS
TUILES MÉCANIQUES de plusieurs modèles

Vendu à M Messieurs Alexandre & Fournaise Sedan

payable le sans autre avis, dont veuillez prendre note s.v.p.

Il sera ajouté 1 fr. 50 pour frais de recouvrement sur les factures au-dessus de 50 francs. — Toute facture au-dessous de 50 francs est payable comptant et sans escompte.

TORCY, le 22 Juin 1883

[illegible]	à	9.	28 80
[illegible] planches de [illegible]	à	1.95	31 25
Déboursé pour octroi			4 15
Total Fr.			64 20

On n'accepte pas en règlement les lettres en dessous de 50 francs, ni les valeurs sur l'Alsace, la Lorraine et l'Étranger. Aucune réclamation n'est admise si elle n'est faite dans les quinze jours après la livraison.

Facture du commerce de bois JACQUEMART—Torcy/Sedan

Vendu à Messieurs ALEXANDRE & FOURNAISE à Sedan.

Torcy, le 27 décembre 1883

Taille du document : 21.2 x 26.5

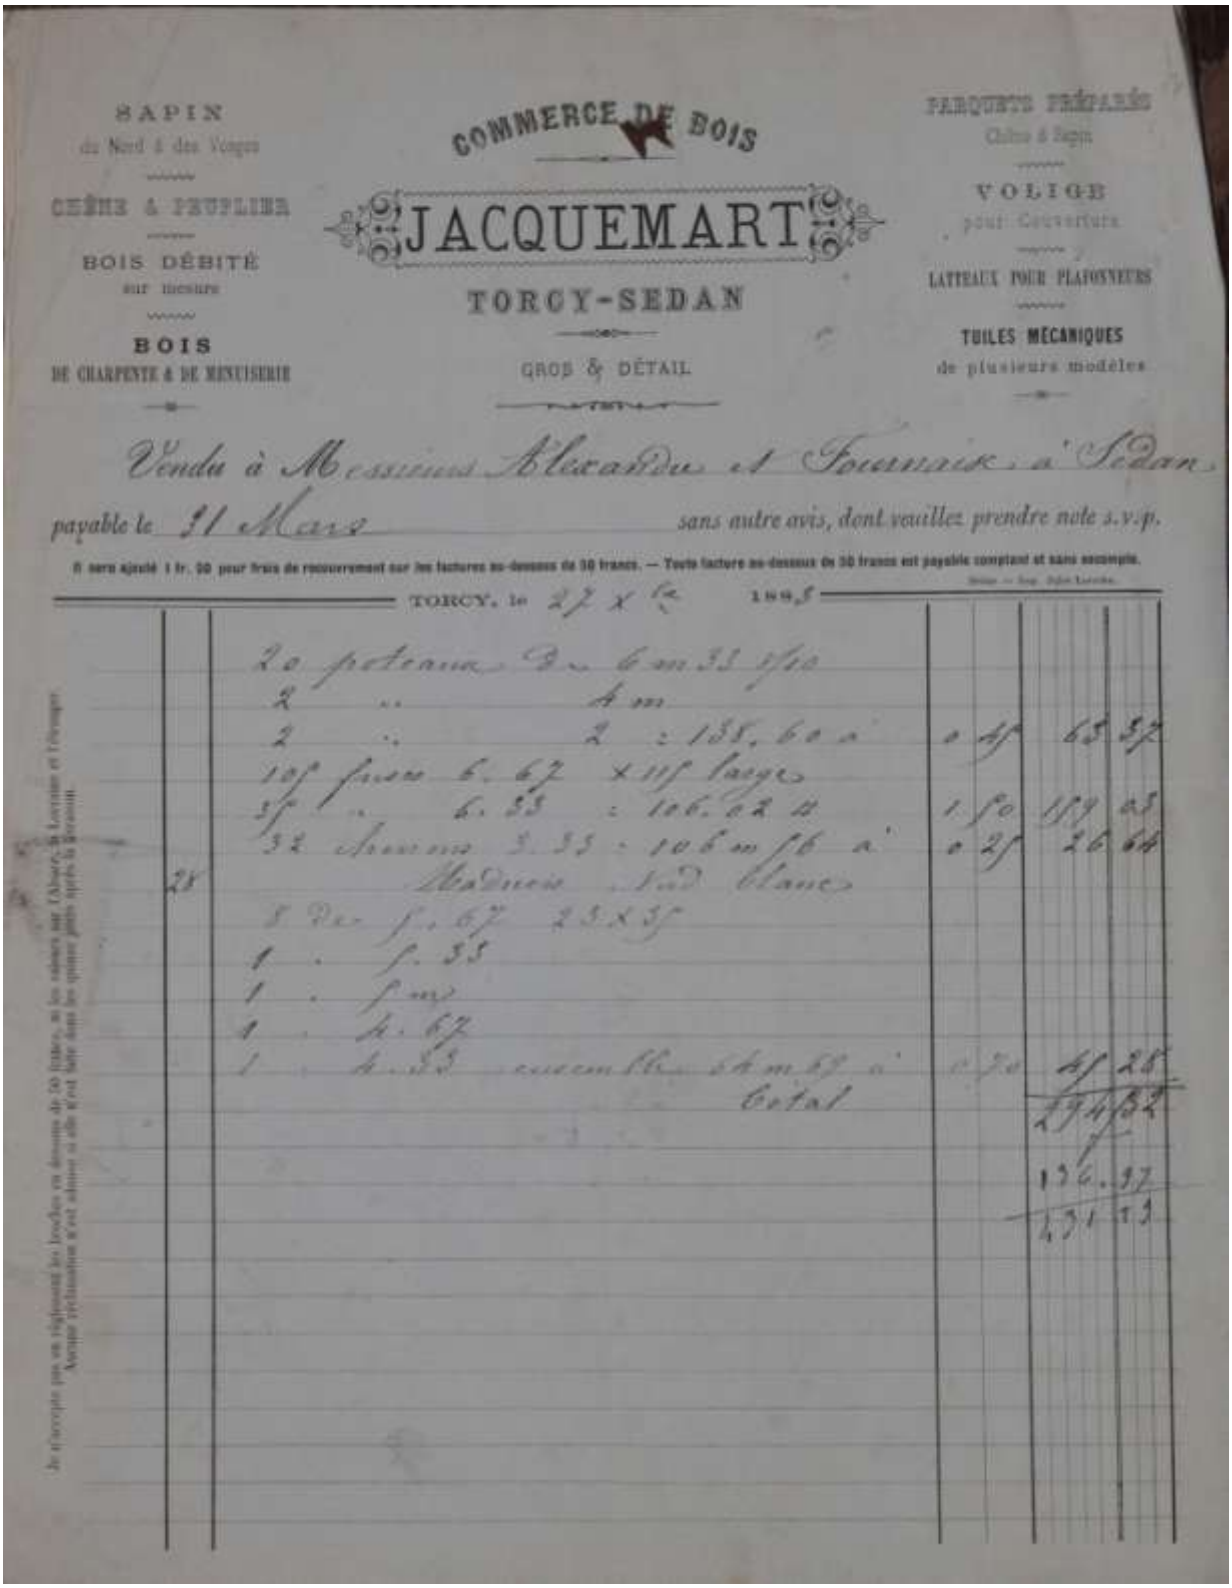

Dessin d’un caveau de famille au 10ème d’exécution

Coupe transversale

Taille du document : recto
24 x 33

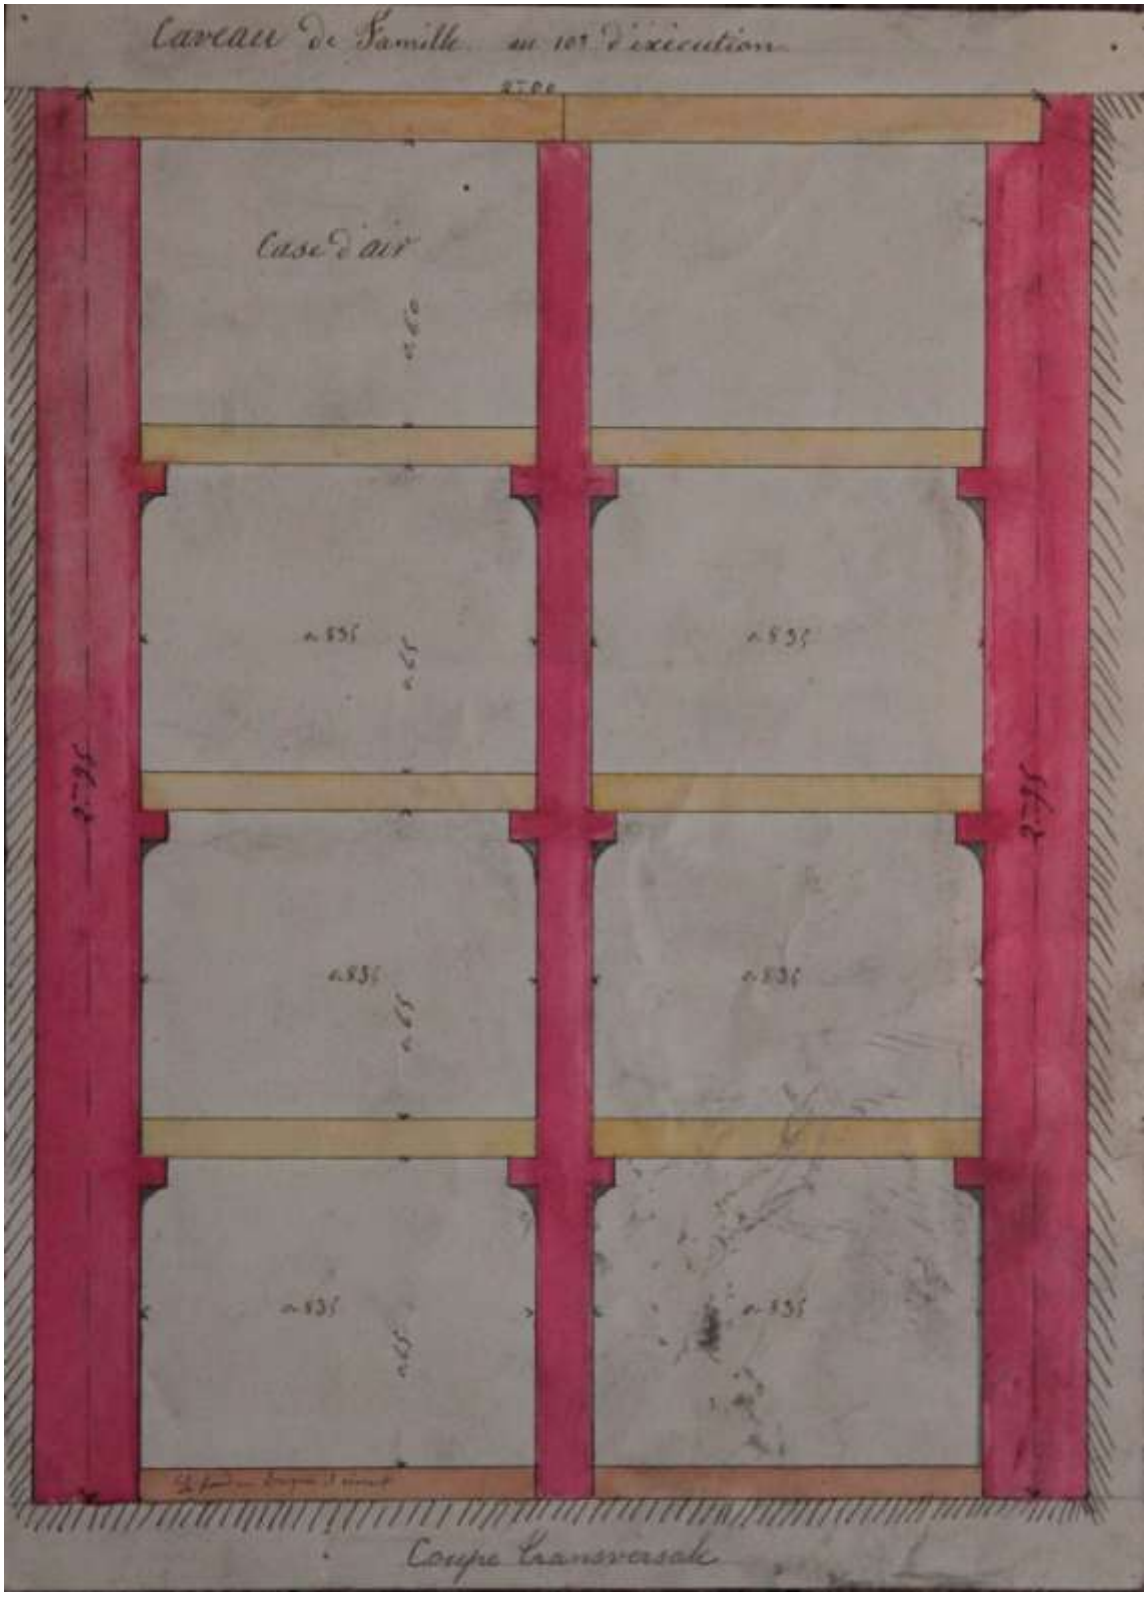

Dessin d'un caveau de famille au 10ème d'exécution

Plan du terrain

Taille du document : verso
24 x 33

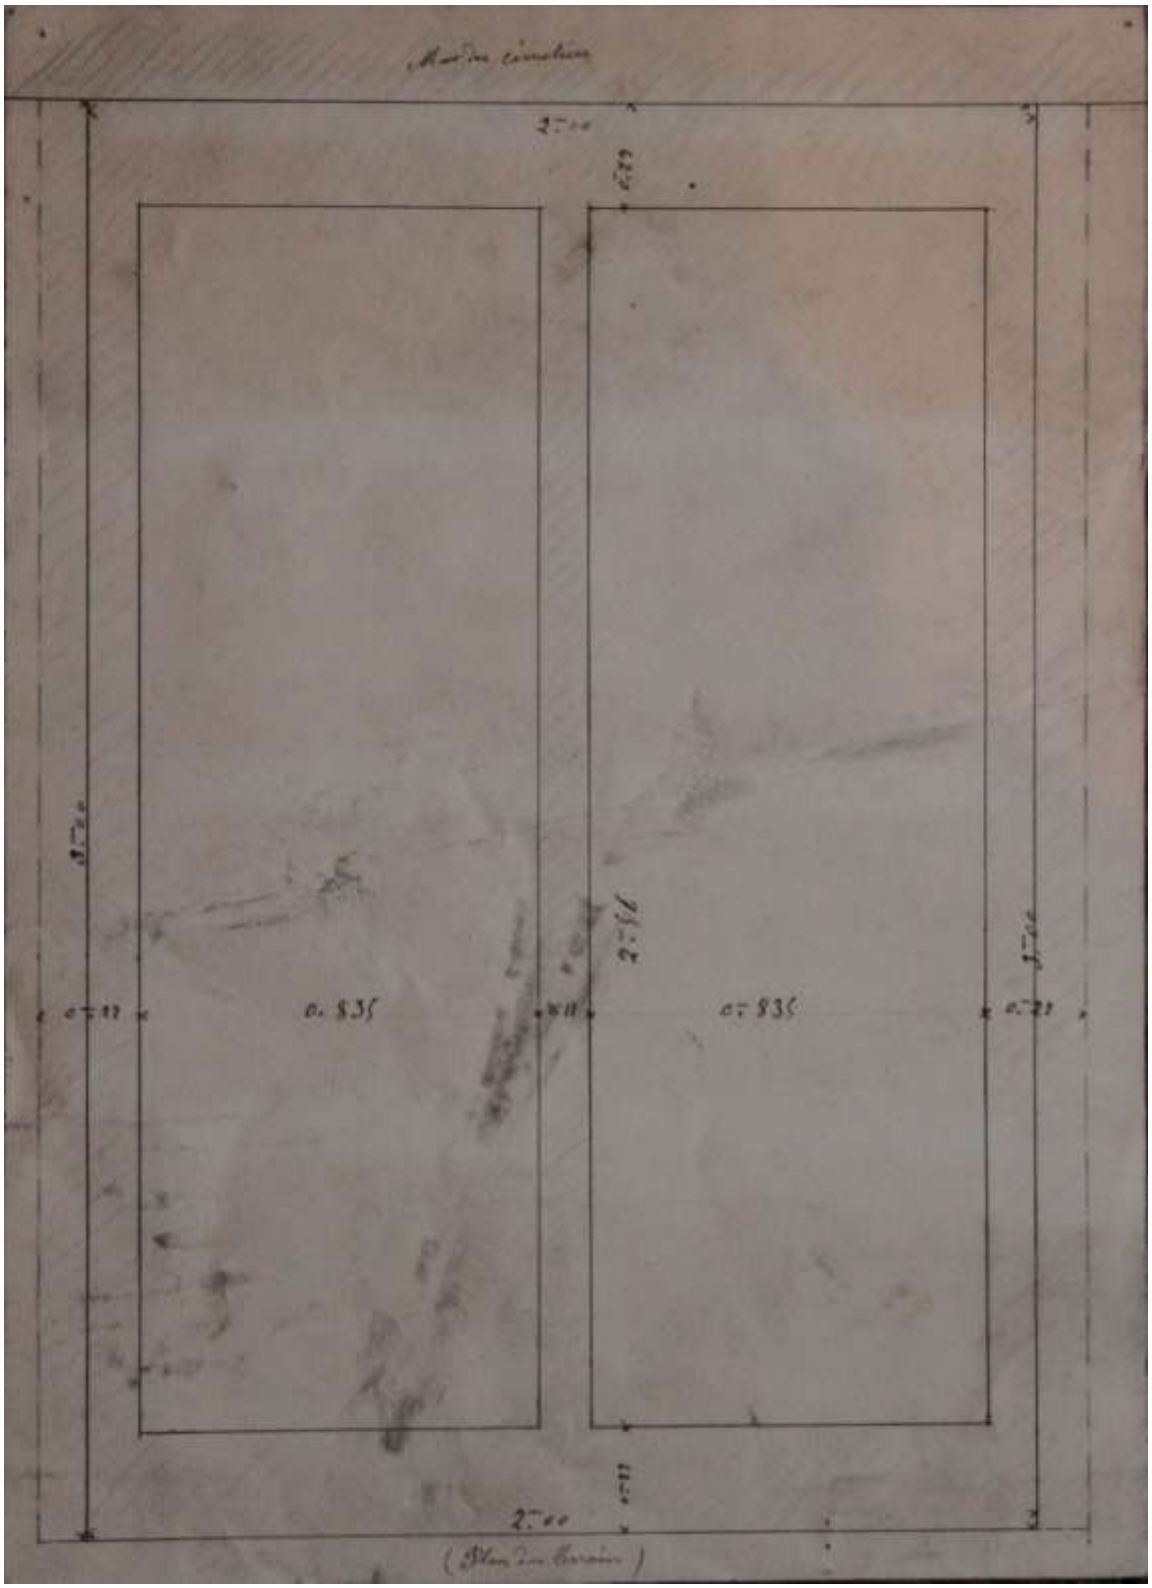

Tombeau de Mr le Baron de MONTAGNAC Propriétaire

Détails grandeur d'Exécution

Taille du document :
73 x 107

Tombeau de Mr le Baron de MONTAGNAC Propriétaire

Détails grandeur d'Exécution

Taille du document :
74.5 x 62.5

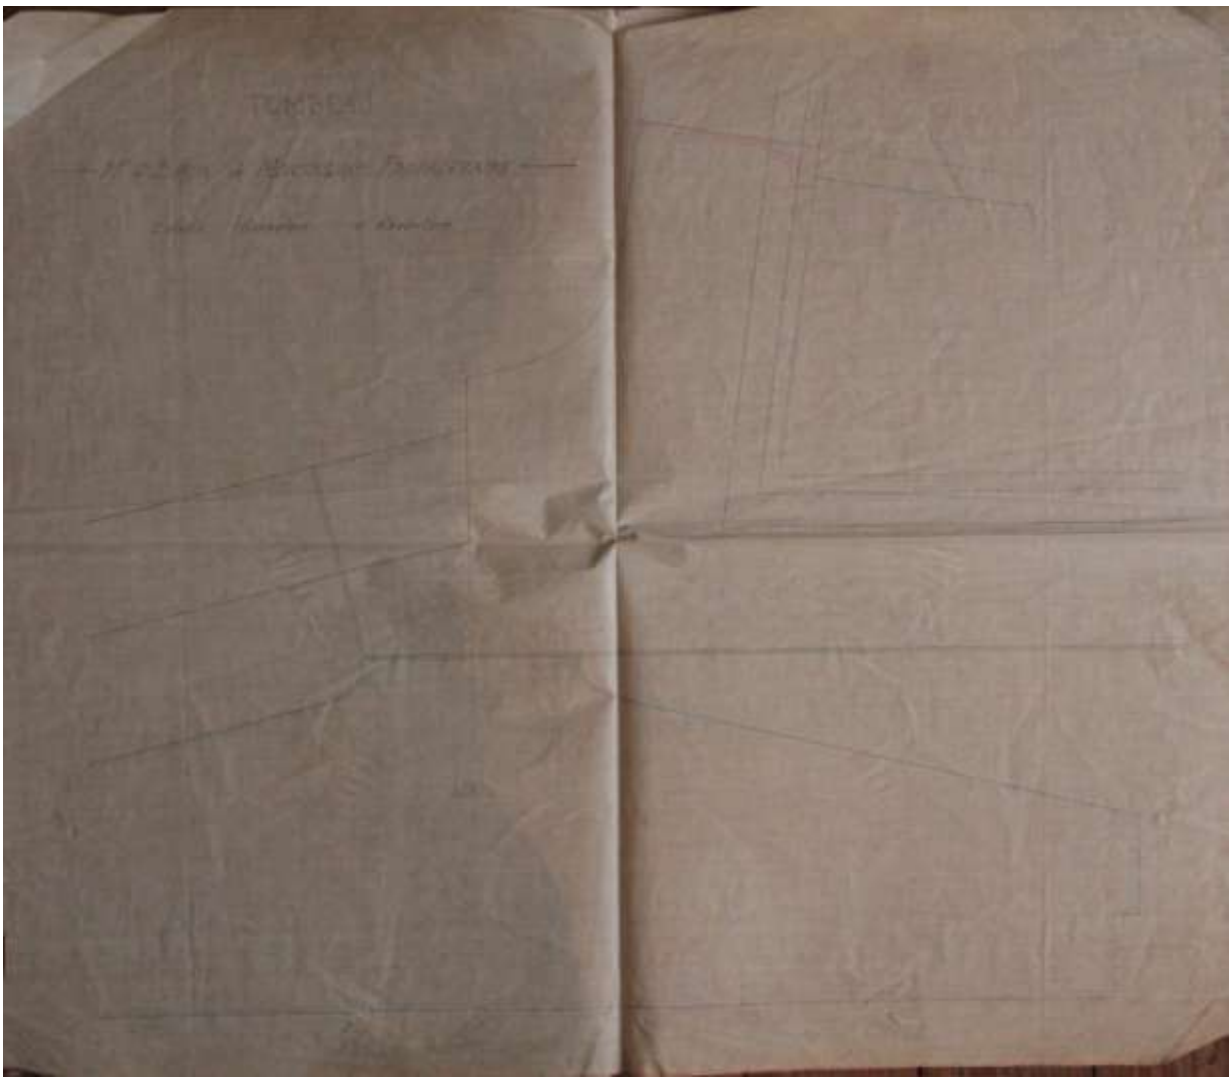

Eglise des Hauts-Buttés

Projet d'Ancel MATÉRAL

Taille du document :
37 x 51.5

Propriété M FÉVRIER — Plan ALEXANDRE & FOURNAISE

Attachements des familles

Habitations, magasins, passerie, corroierie

Taille du document :
79 x 41

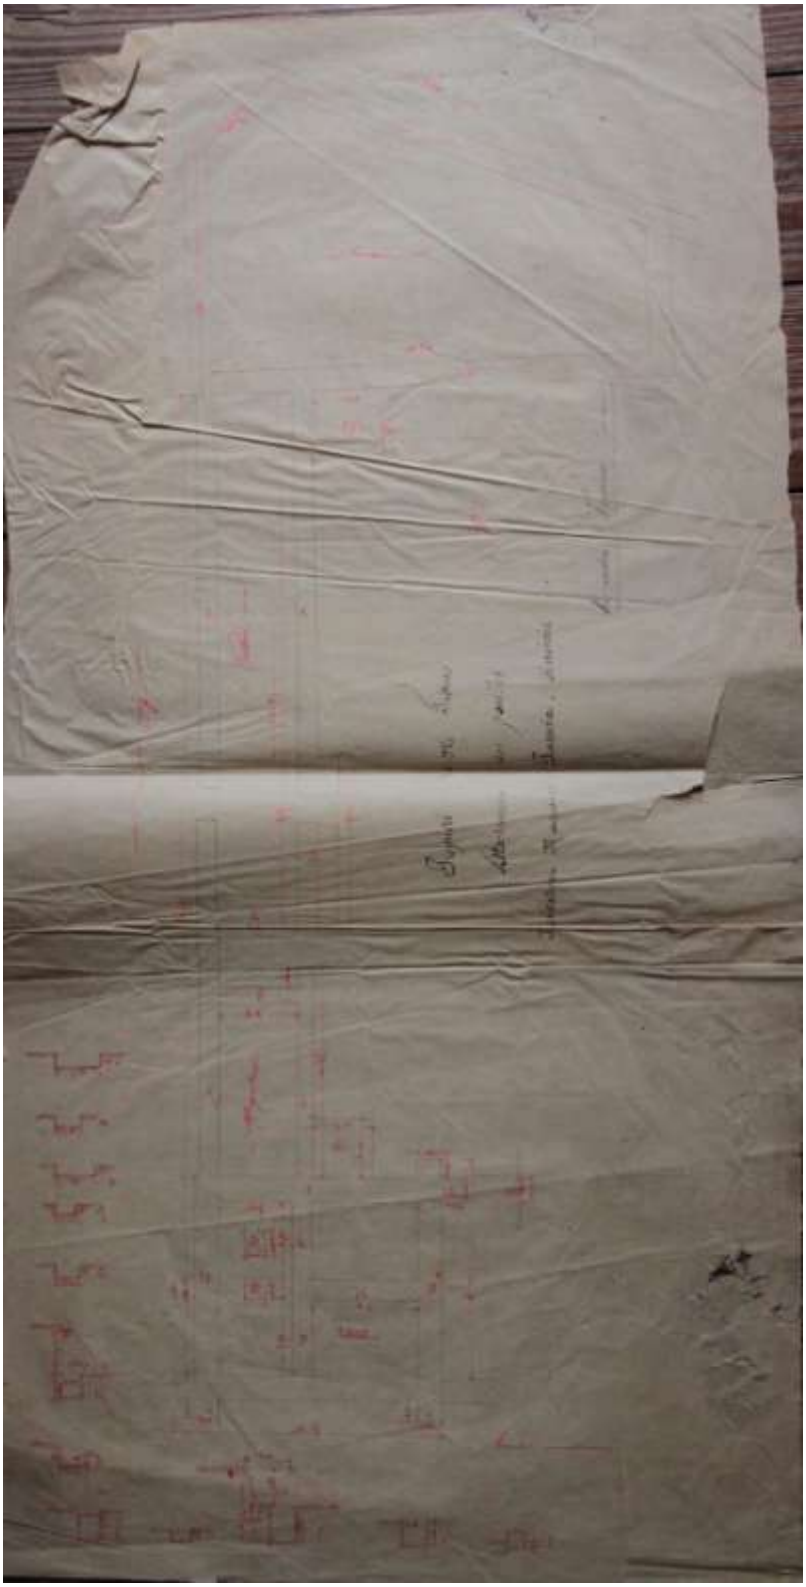

Mr STOFFELS à Sedan

Plan de maçonnerie au-dessus de la retraite des fonds des caves

Taille du document :
65 x 74.5

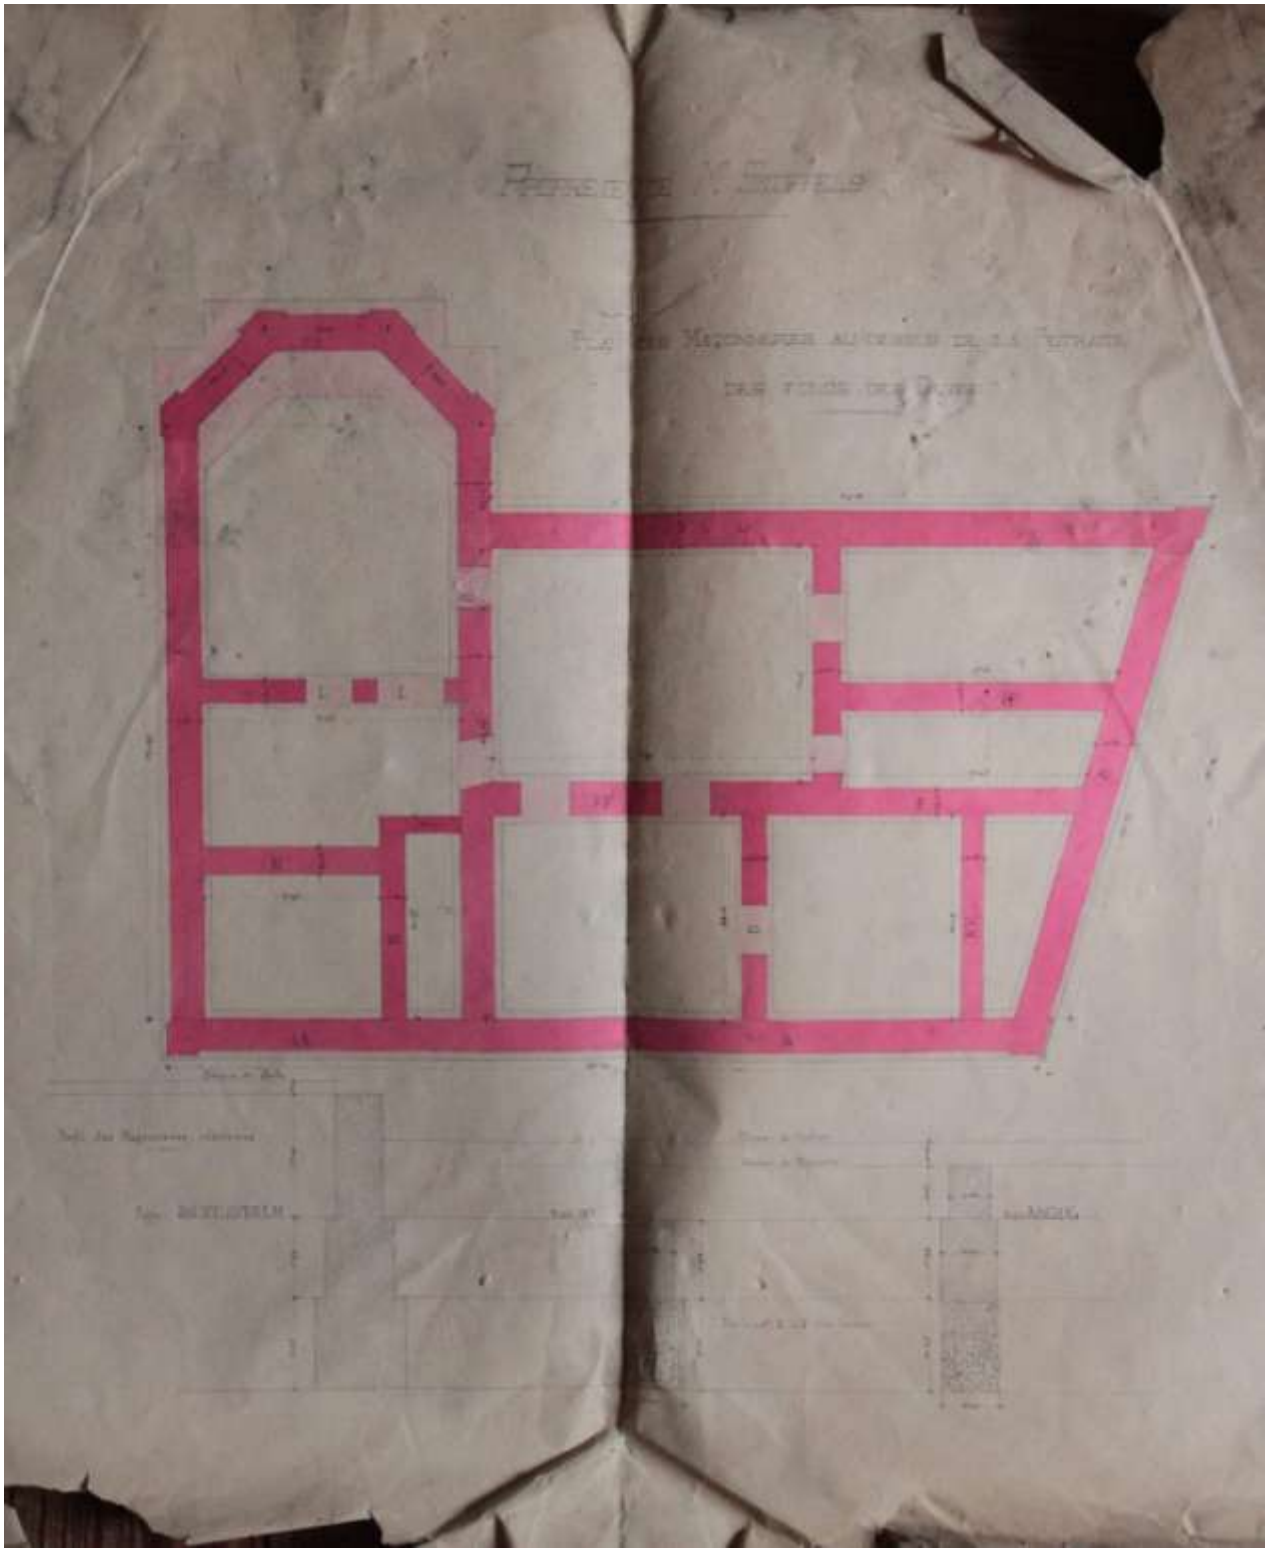

Mr STOFFELS à Sedan

Feuille n°13 Détail de la partie inférieure de la porte d'entrée

Taille du document :
78 x 52.5

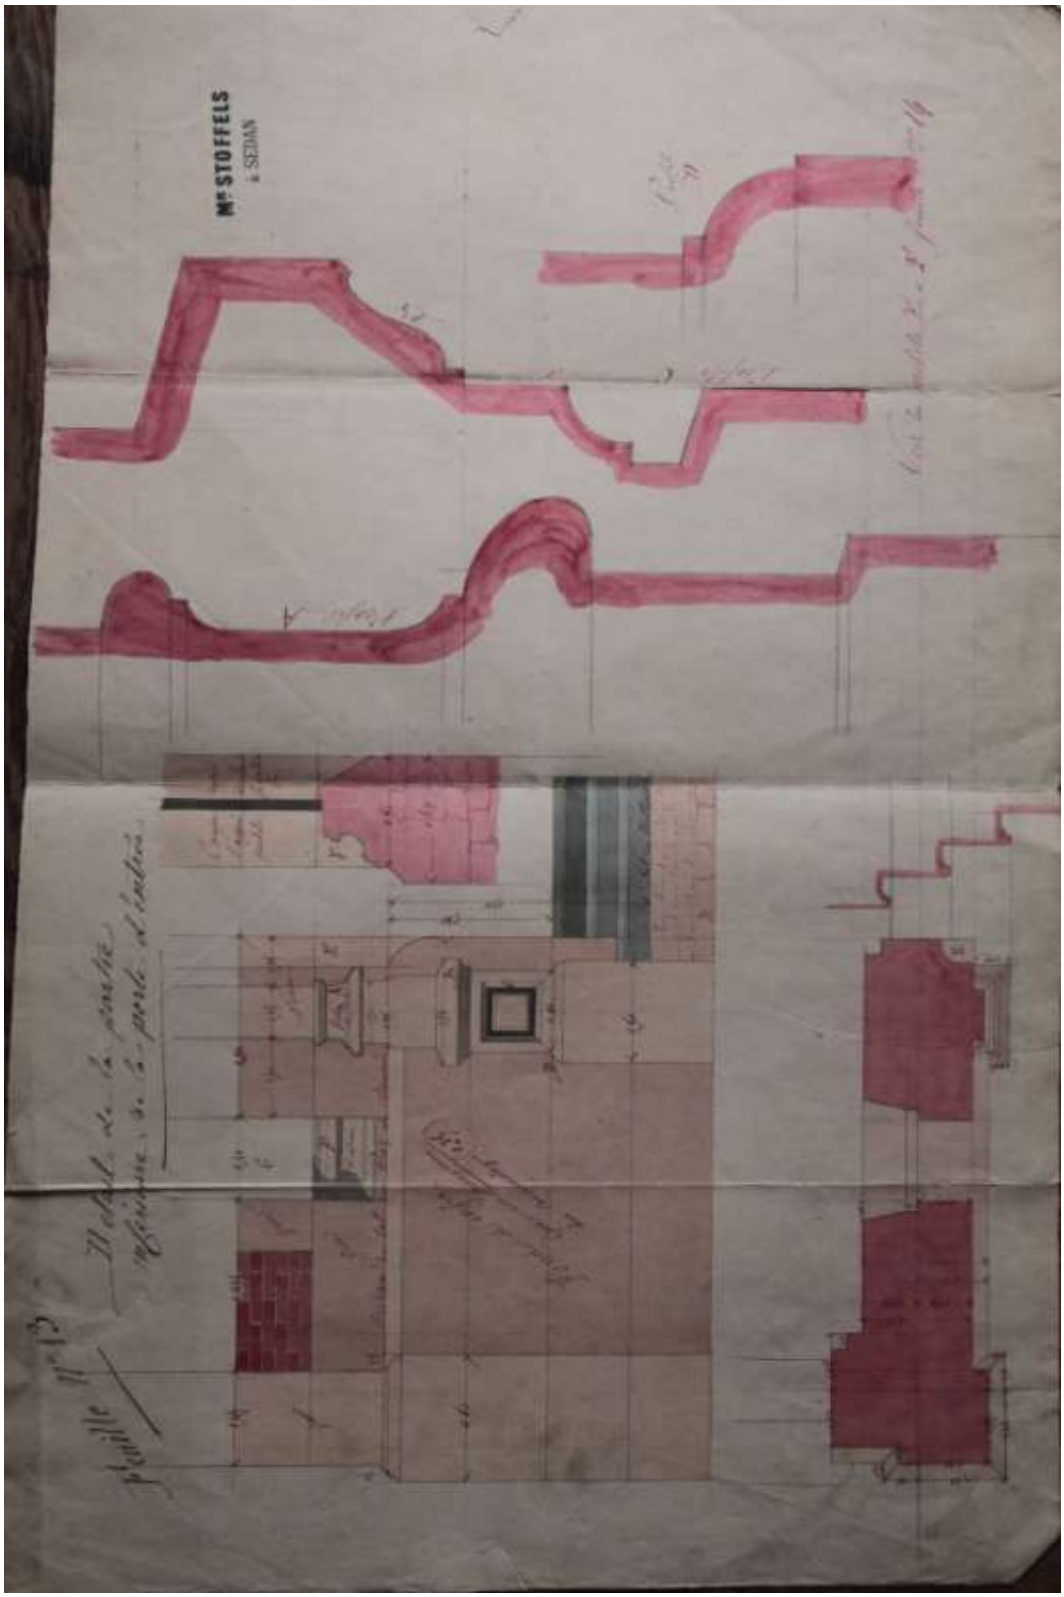

Mr STOFFELS à Sedan

Feuille n°16

Taille du document :
57 x 56.5

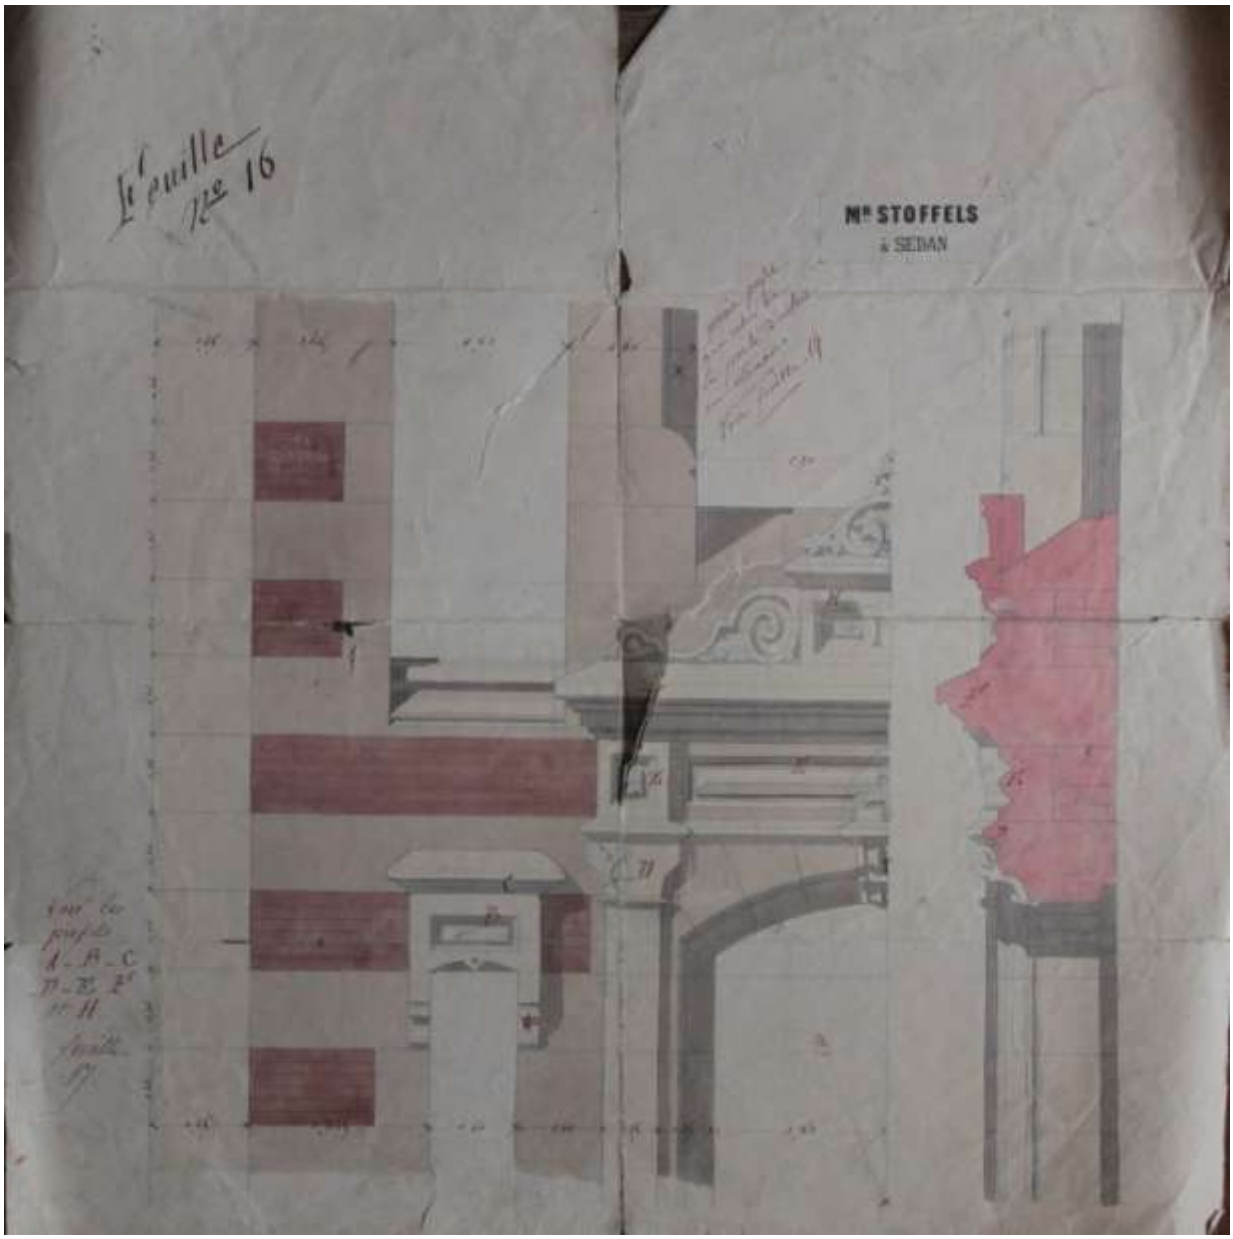

Mr STOFFELS à Sedan

Feuille n°24 Plan Balcon

Taille du document :
65.5 x 31

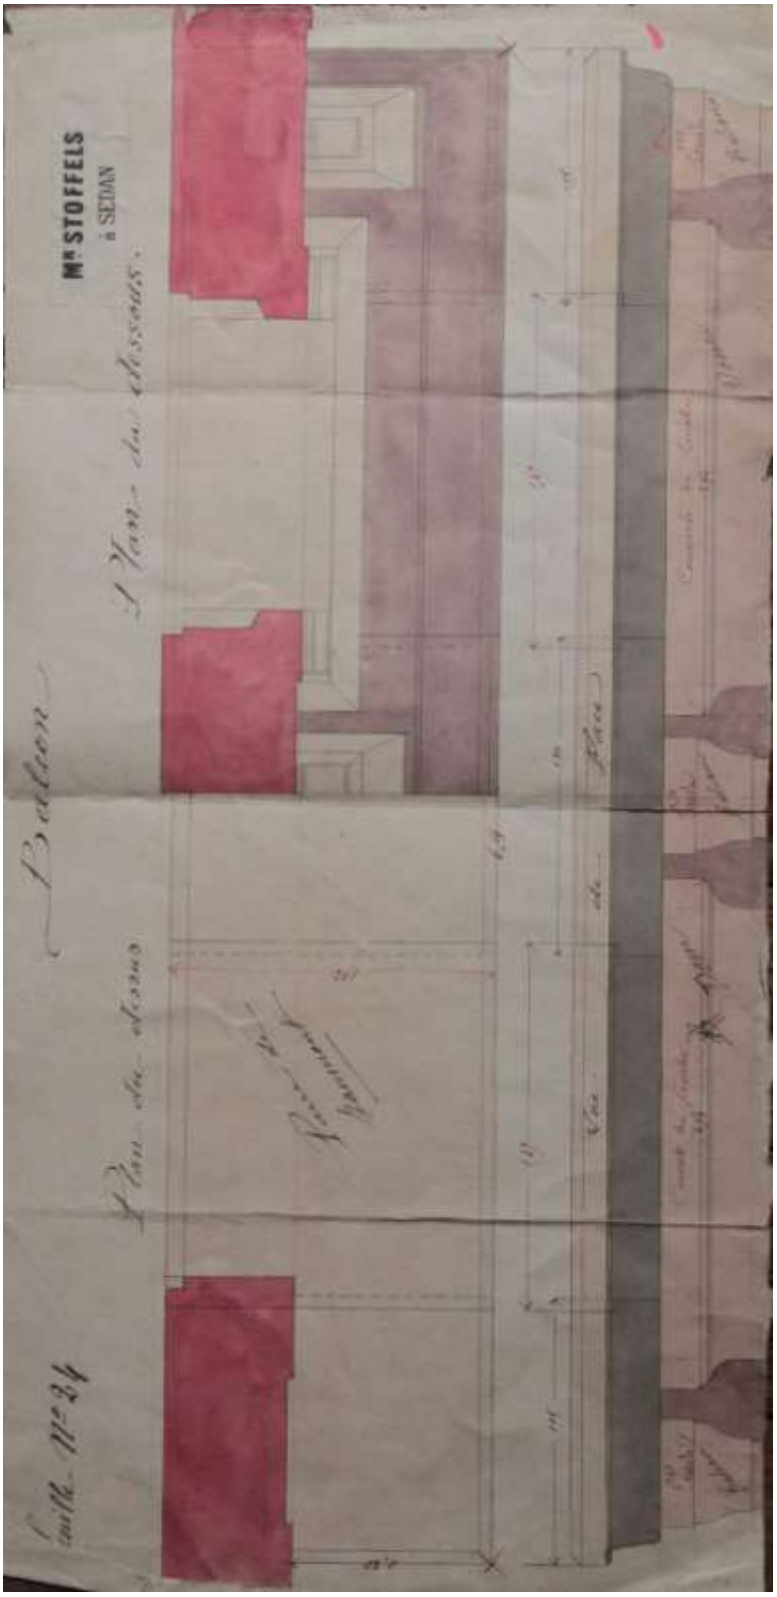

Mr STOFFELS à Sedan

Feuille n°26 Consoles sous le balcon

Taille du document :
56.5 x 149.5

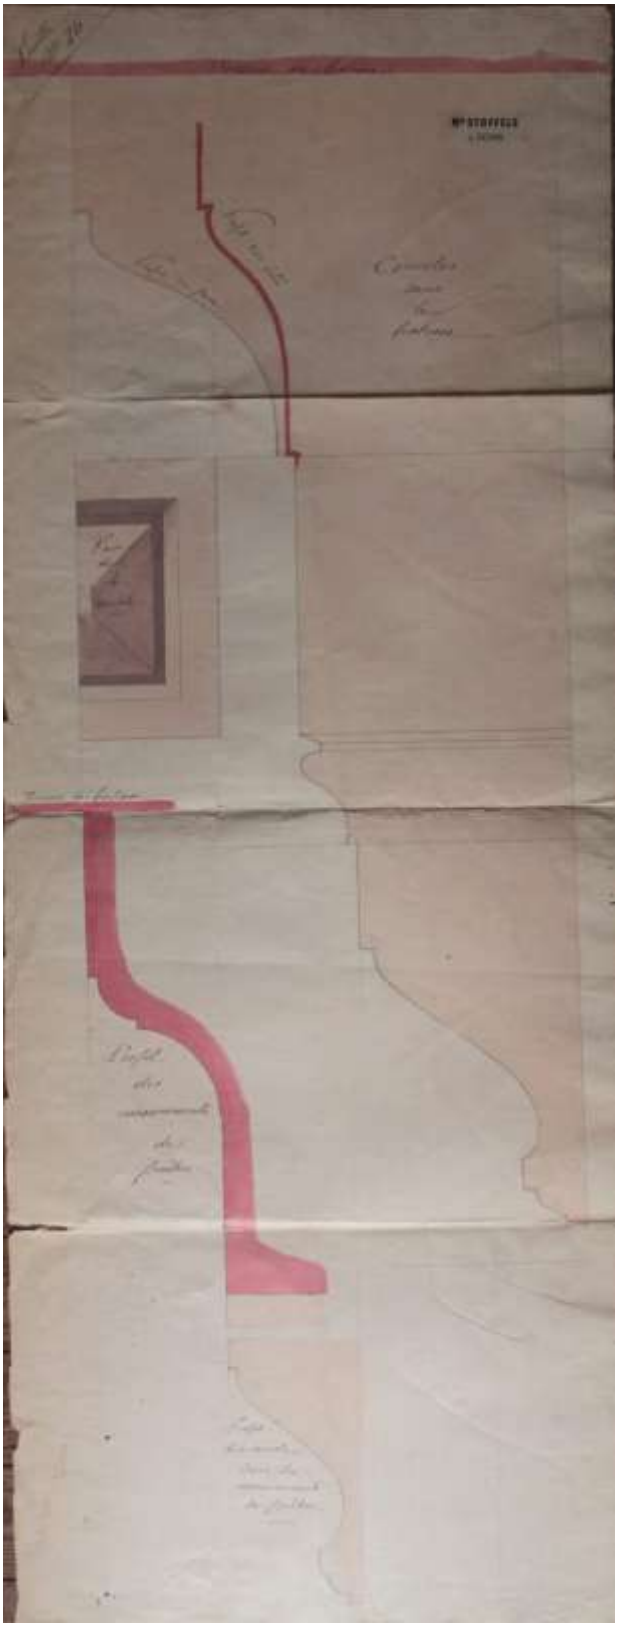

Mr STOFFELS à Sedan

Feuille n°34 — Profil de la corniche pavillon à deux étages

Tout en pierre de Dom, moins les astragales

Taille du document :
69 x 86

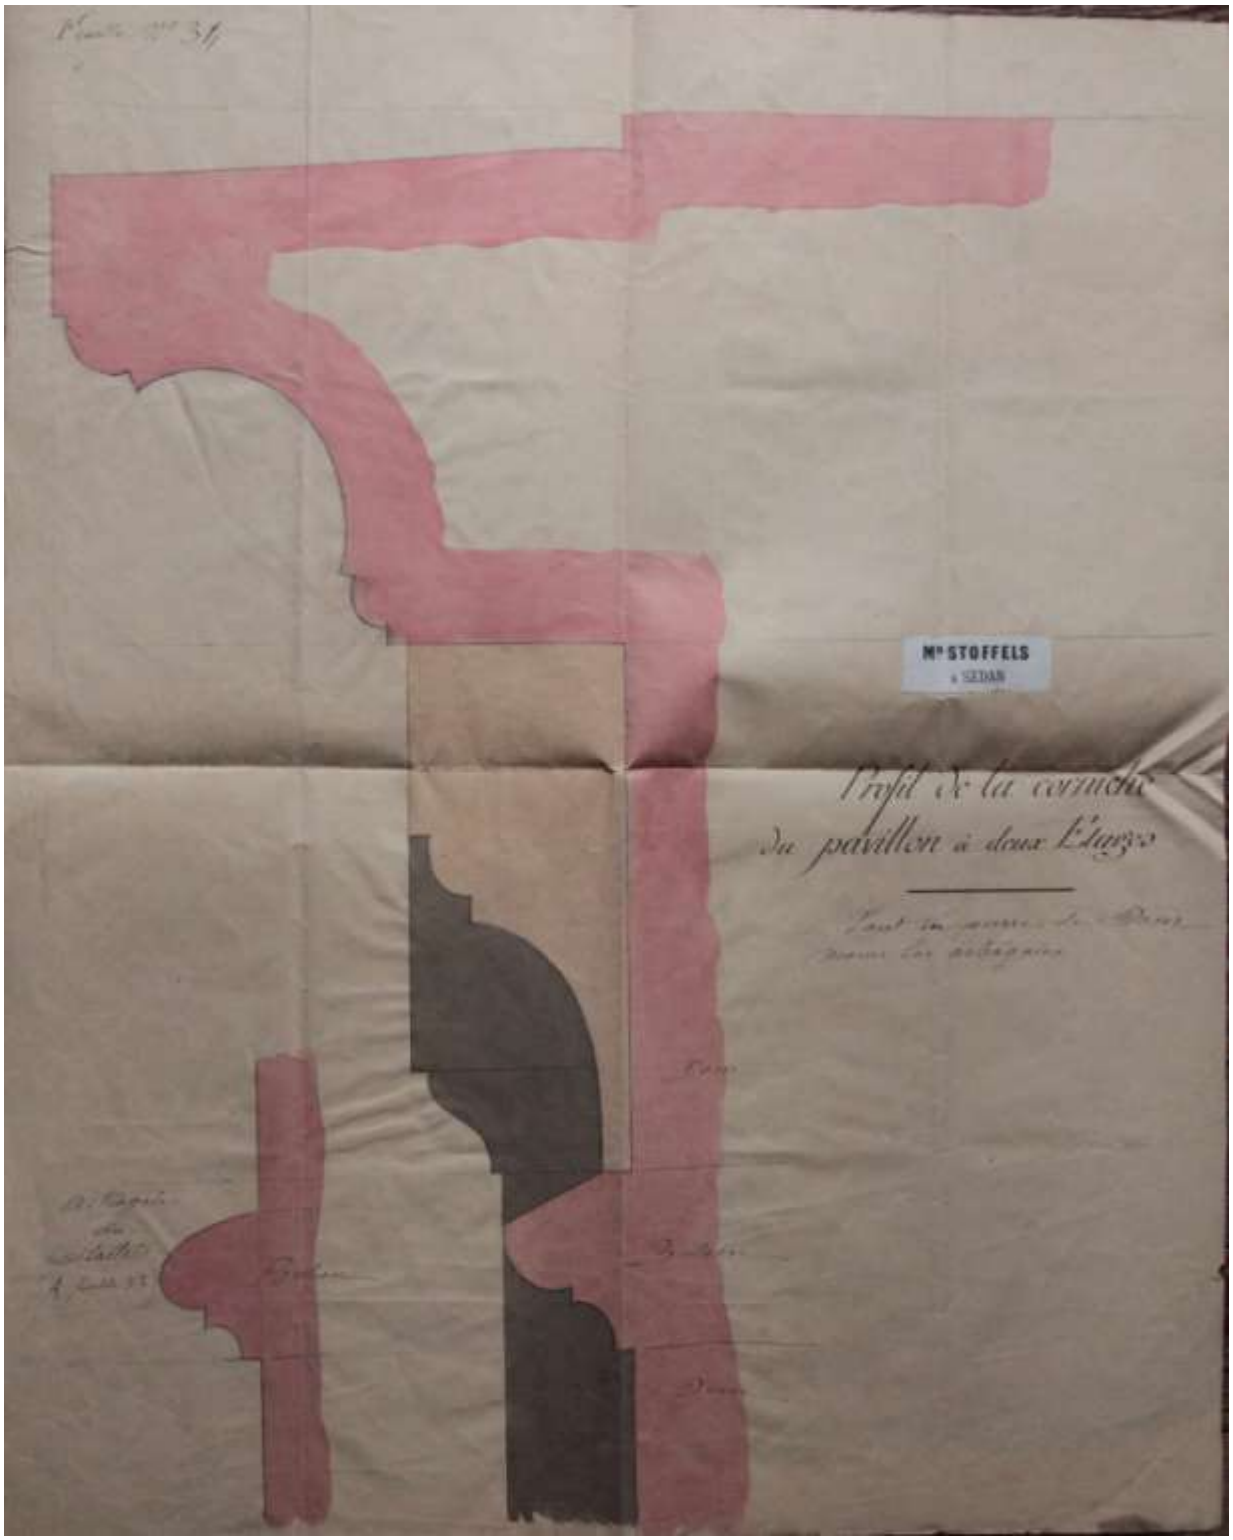

Mr STOFFELS à Sedan

Feuille n°35 Profils des meneaux des fenêtres de la galerie au 1er Etage et de la grande cage d'escalier au 2ème étage

Taille du document :
110 x 69

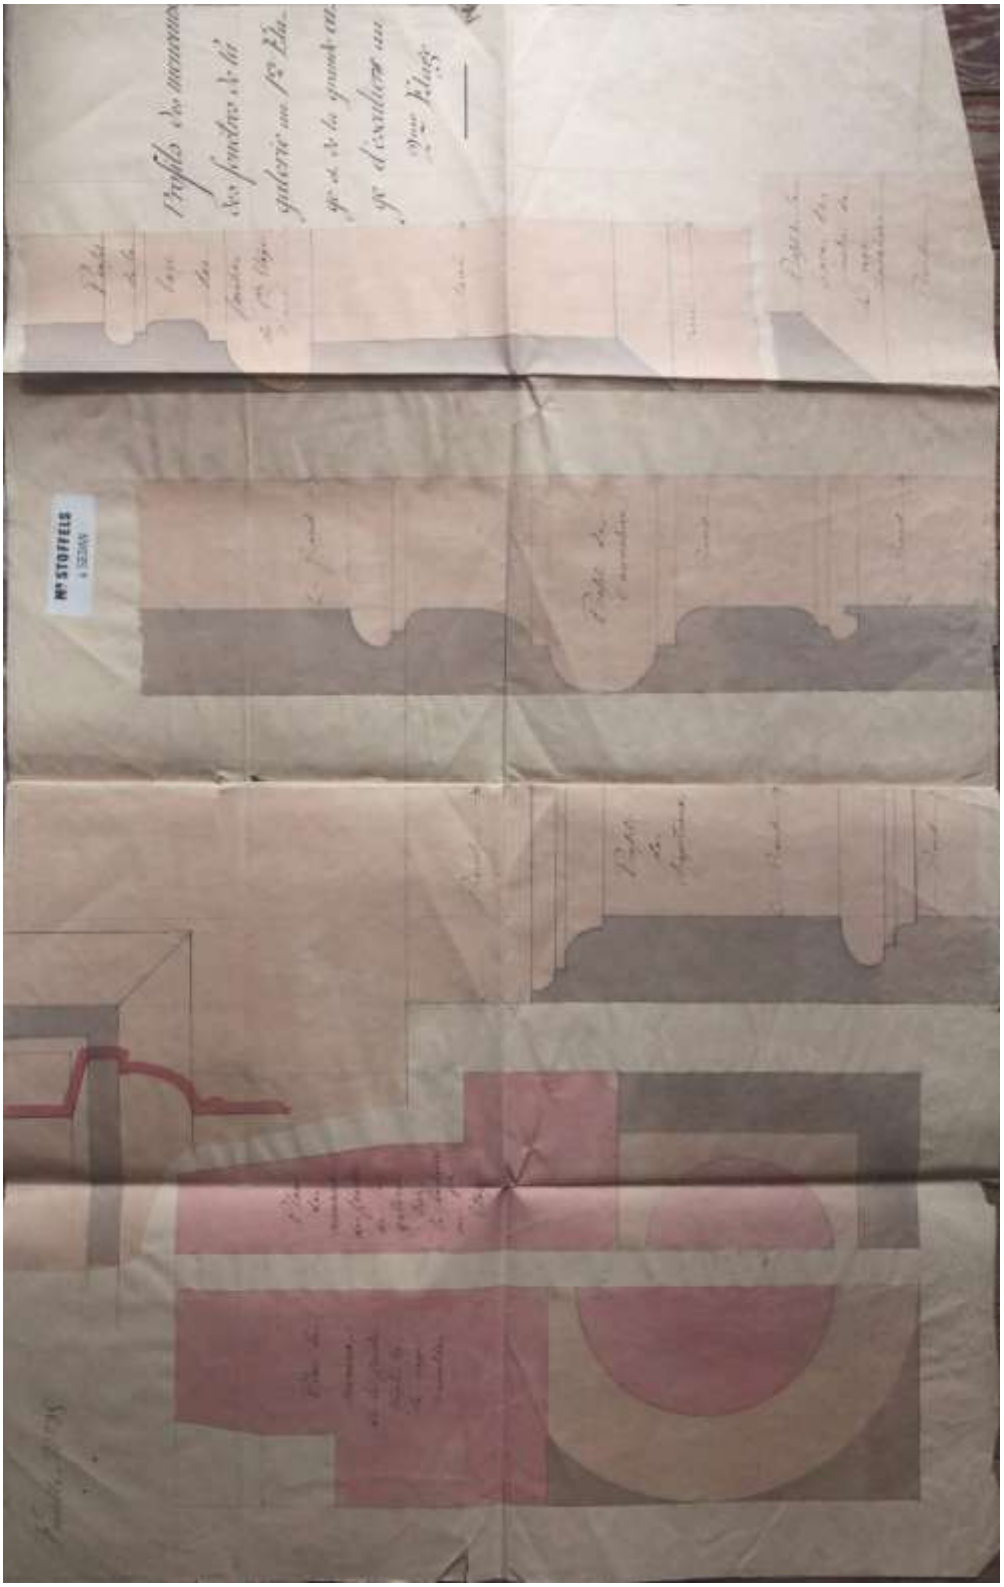

Mr STOFFELS à Sedan

Feuille n°42 Détails Lucarne côté du Boulevard au dessus de la porte d'entrée

Taille du document :
56 x 44

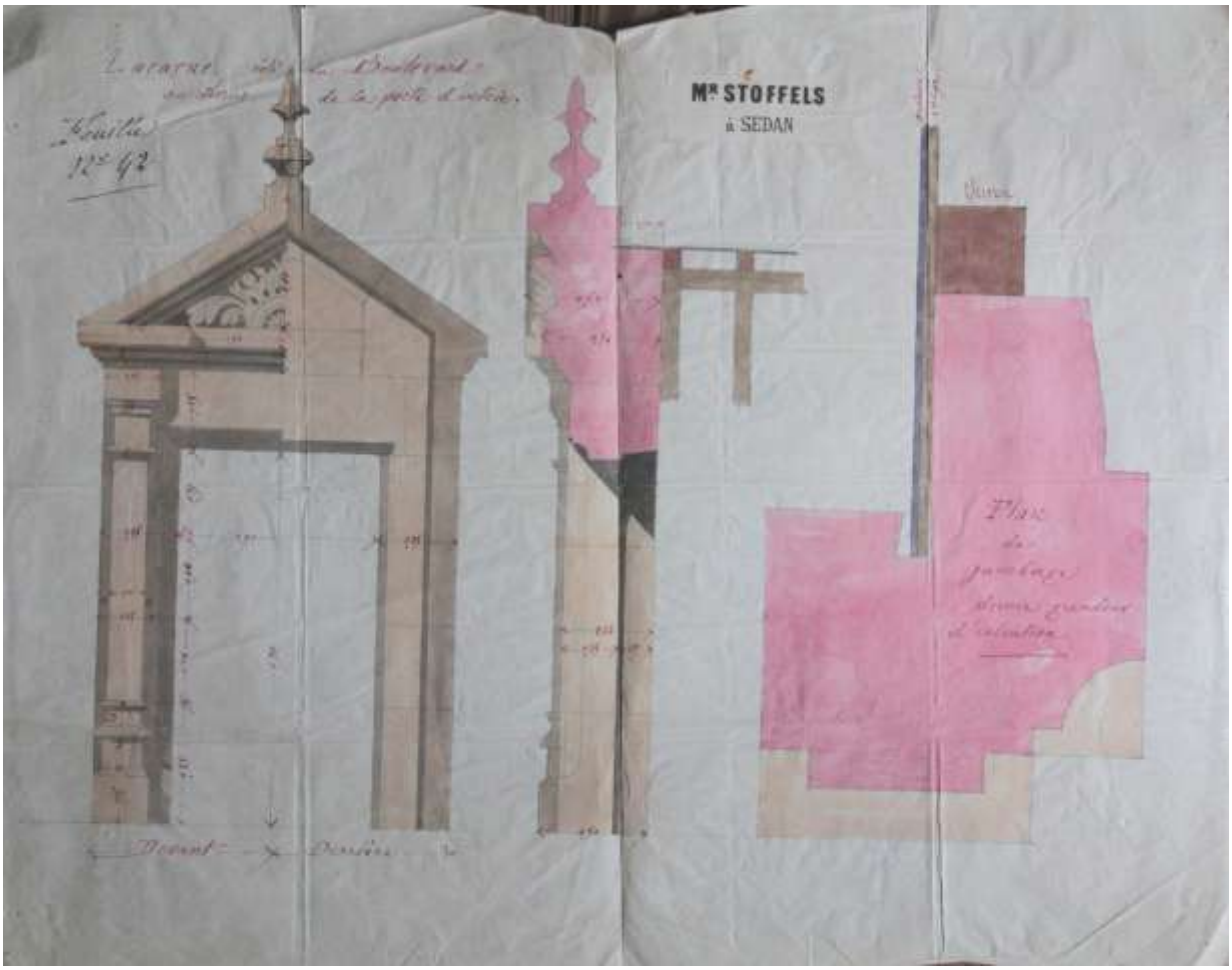

Détails des inscriptions du plan

Mr STOFFELS à Sedan

Feuille n°62

Taille du document :
37.5 x 27.5

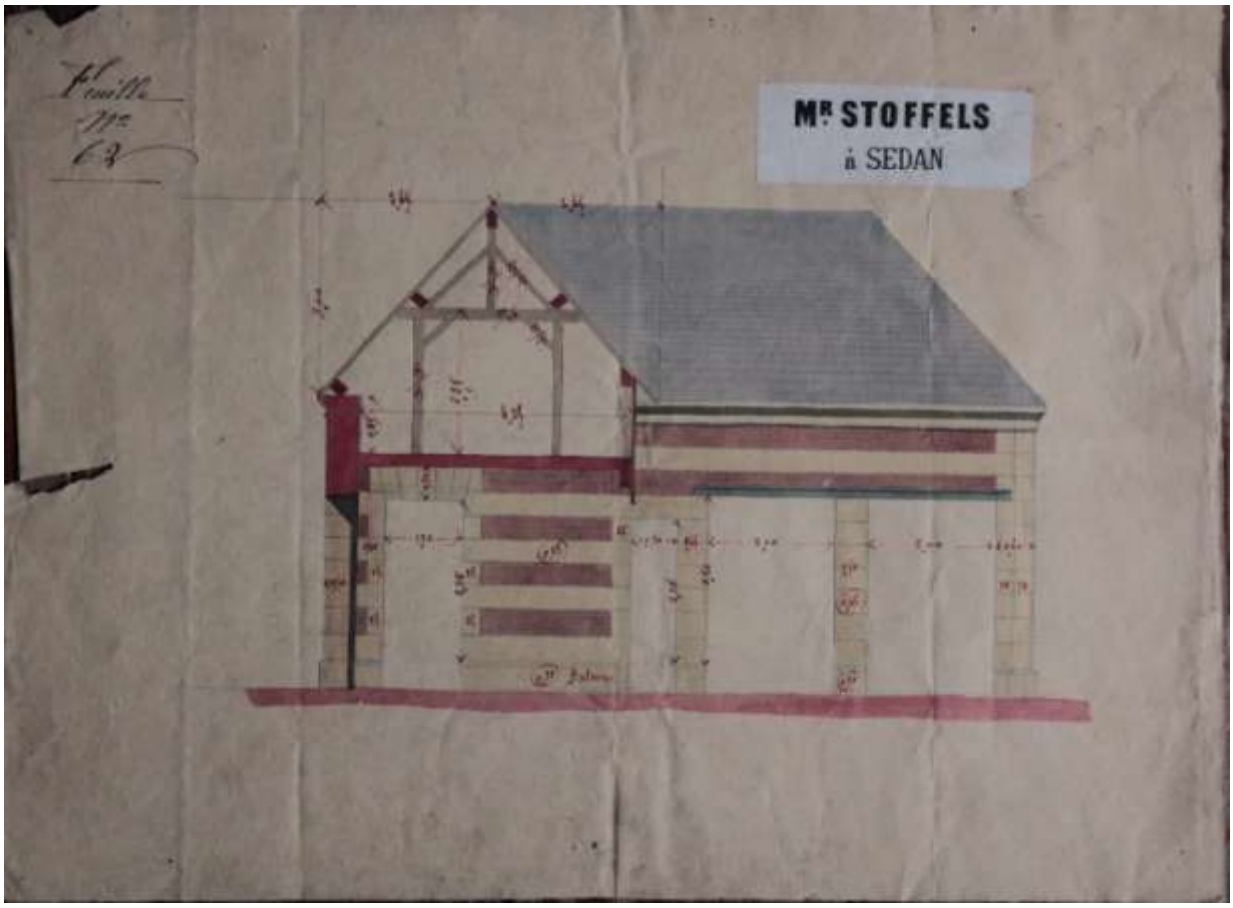

Mr STOFFELS à Sedan

Profils des pilastres de la grande porte d'entrée du jardin

Taille du document :
101.5 x 68.5

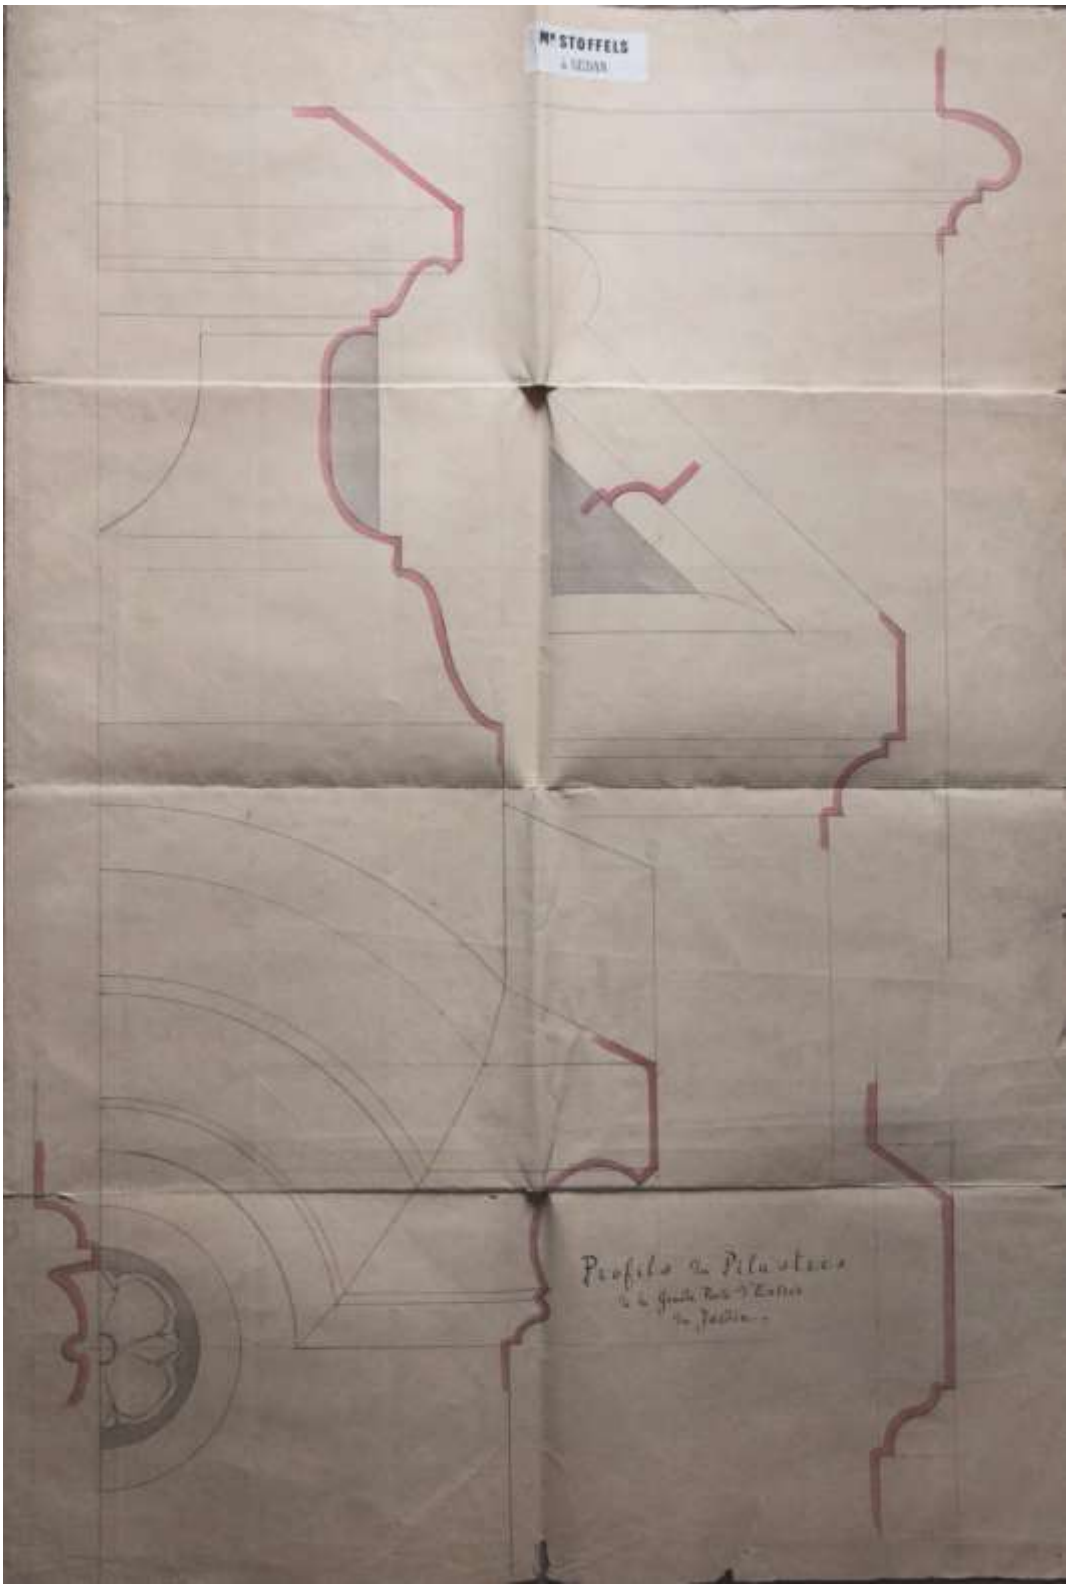

Mr STOFFELS à Sedan

Appuis des fenêtres de l'avant-corps derrière les cheminées

Taille du document :
86 x 27.5

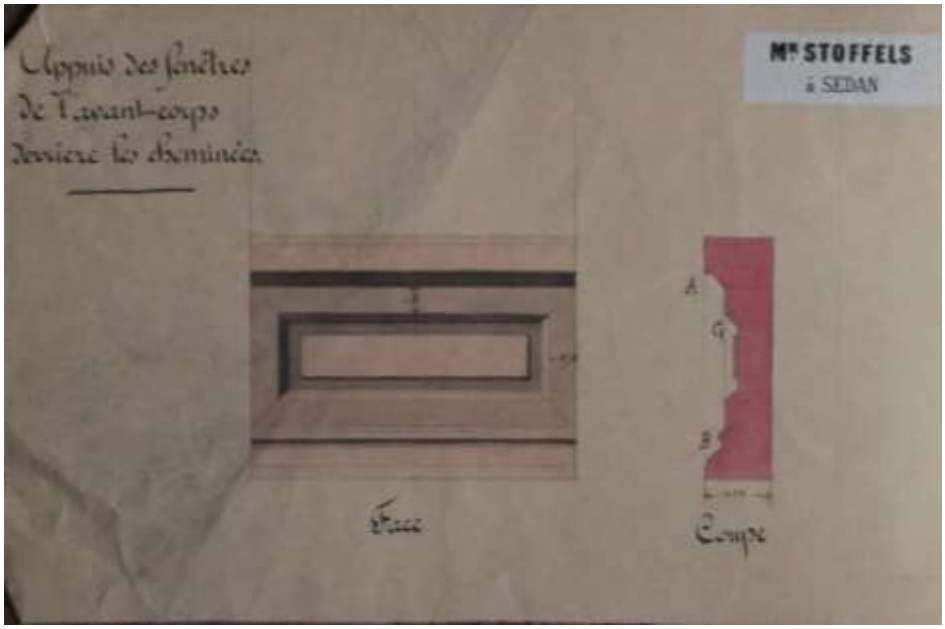

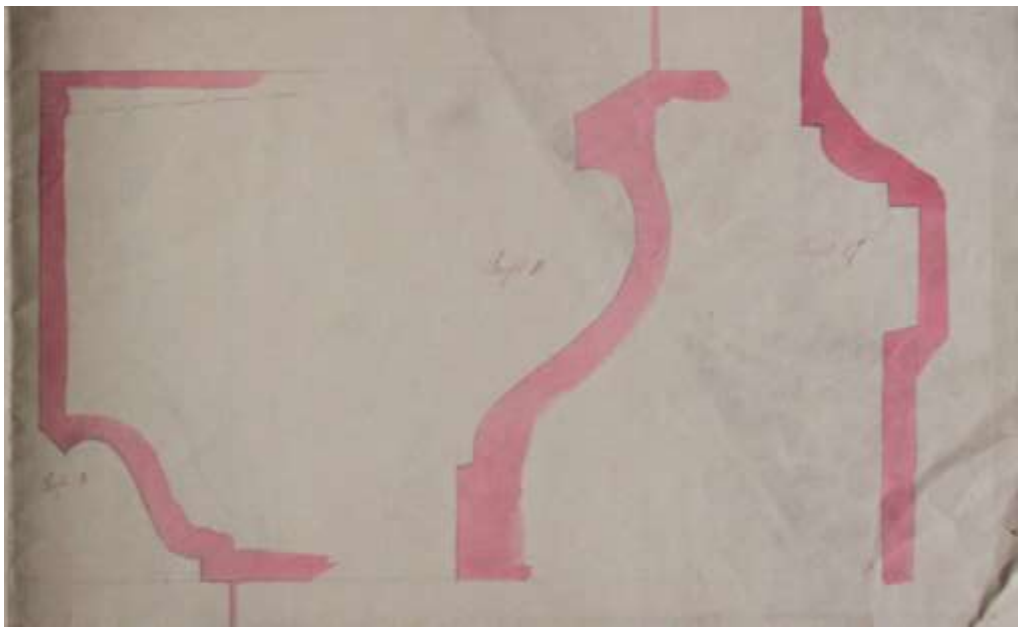

Mr STOFFELS à Sedan

Taille du document :
57.5 x 49

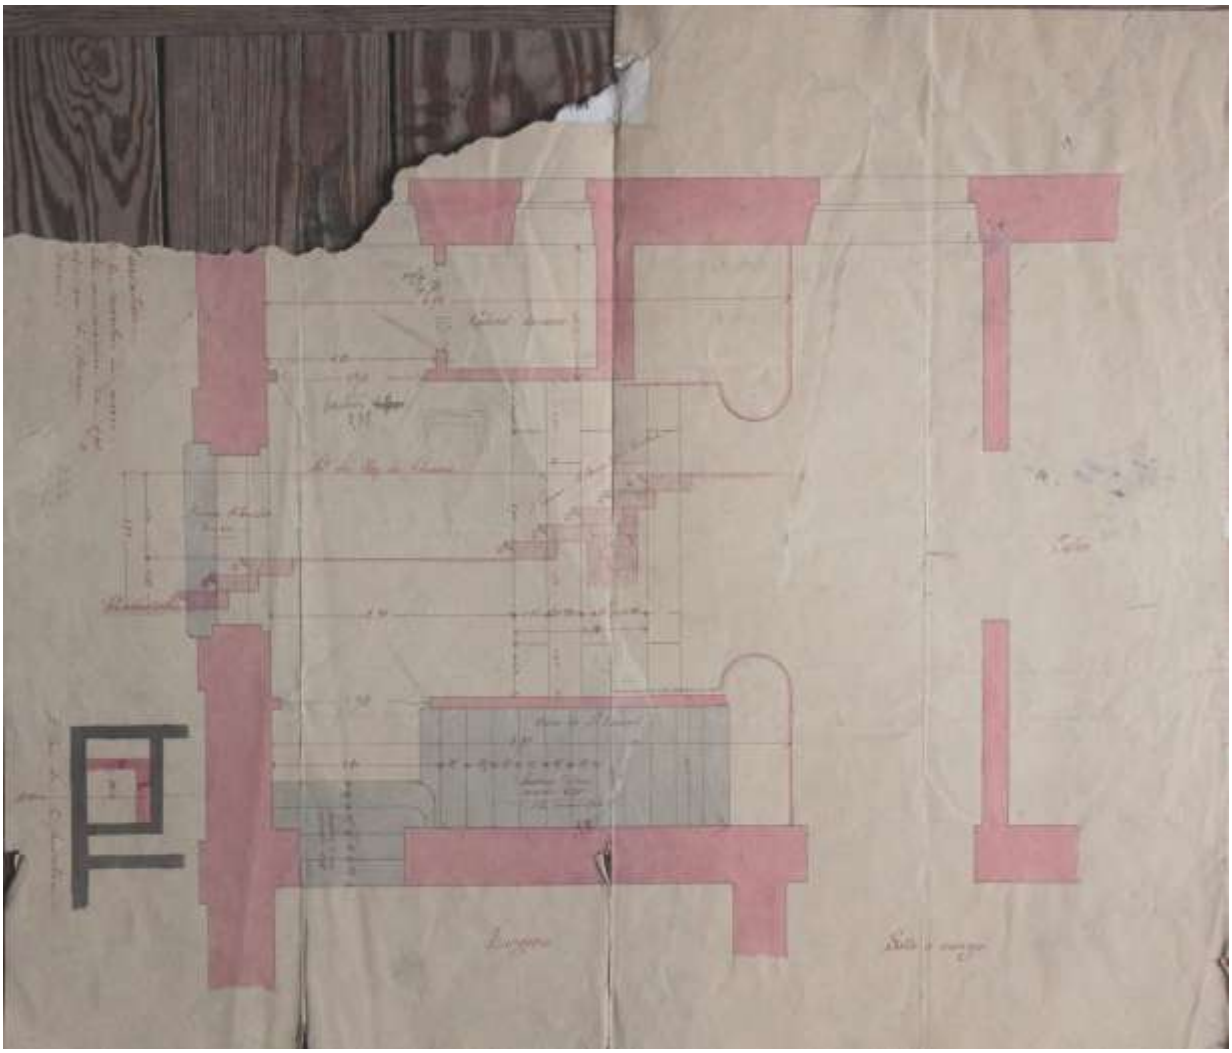

Propriété de M MOREAU

Ecuries et remises

Taille du document :
45.5 x 35.5

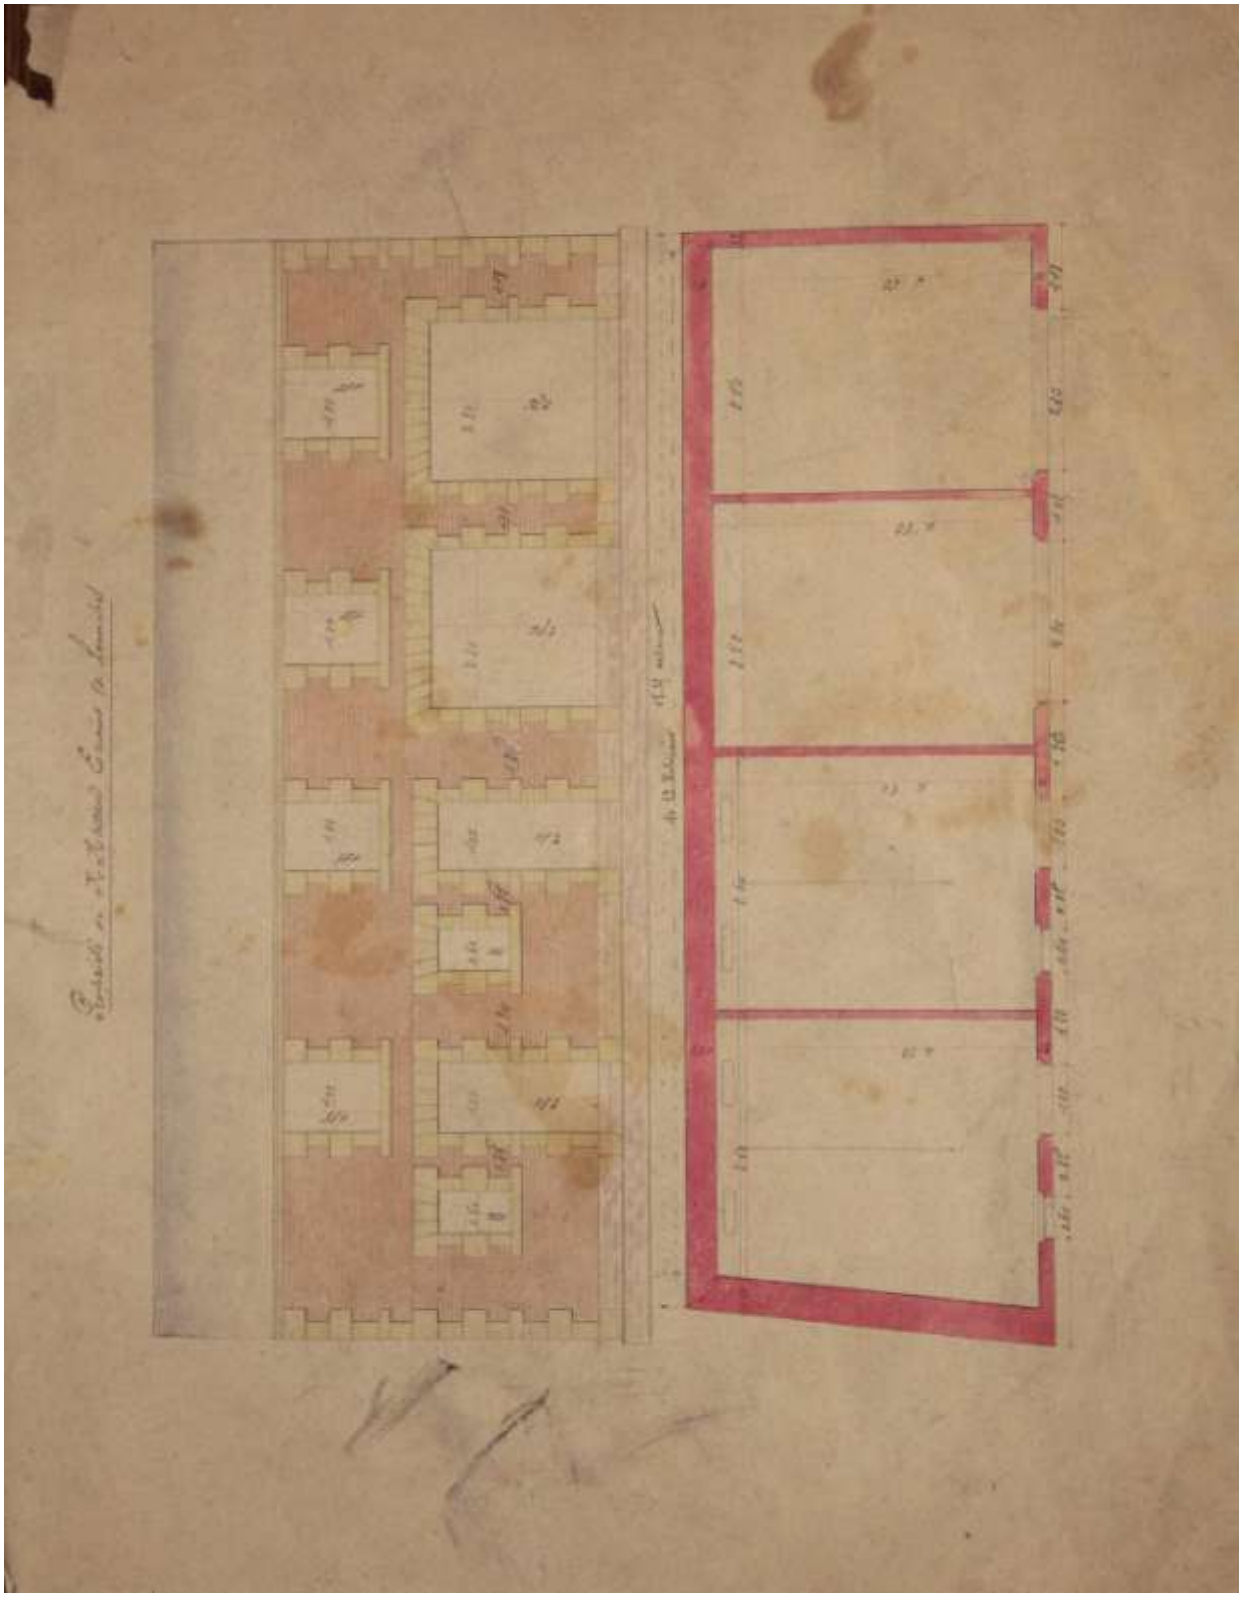

Monsieur LEFORT

Taille du document :
63 x 48

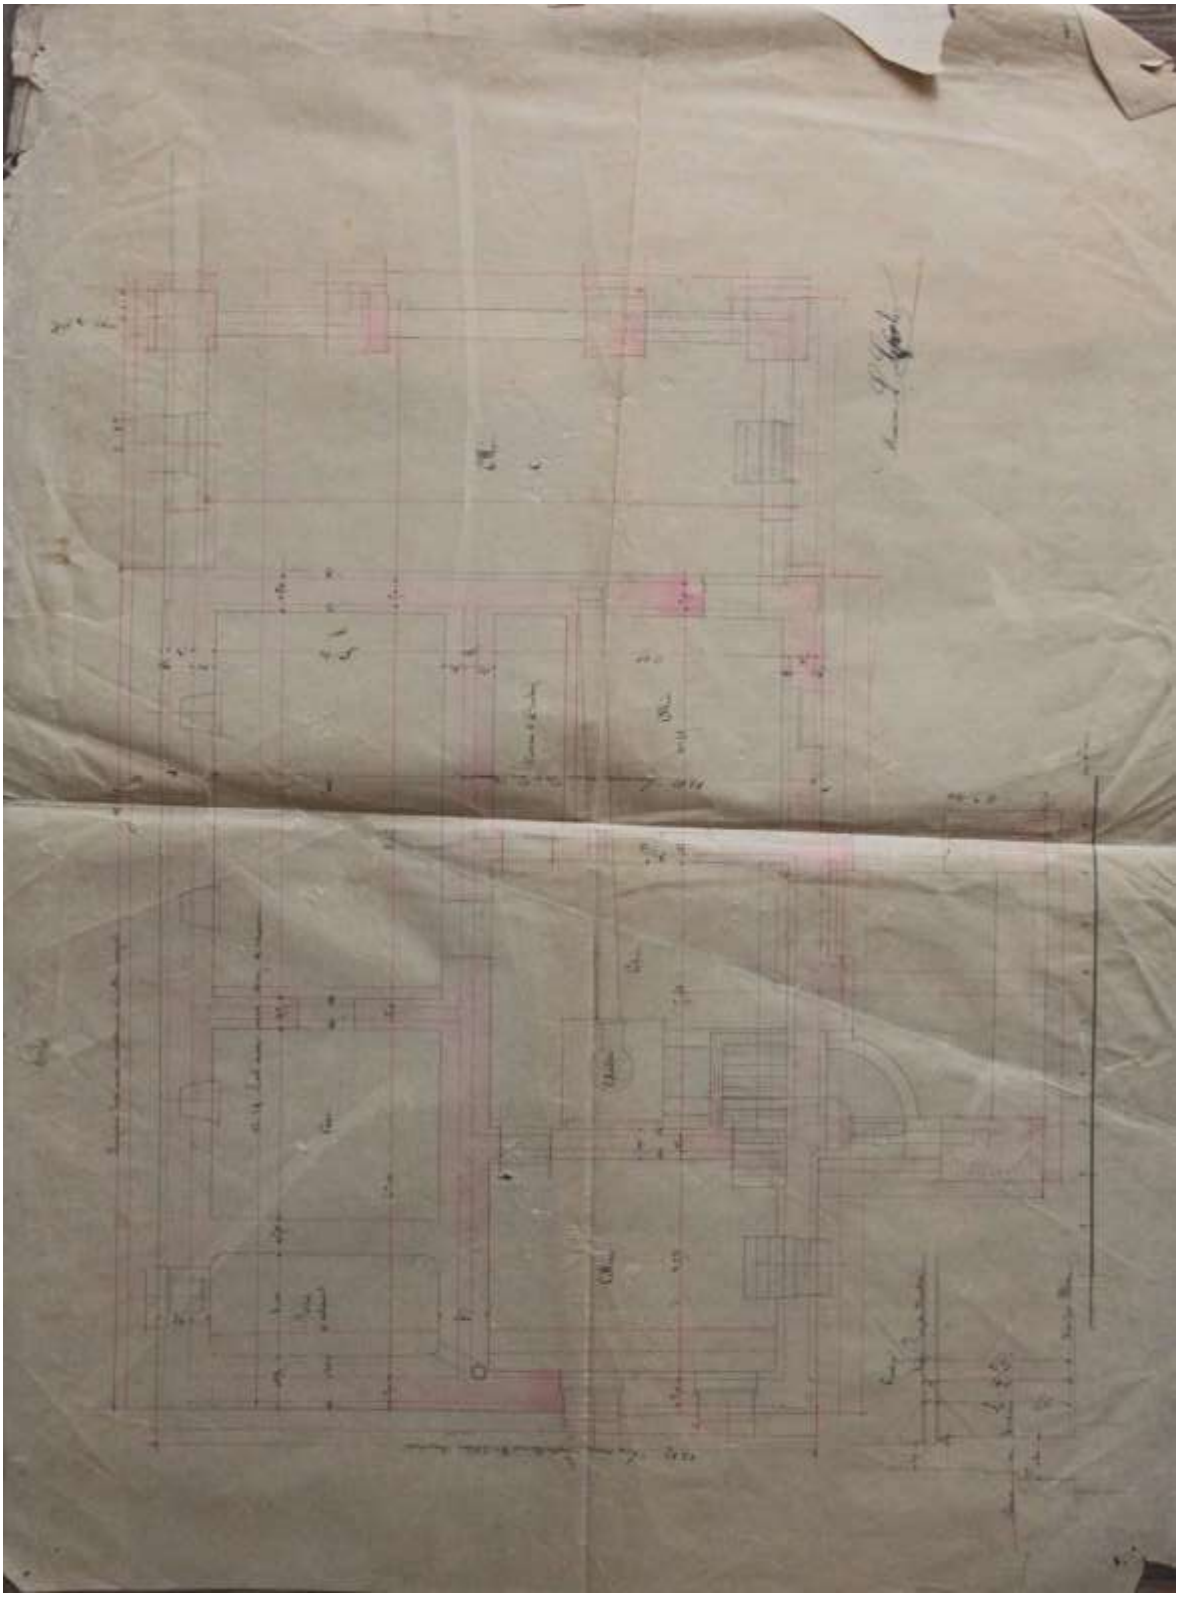

Propriété de M Edmond GODFROID à Sedan

Façade sur jardin. Dressé par l'architecte soussigné.

Paris le 28 Février 1885 D.THOMAS

Taille du document :
43.5 x 38

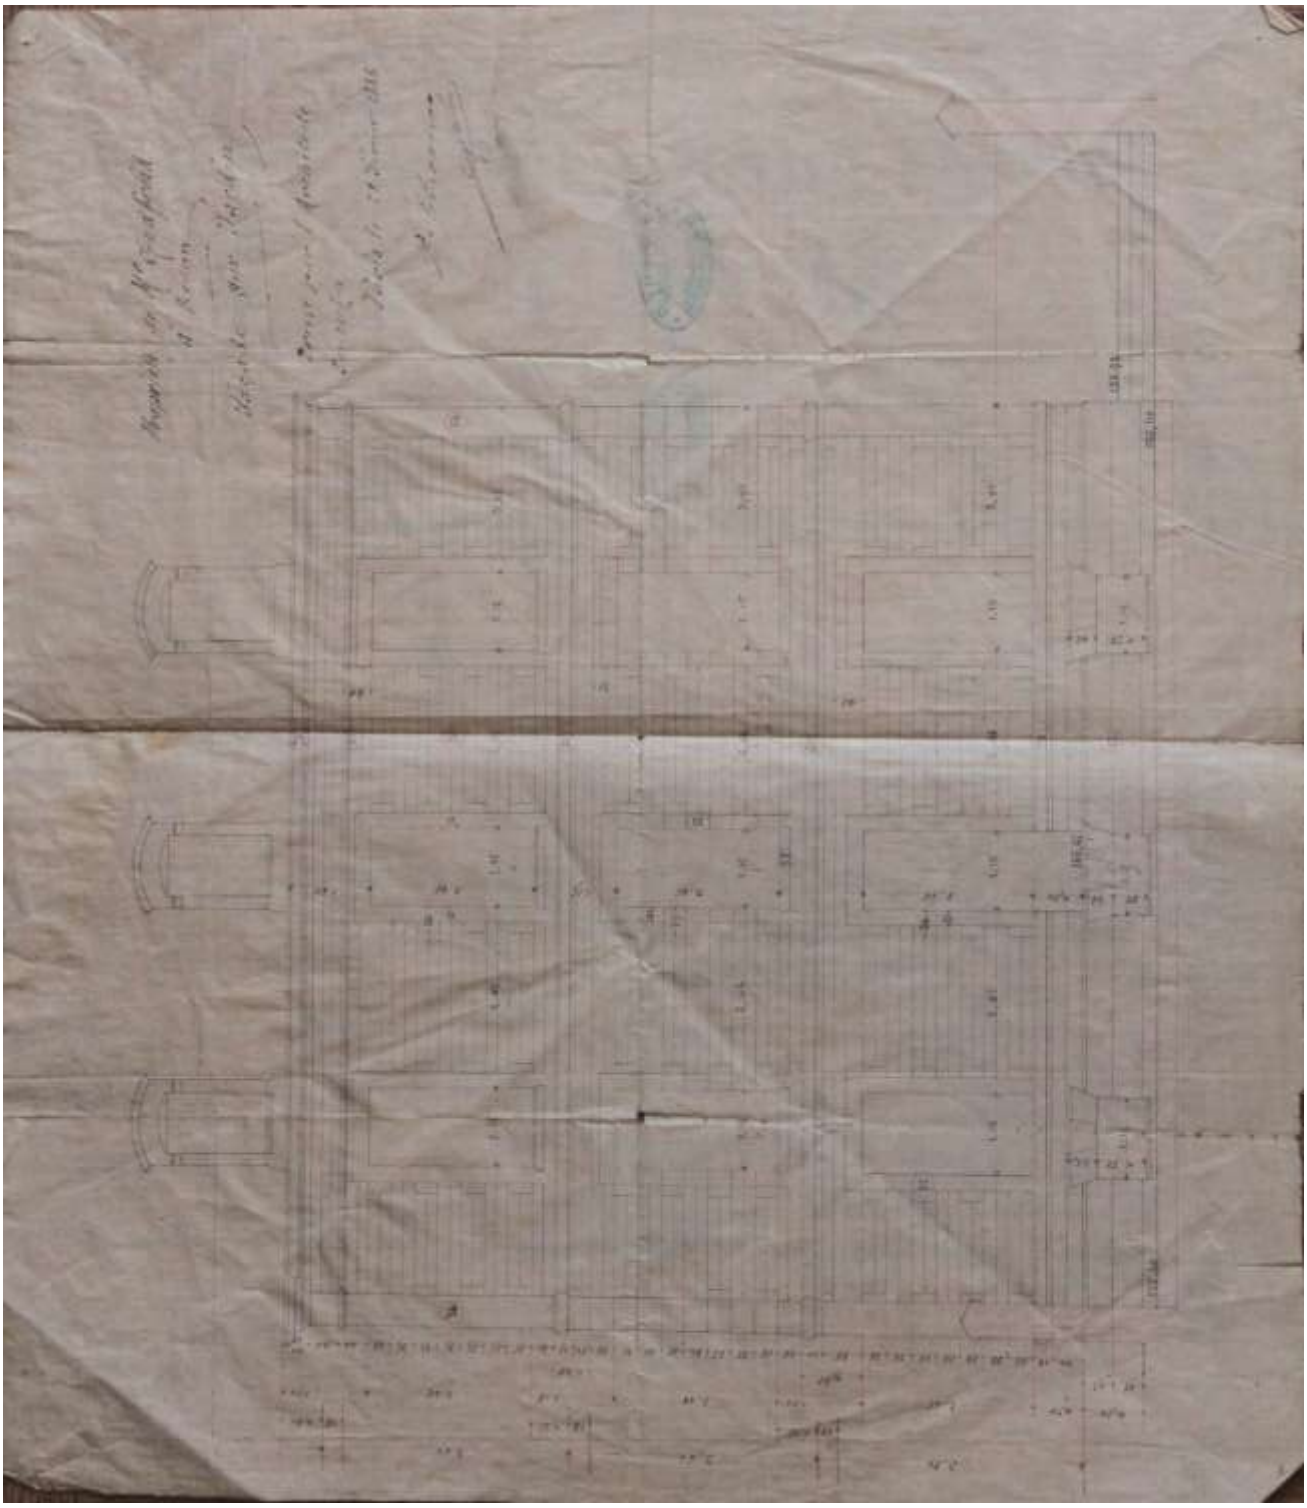

Propriété de M Edmond GODFROID à Sedan

Plan du rez-de-chaussée. Dressé par l'architecte soussigné.
Paris le 28 Février 1885 D THOMAS

Taille du document :
37 x 42

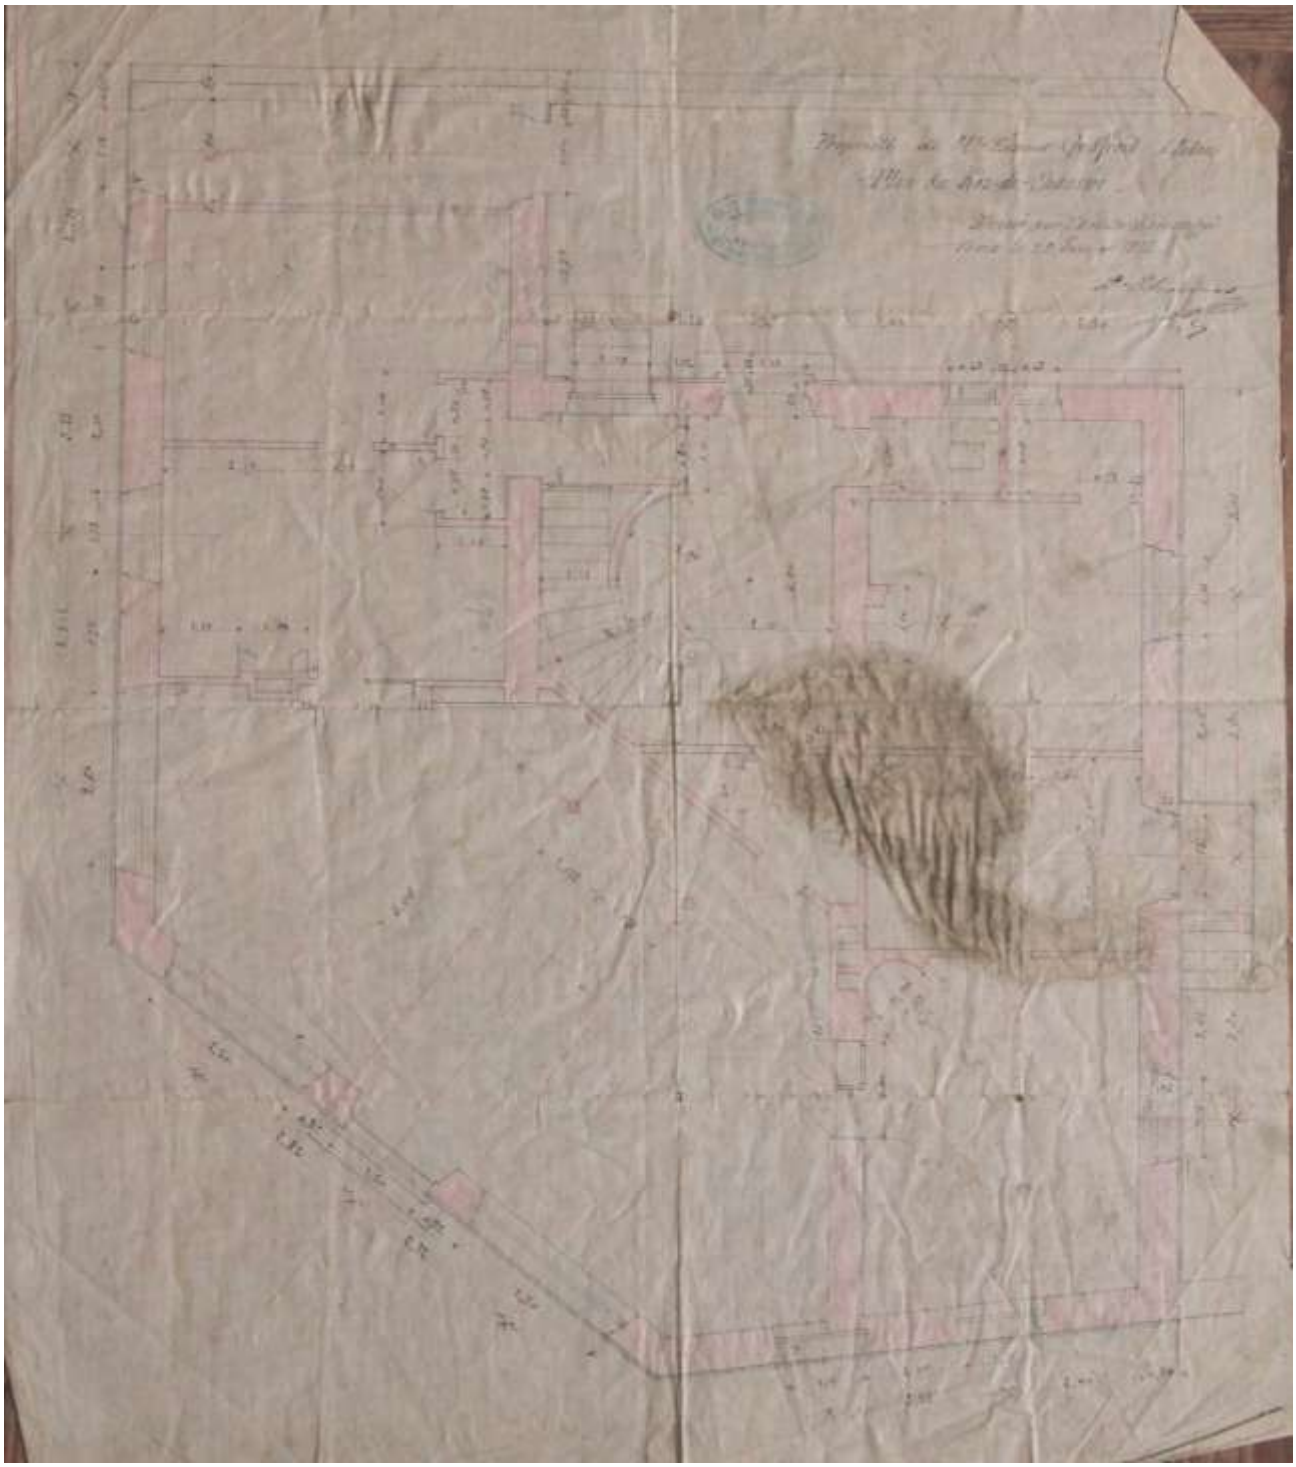

M RENEL-LALLEMENT à Torcy-Sedan

Plan des caves, rez-de-chaussée, 1er étage

Taille du document :
104 x 40.5

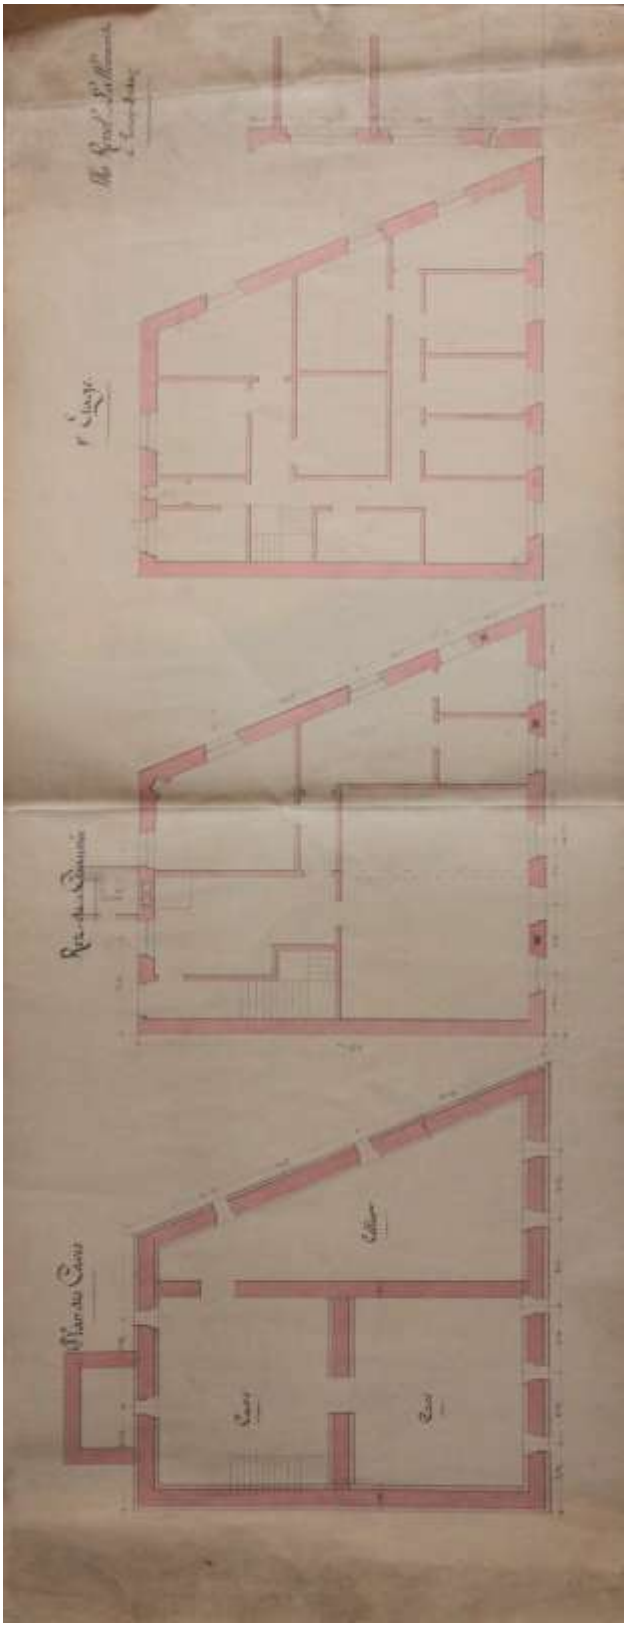

M RENEL-LALLEMENT

Agencement du Rez-de-chaussée et 1er étage

Taille du document :
63.5 x 35.5

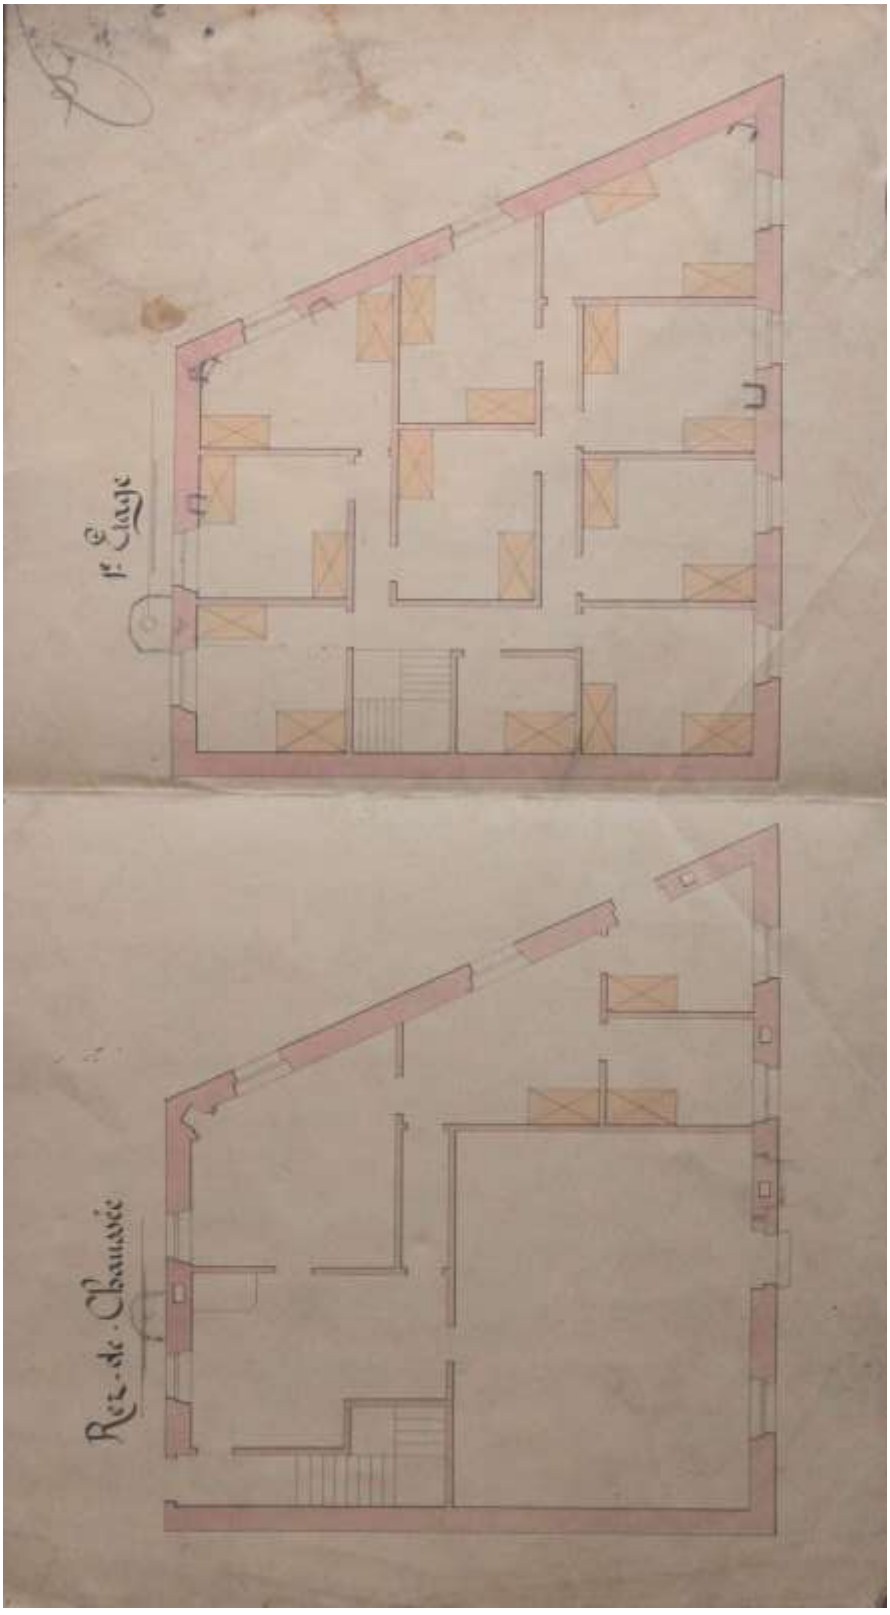

Propriété des déchets — Monsieur BOURRY Directeur

Plan des étuves - Dressé par l'architecte soussigné.

Sedan ce 12 mai 1880 D. THOMAS

Taille du document :
71 x 48

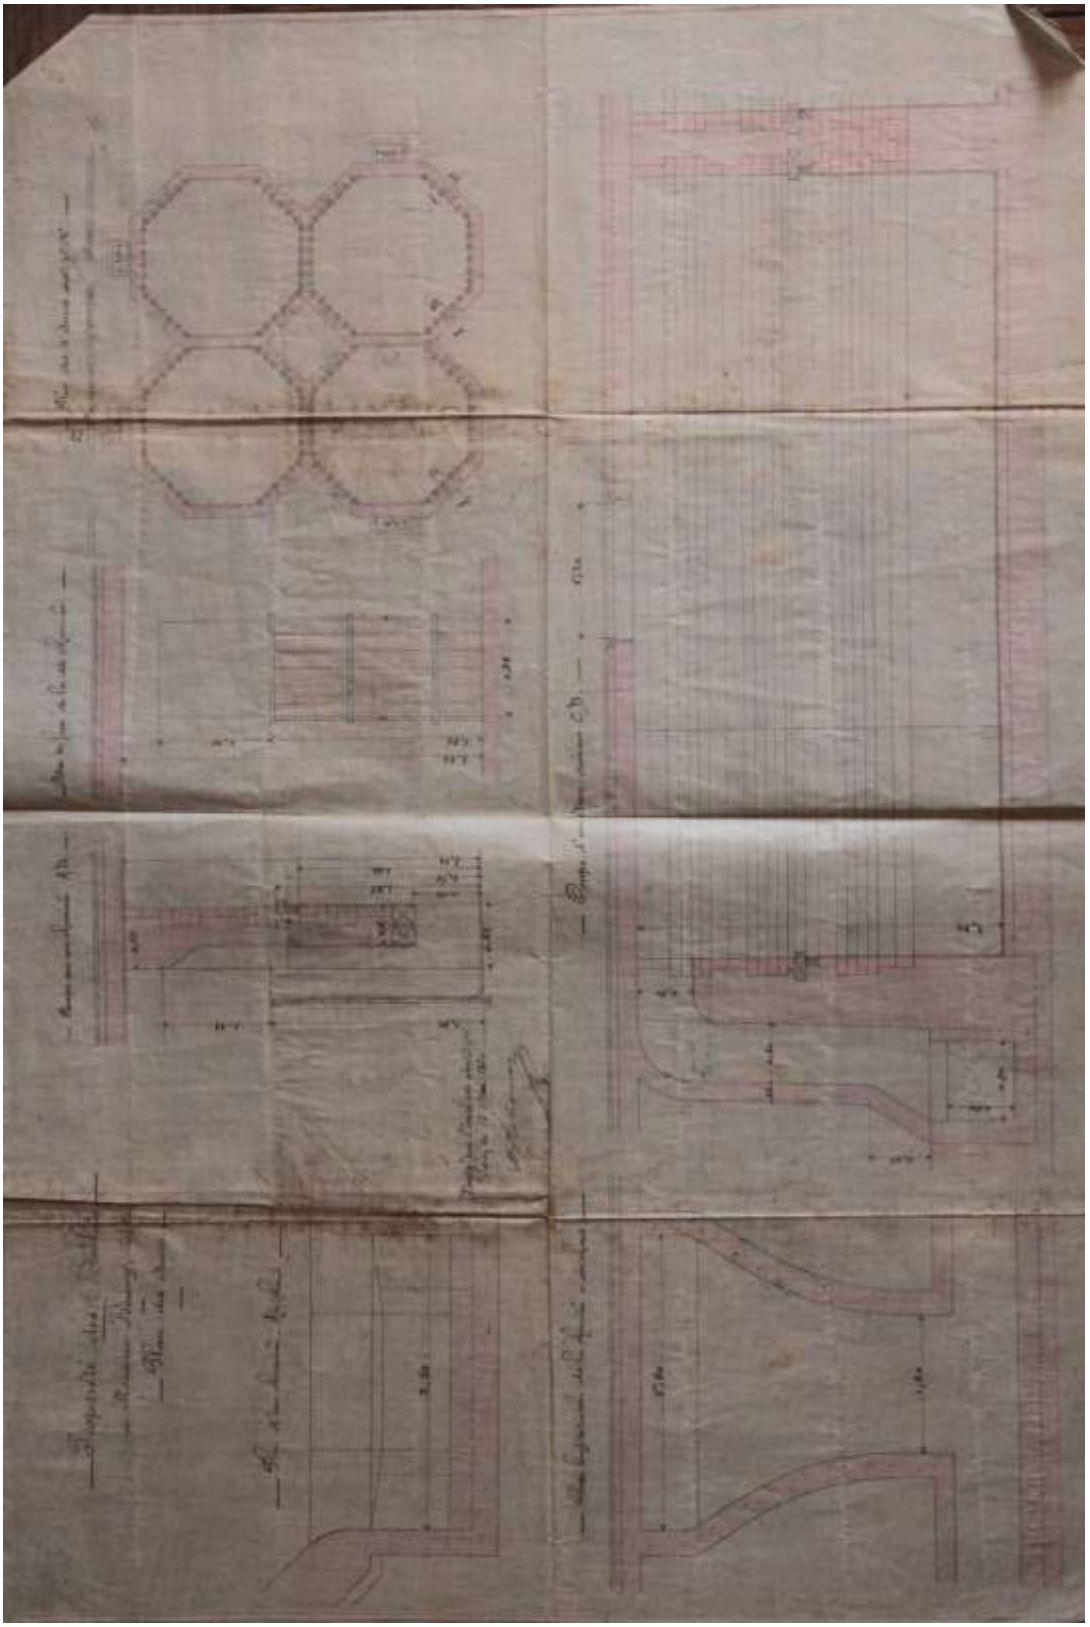

Propriété des déchets — Monsieur BOURRY Directeur

Plan des étuves - Dressé par l'architecte soussigné.

Sedan ce 6 mai 1880

Taille du document :
37.5 x 31

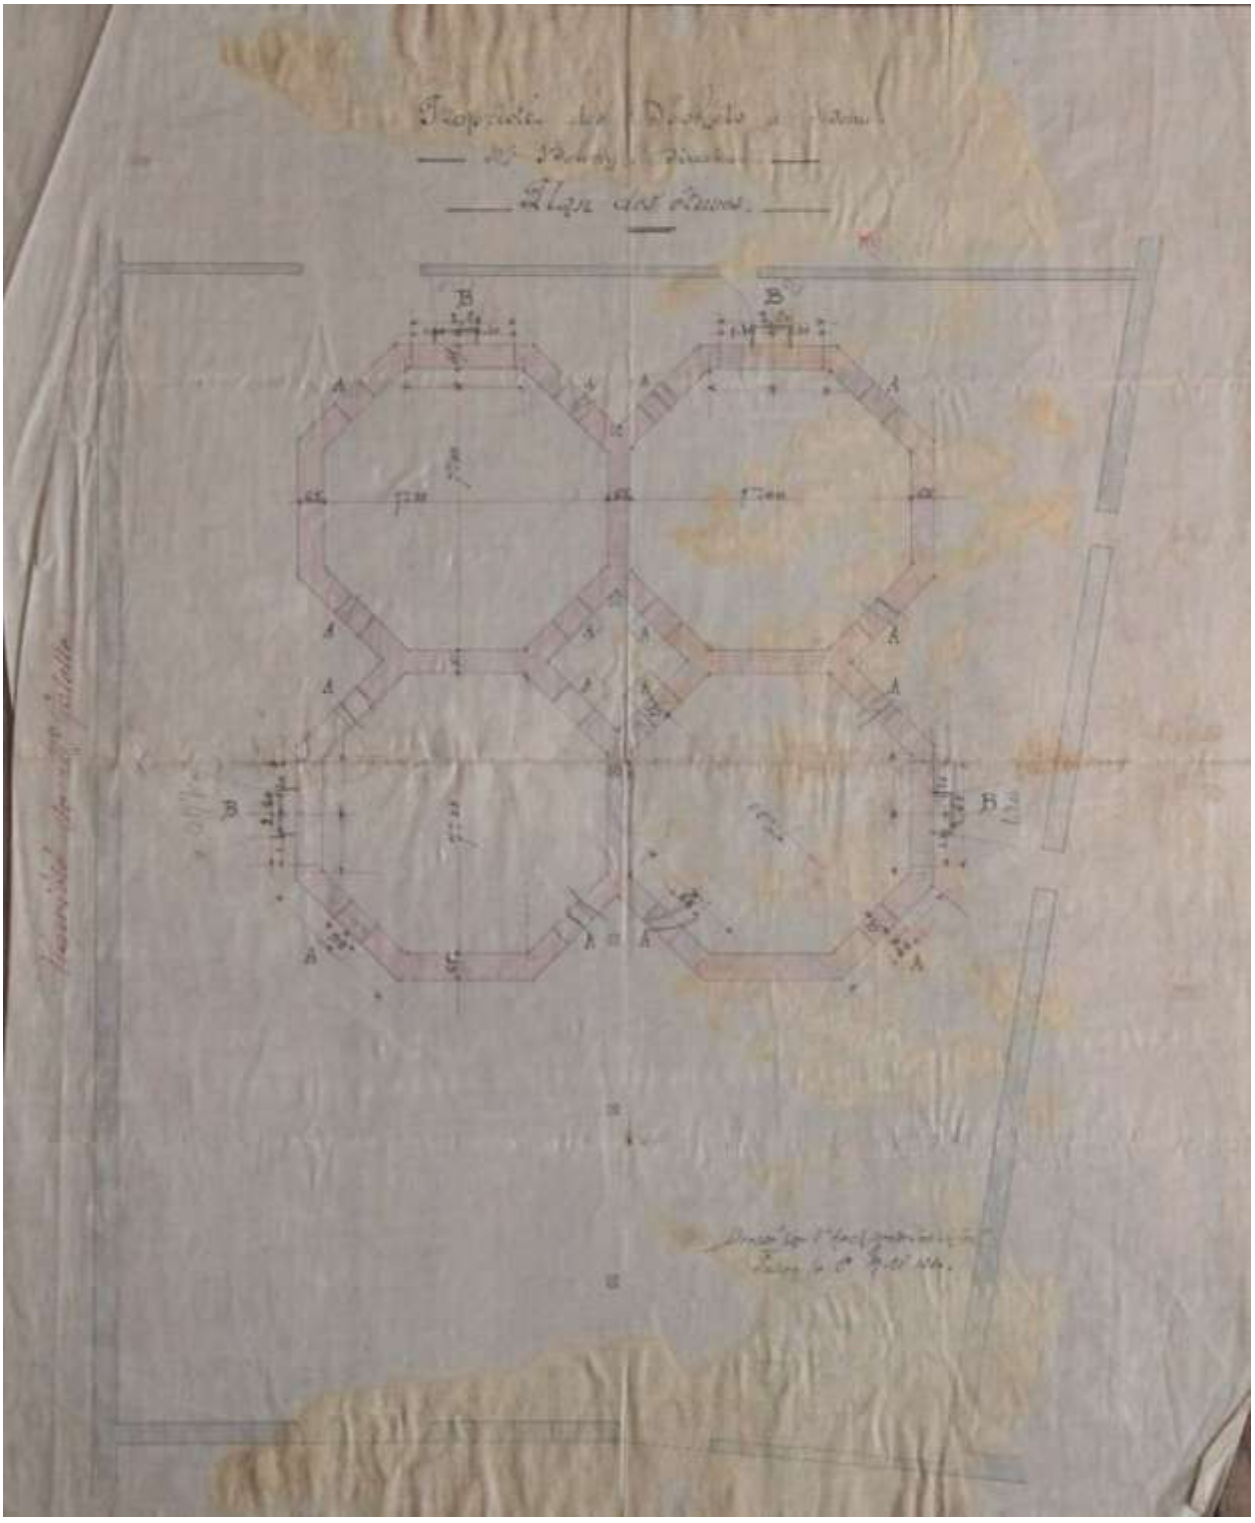

M BURTON — HUDRÉAUX Propriétaire 1894

Plan des étuves - Dressé par l'architecte soussigné.
Sedan ce 12 mai 1880 D. THOMAS

Taille du document :
56.5 x 435.5

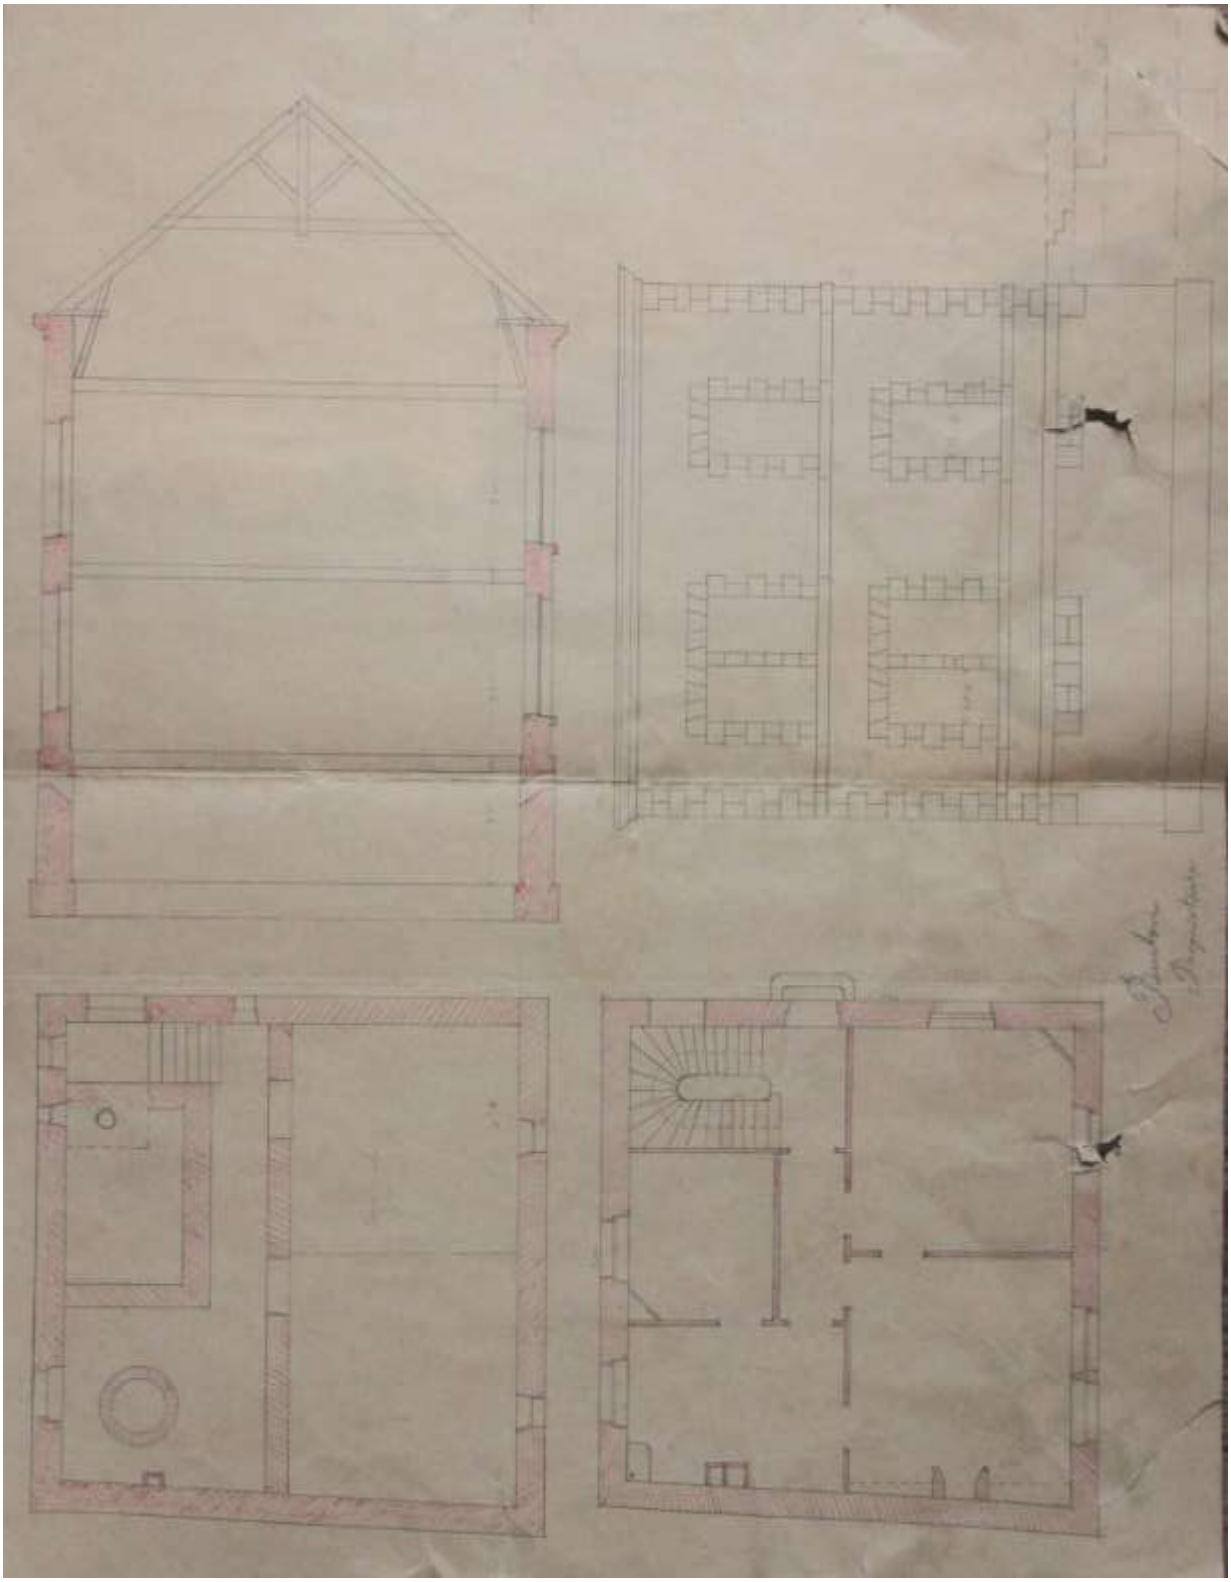

M BURTON — HUDRÉAUX Propriétaire 1894

Plan des fouilles et des caves

Taille du document :
29.5 x 26

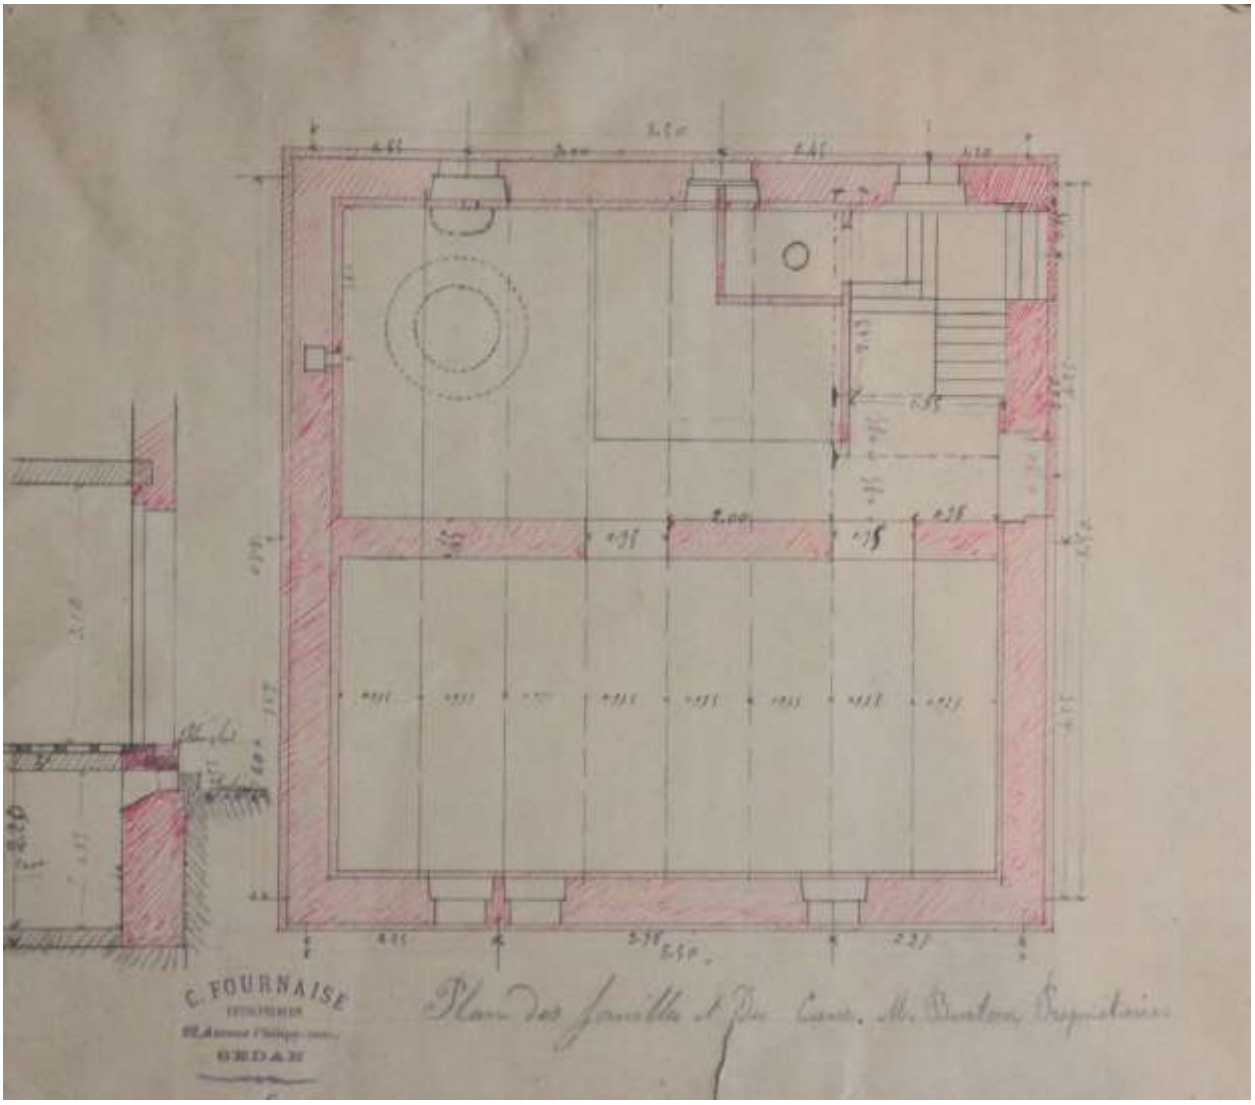

Façade place de la nouvelle gare à Sedan

Taille du document :
95 x 56.5

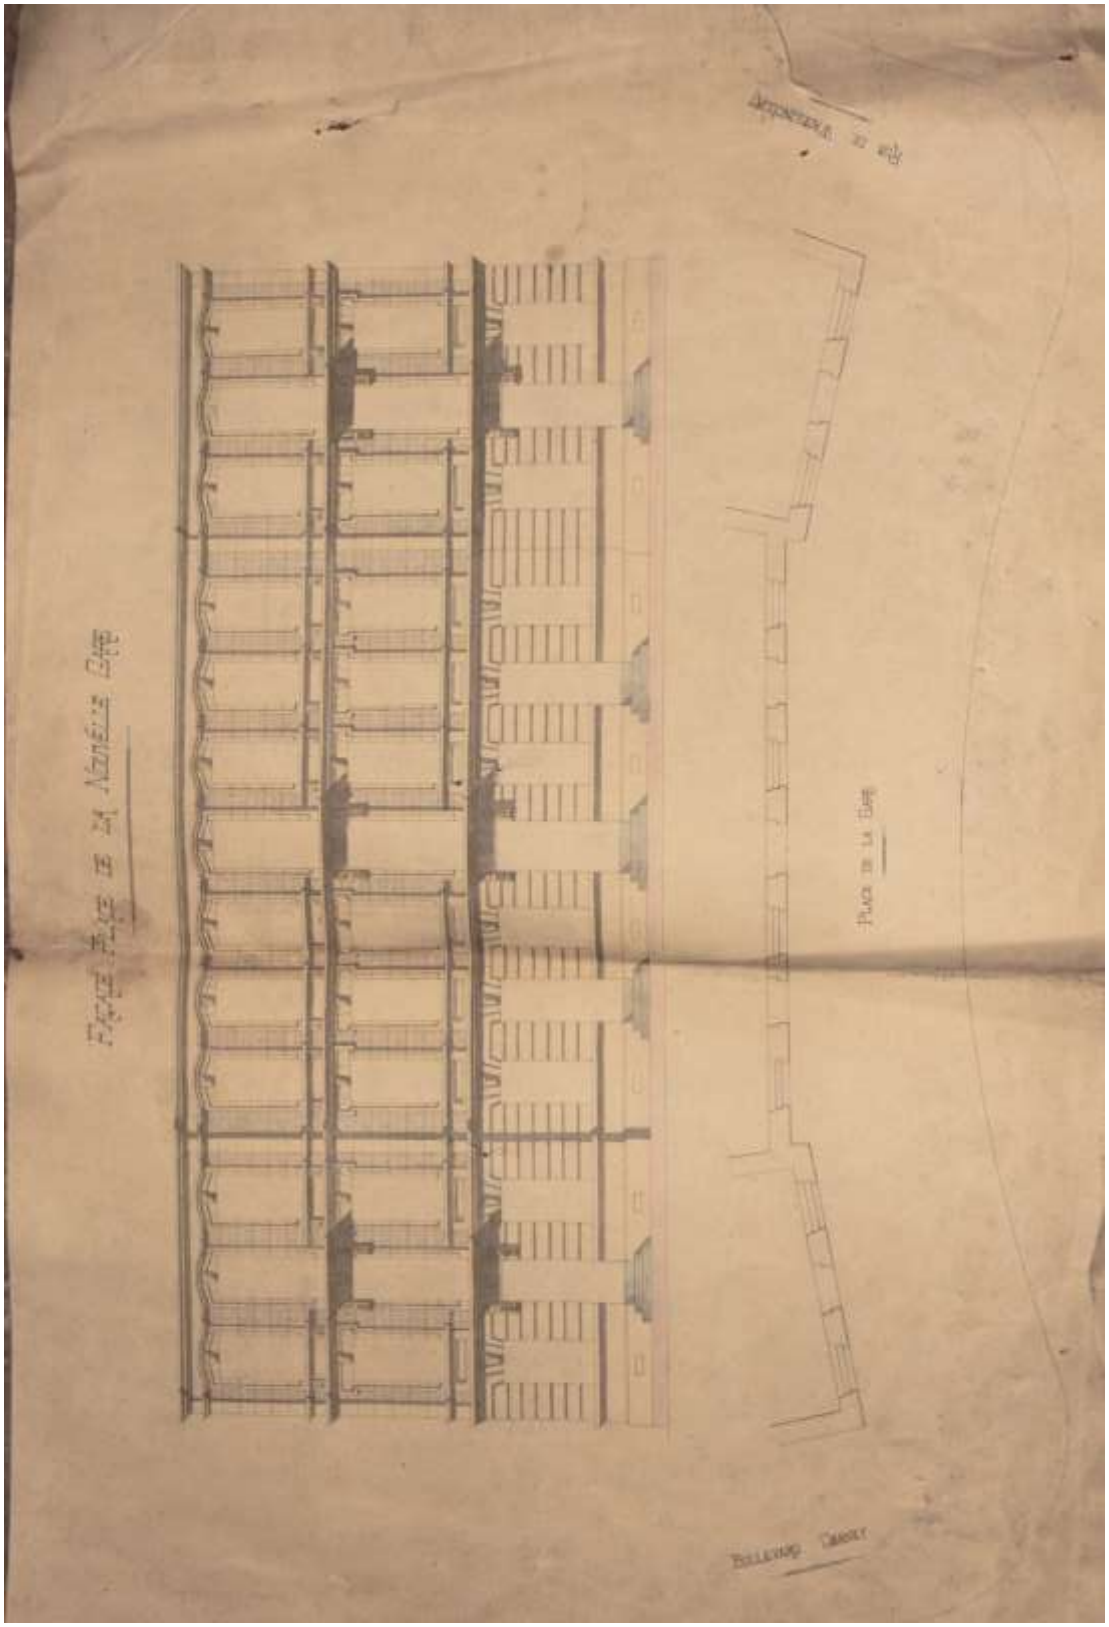

Façade place de la nouvelle gare à Sedan

Détail du profil du chambranle des fenêtres Bd Place de la Gare 2ème étage

Détail du document précédent

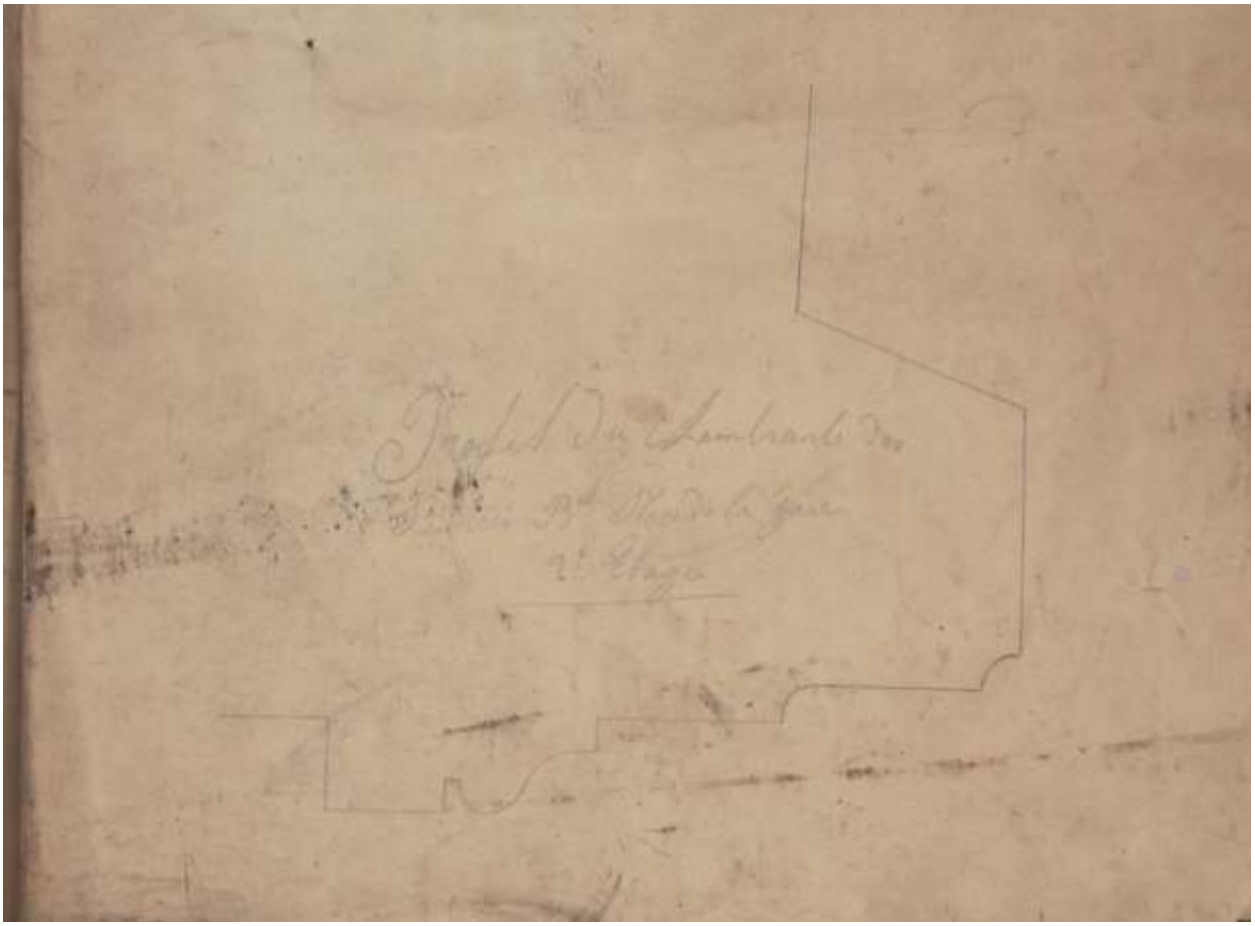

Façade place de la gare à Sedan

Propriété M MOREAU à Sedan

Taille du document :
56 x 47.5

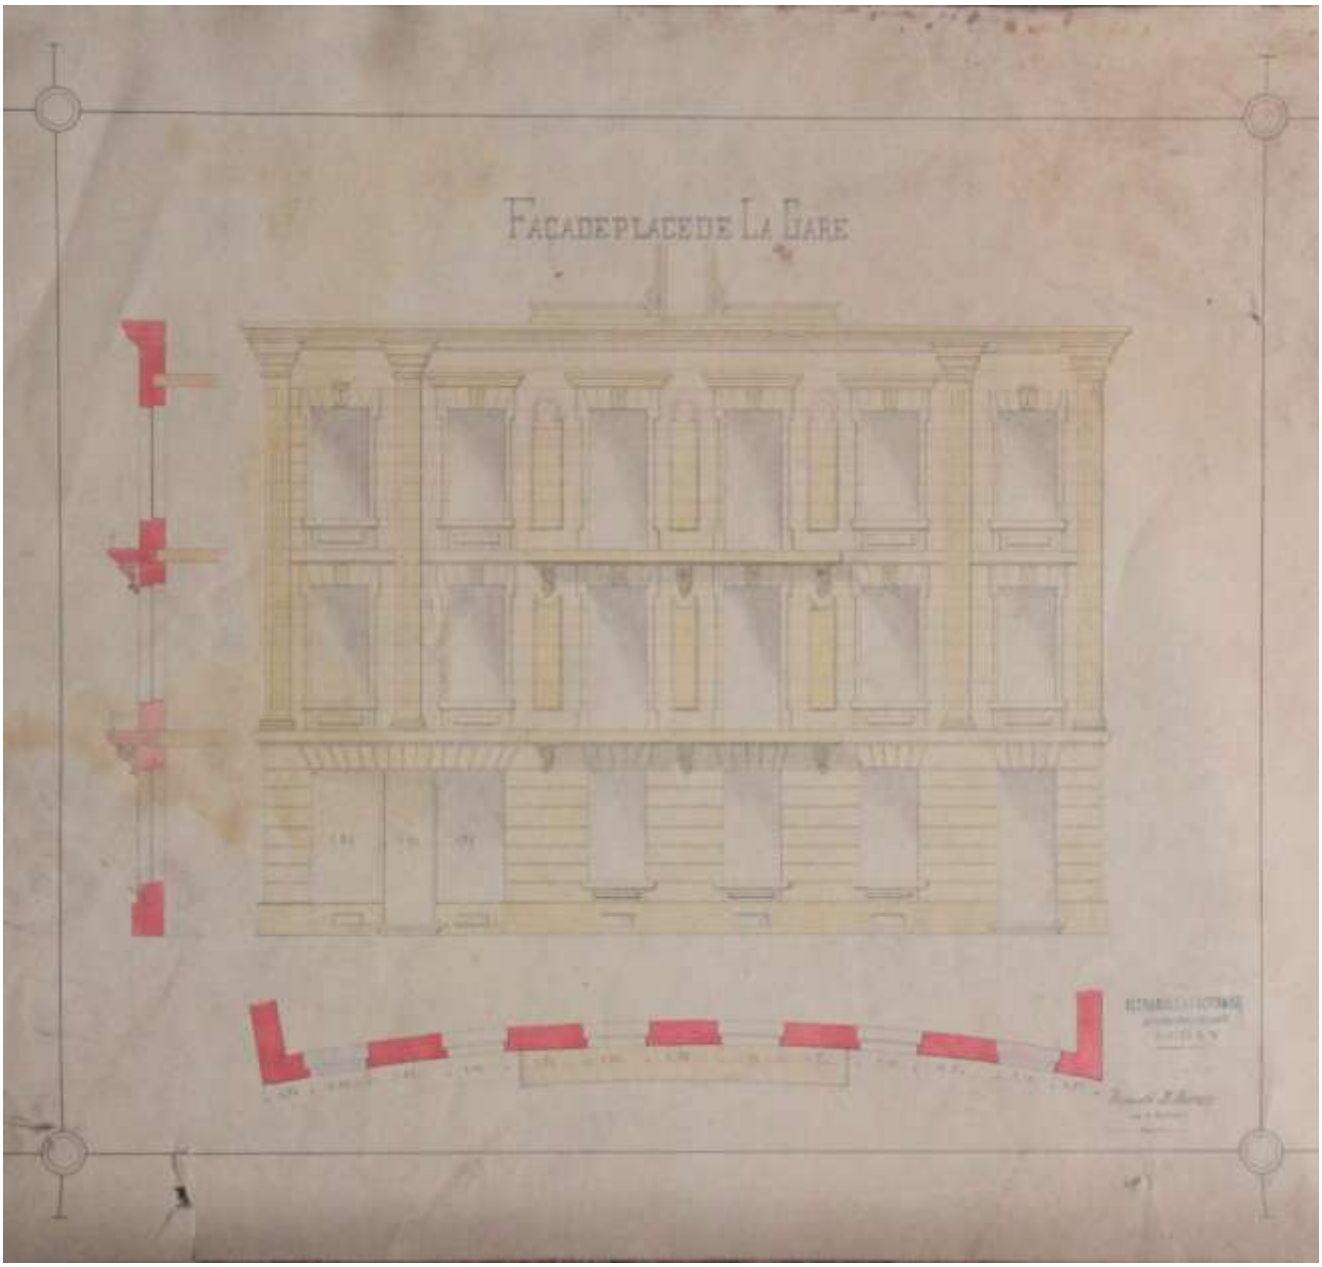

Place de la gare à Sedan

Plan du 1er étage

Taille du document :
84.5 x 43

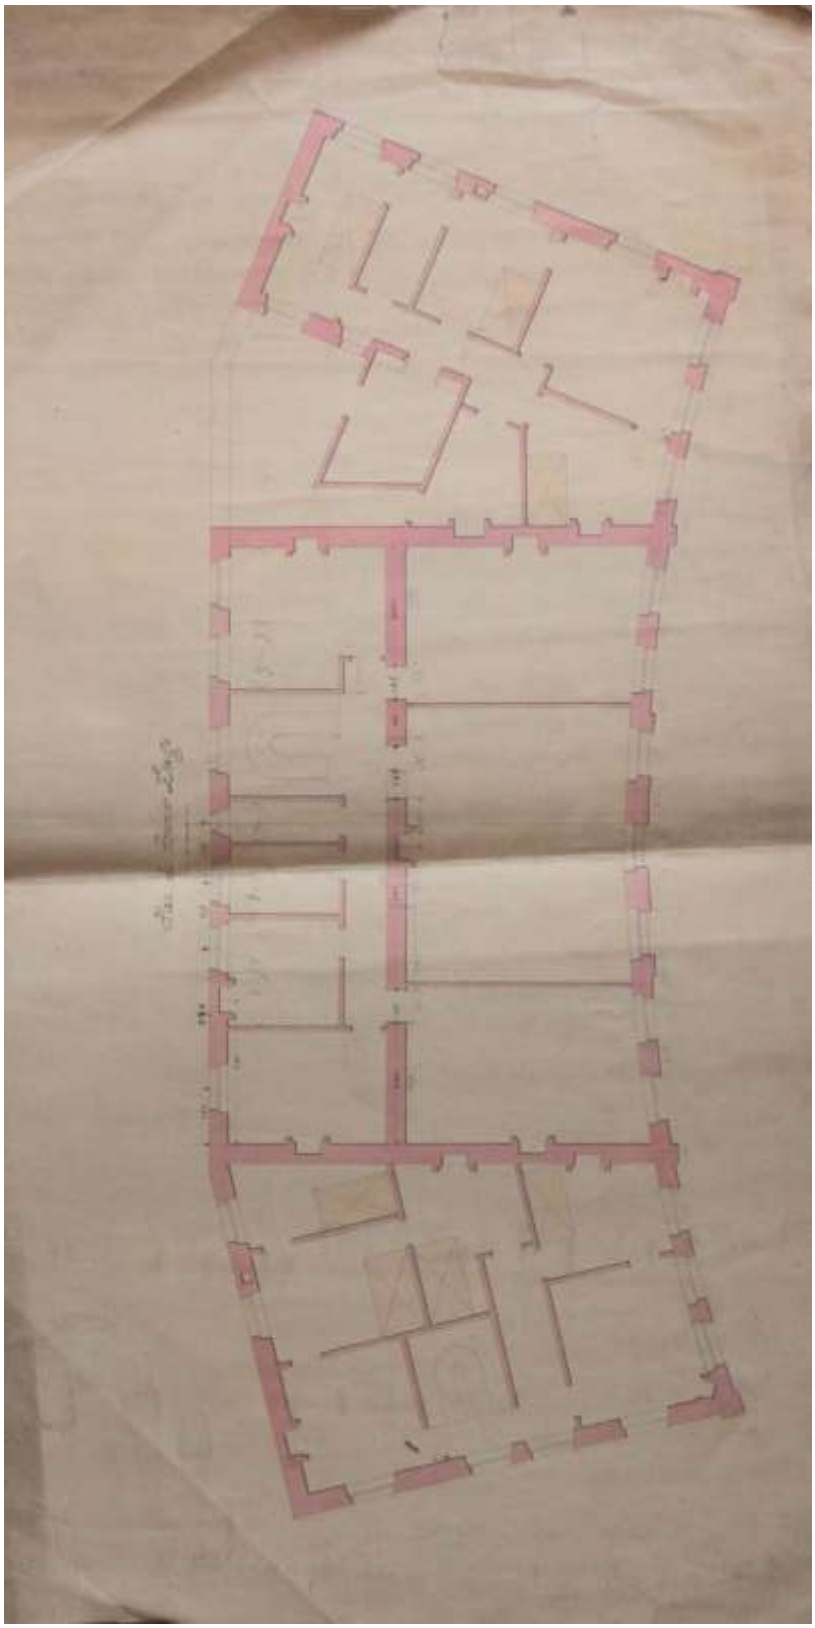

Place de la gare à Sedan

Bâtiment de Mr MOREAU — Sedan le 16 Février 1888

Plan de distribution du Rez-de-chaussée

Taille du document :
47.5 x 35

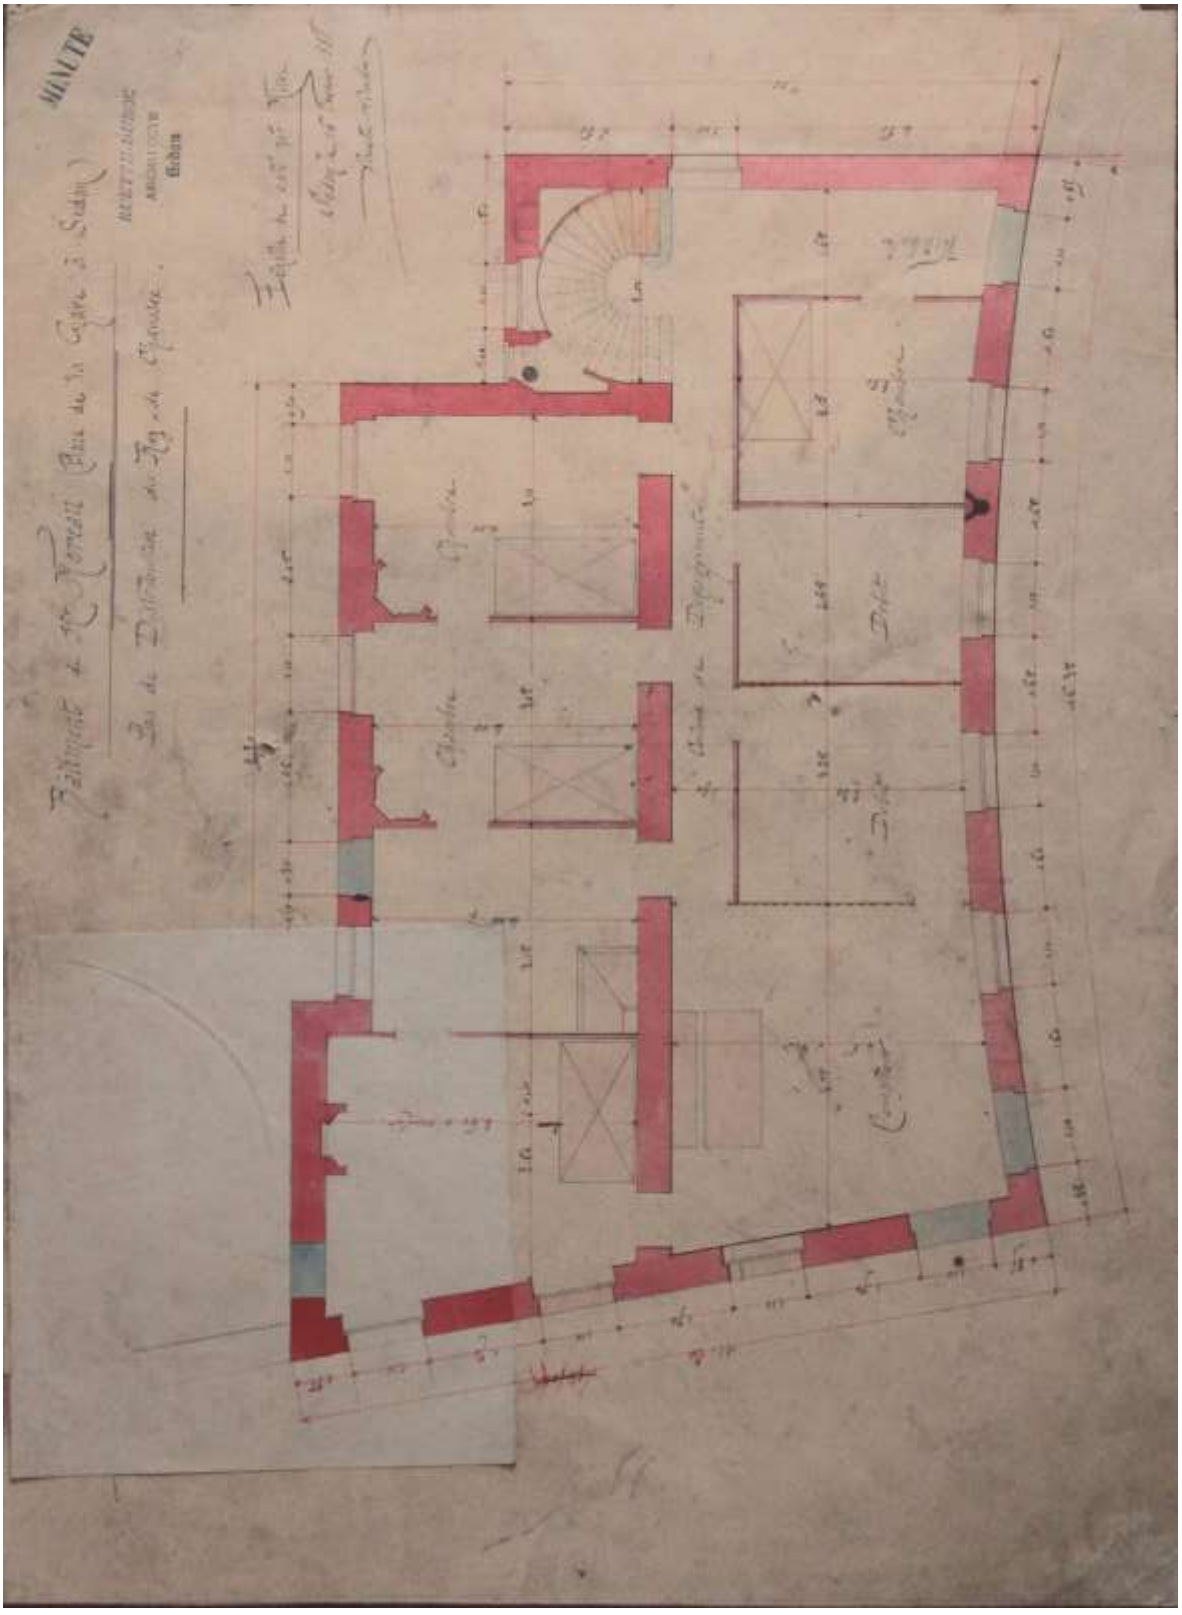

Place de la gare à Sedan

Bâtiment de Mr MOREAU — Sedan le 16 Février 1888

Plan de distribution du Rez-de-chaussée

Détail du document précédent

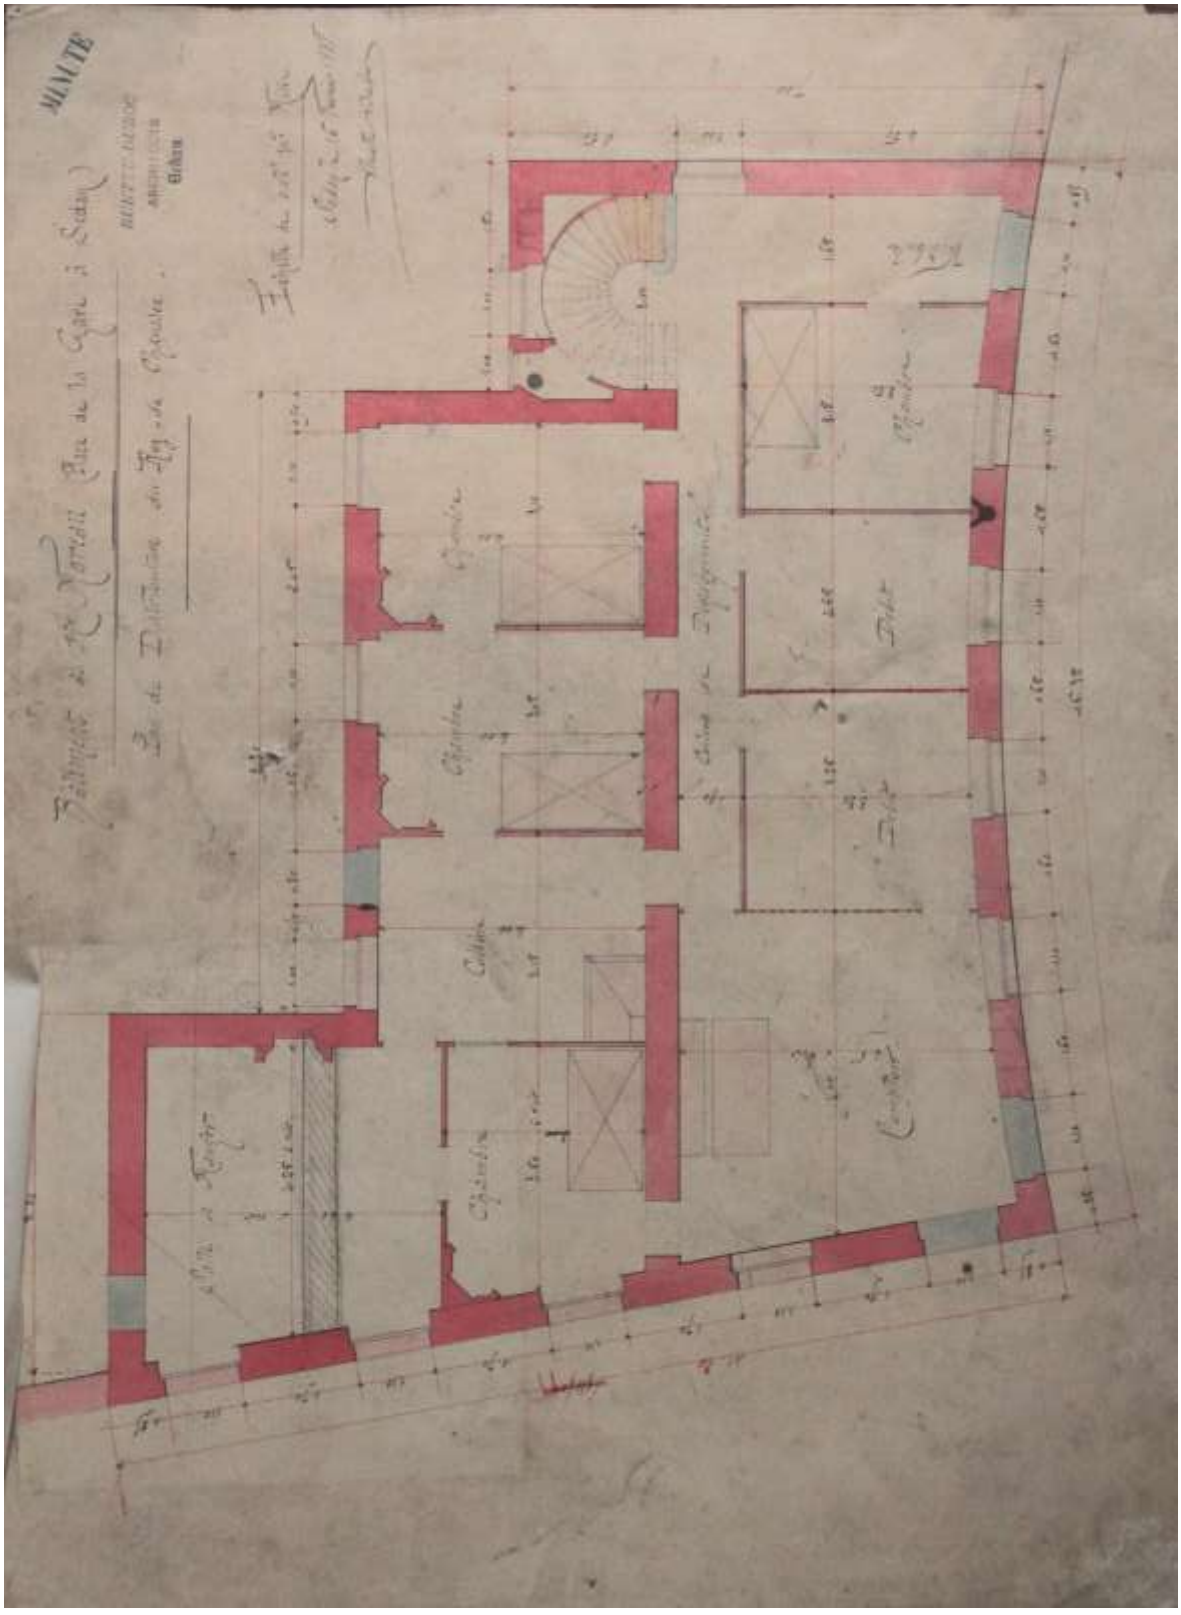

Façade place de la gare à Sedan

Plan du rez-de-chaussée

Propriété de Mr MOREAU

Taille du document :
49.5 x 41

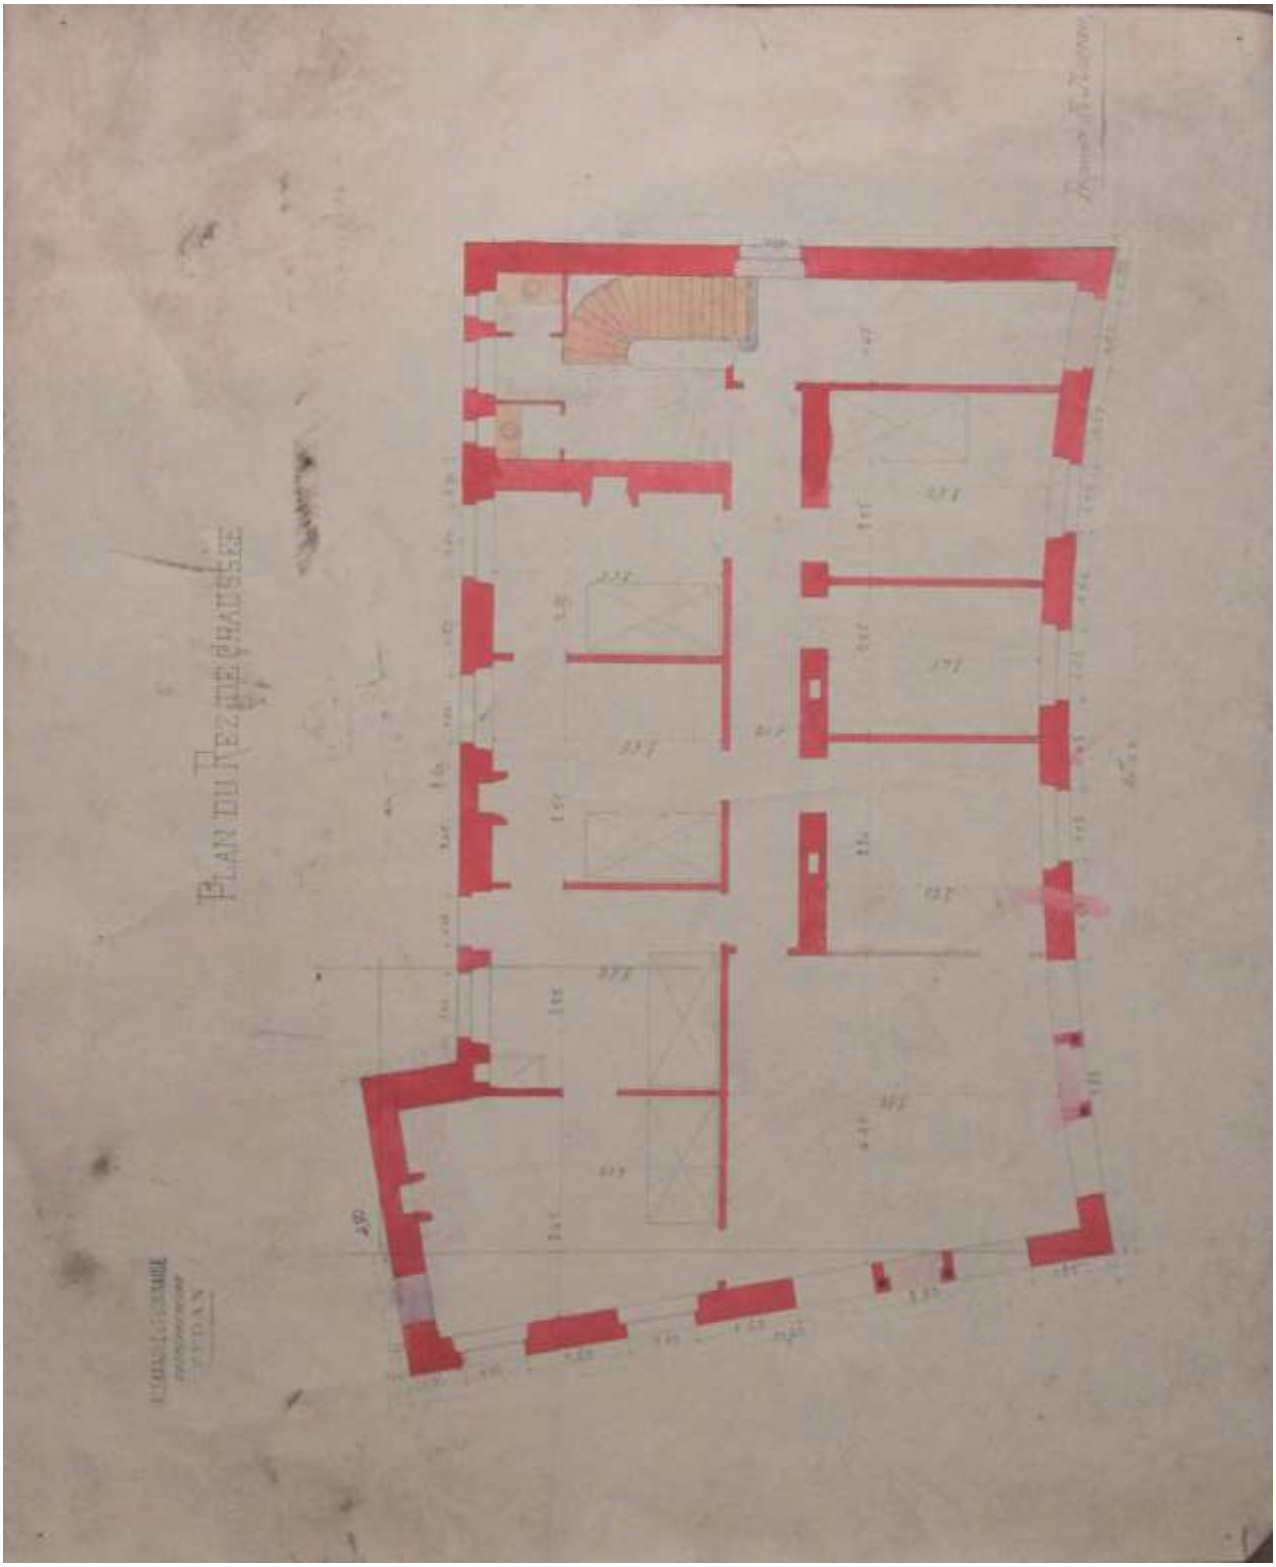

Place de la gare à Sedan

Premier et deuxième étage

Propriété de Mr MOREAU

Taille du document :
45.5 x 37

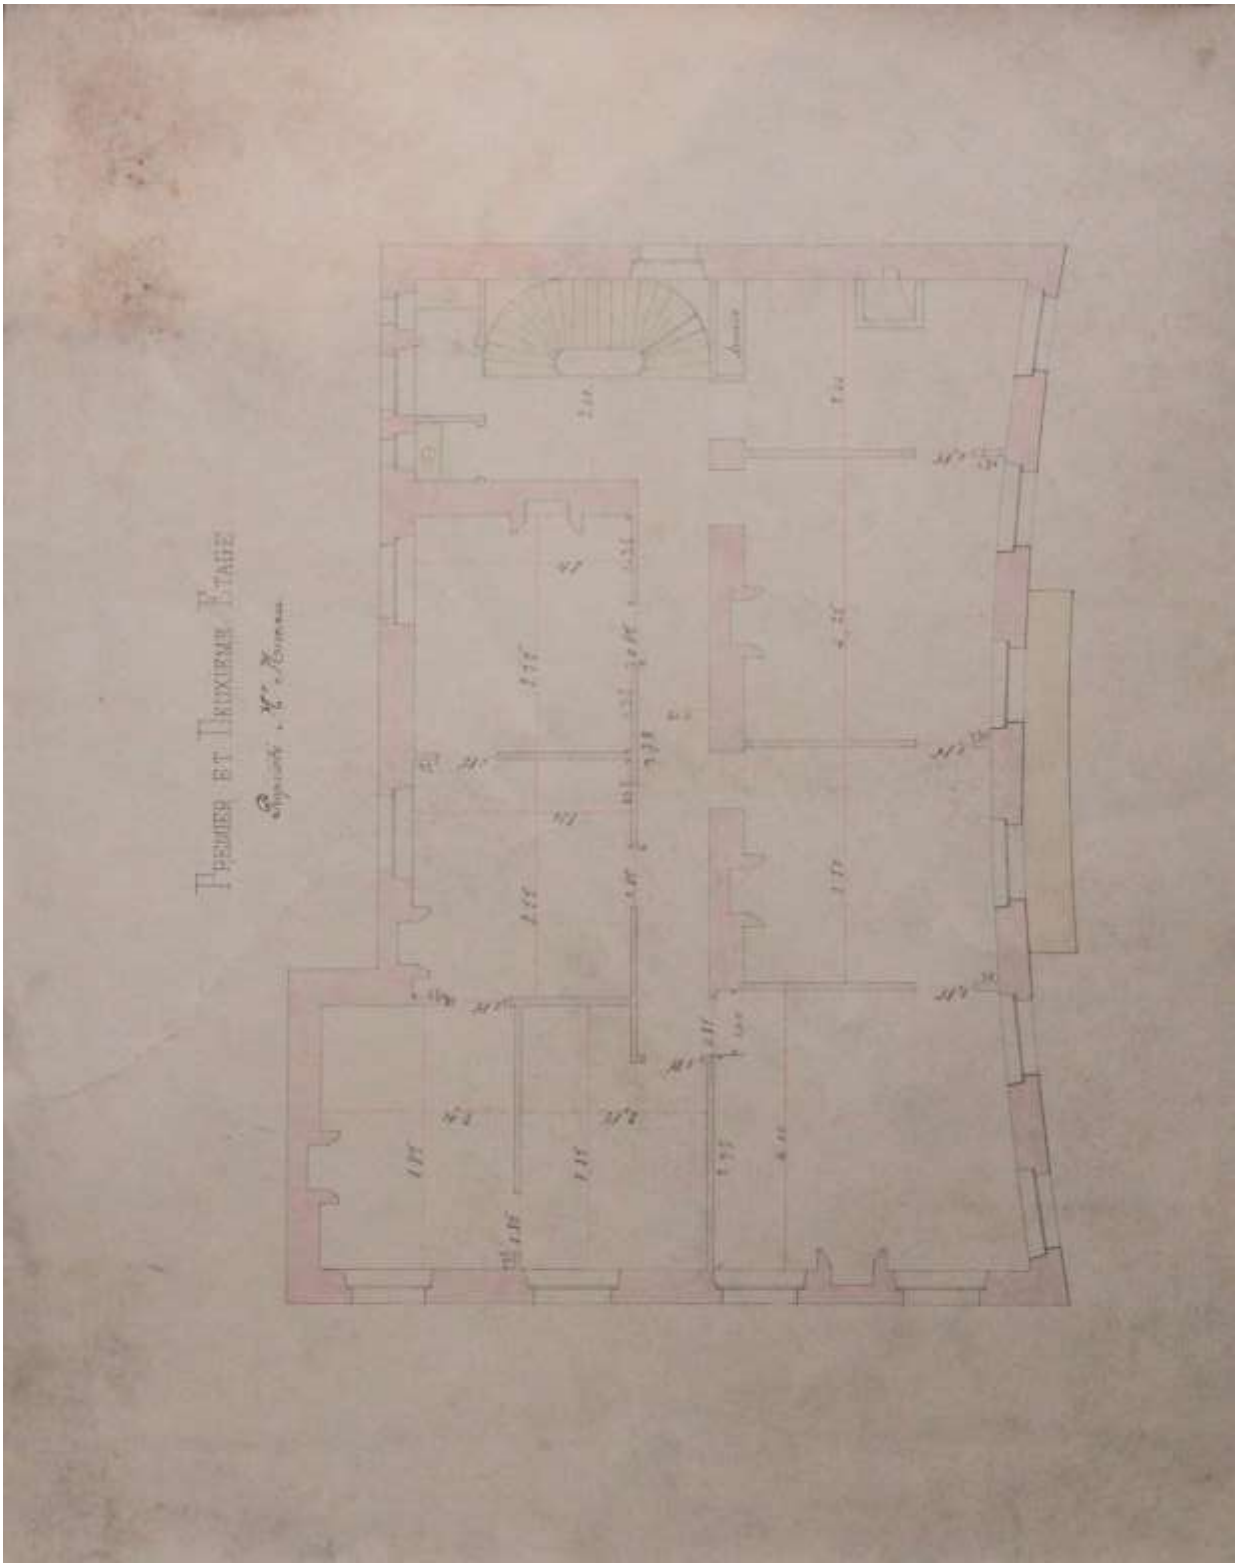

Bâtiment de M Paul COCU

Attachements des terrassements

Taille du document :
50.5 x 44.5

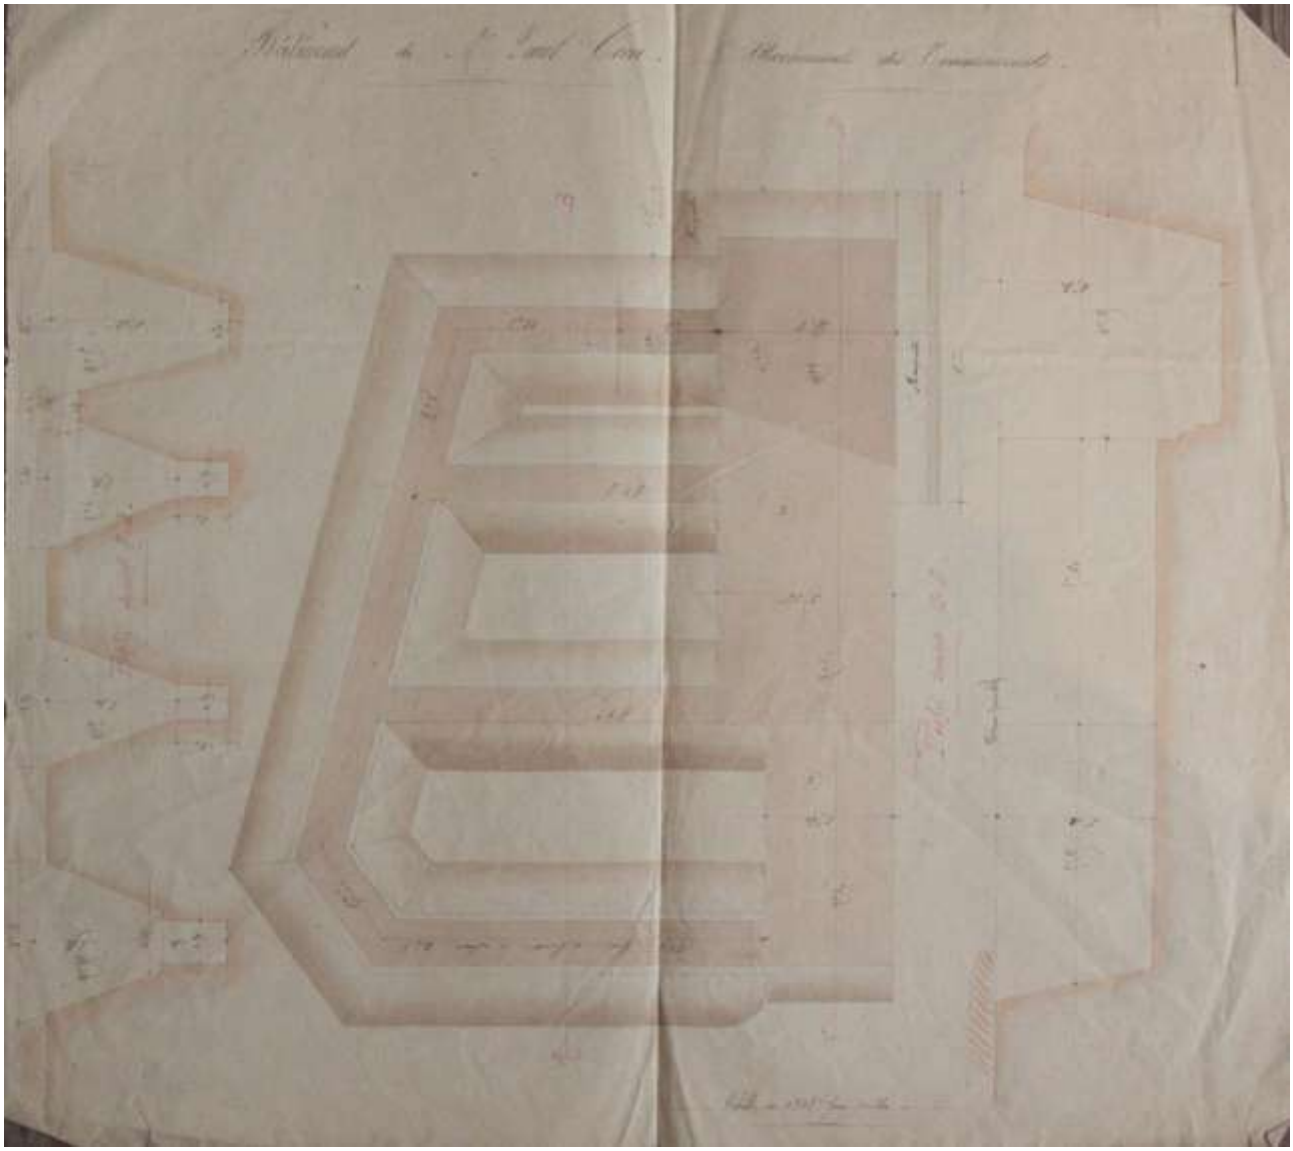

Détail du plan

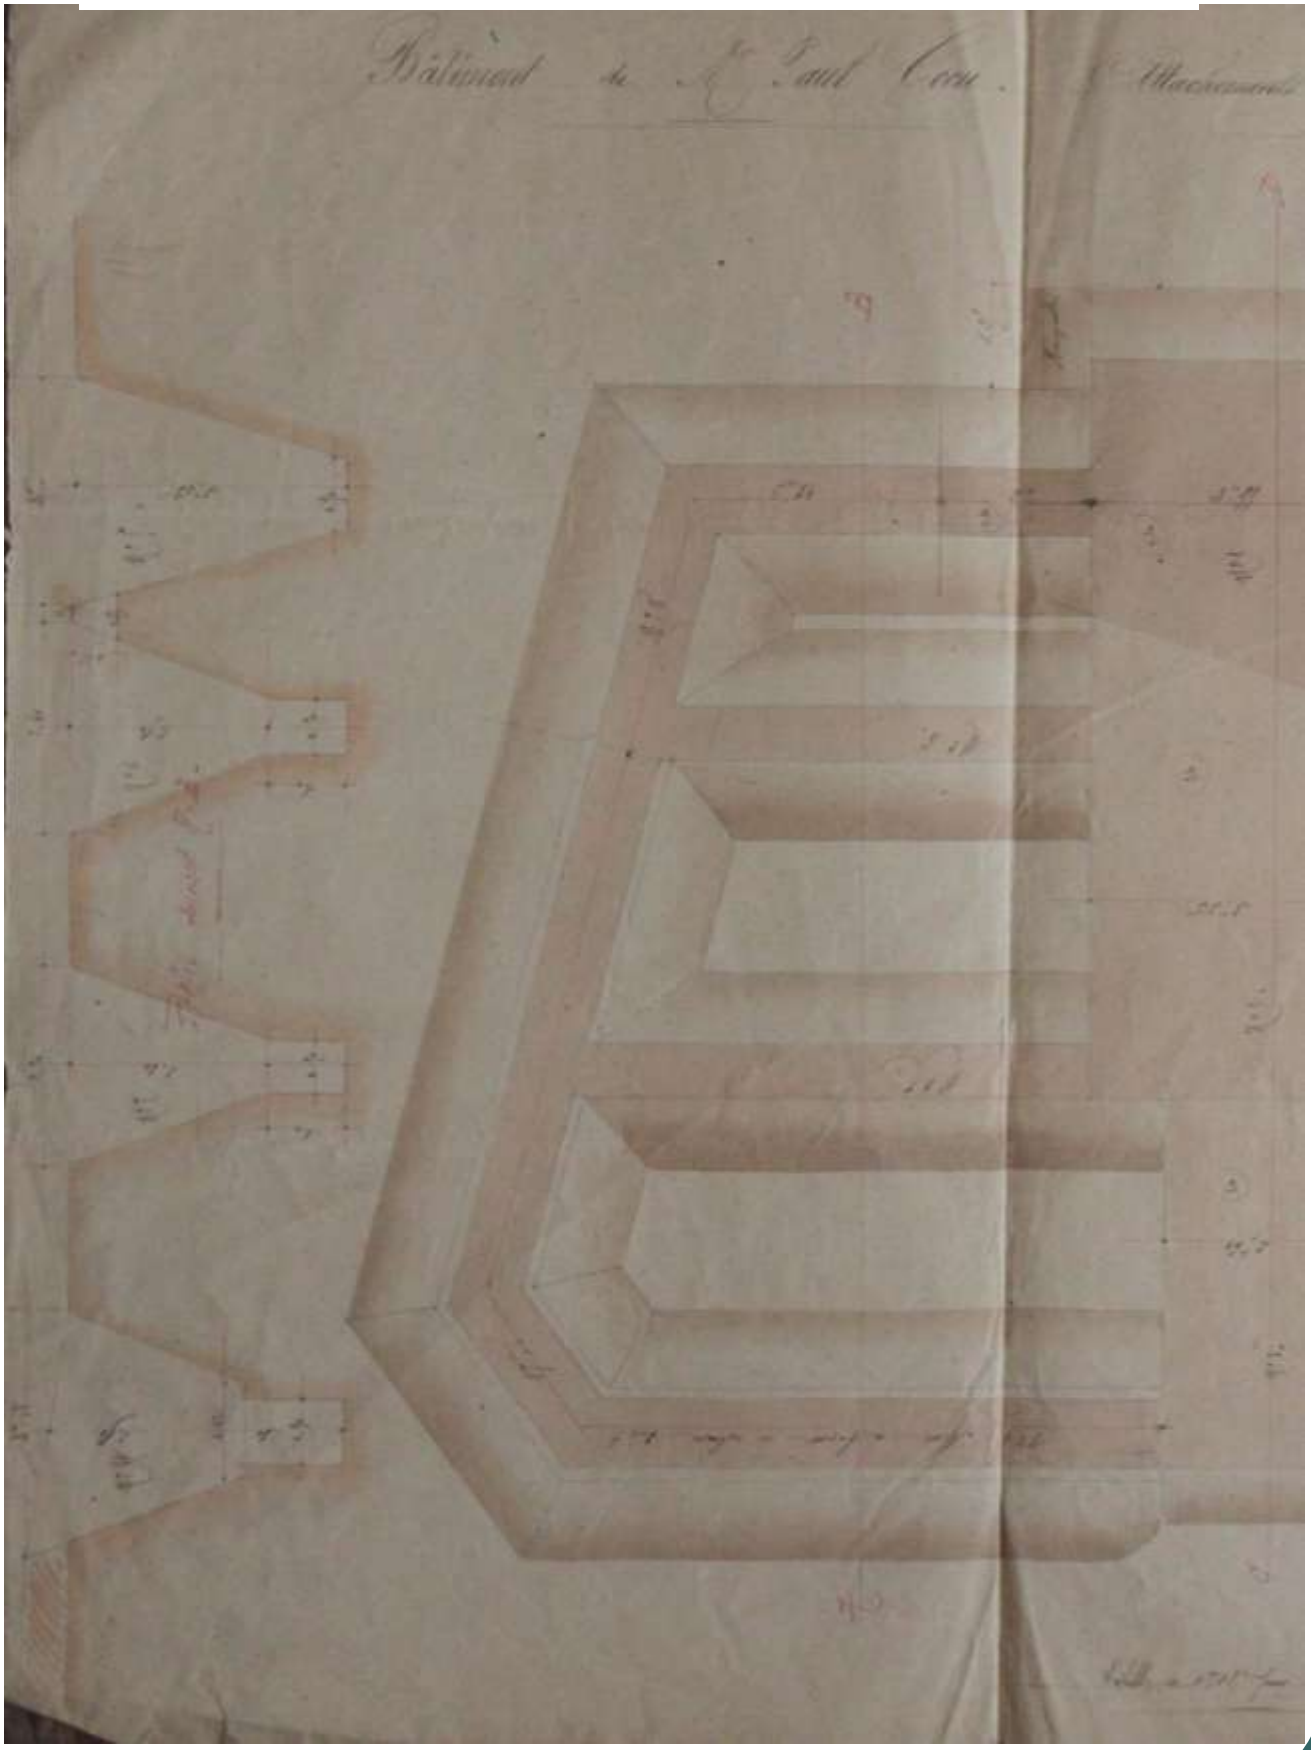

Plan du rez-de-chaussée

Taille du document :
63 x 56

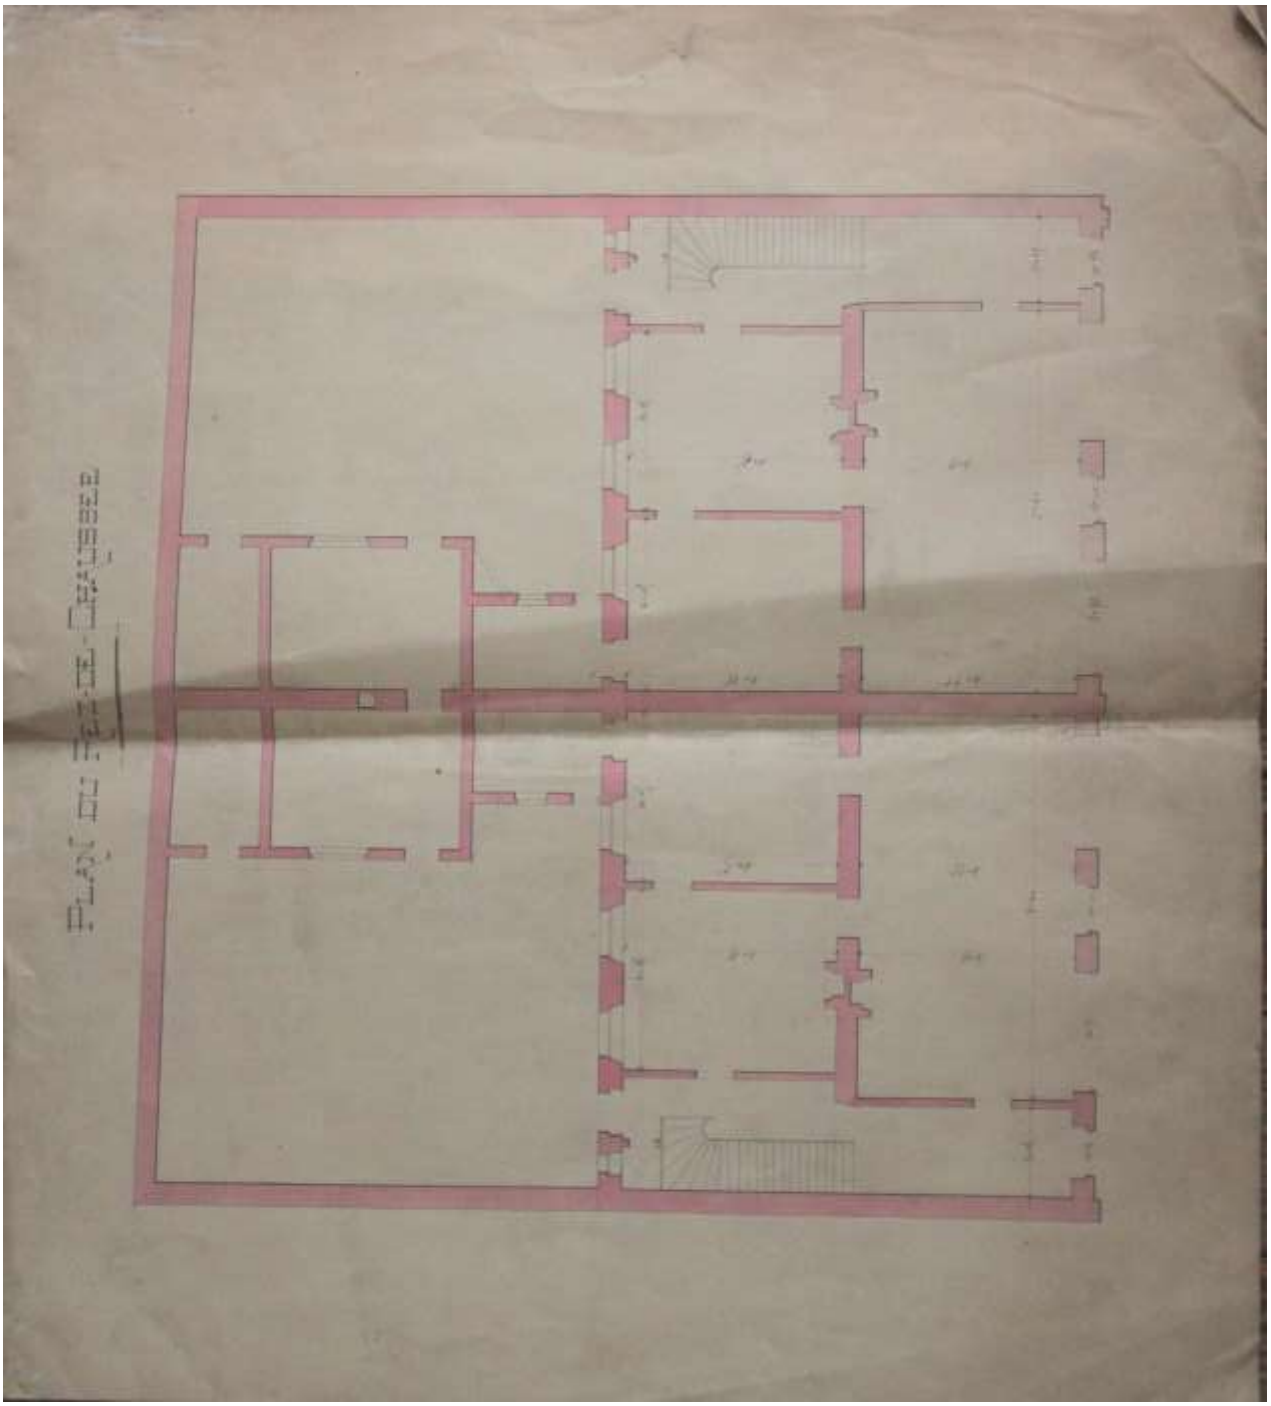

Plan du premier et deuxième étage

ALEXANDRE & FOURNAISE entrepreneurs à Sedan

Taille du document :
60 x 38

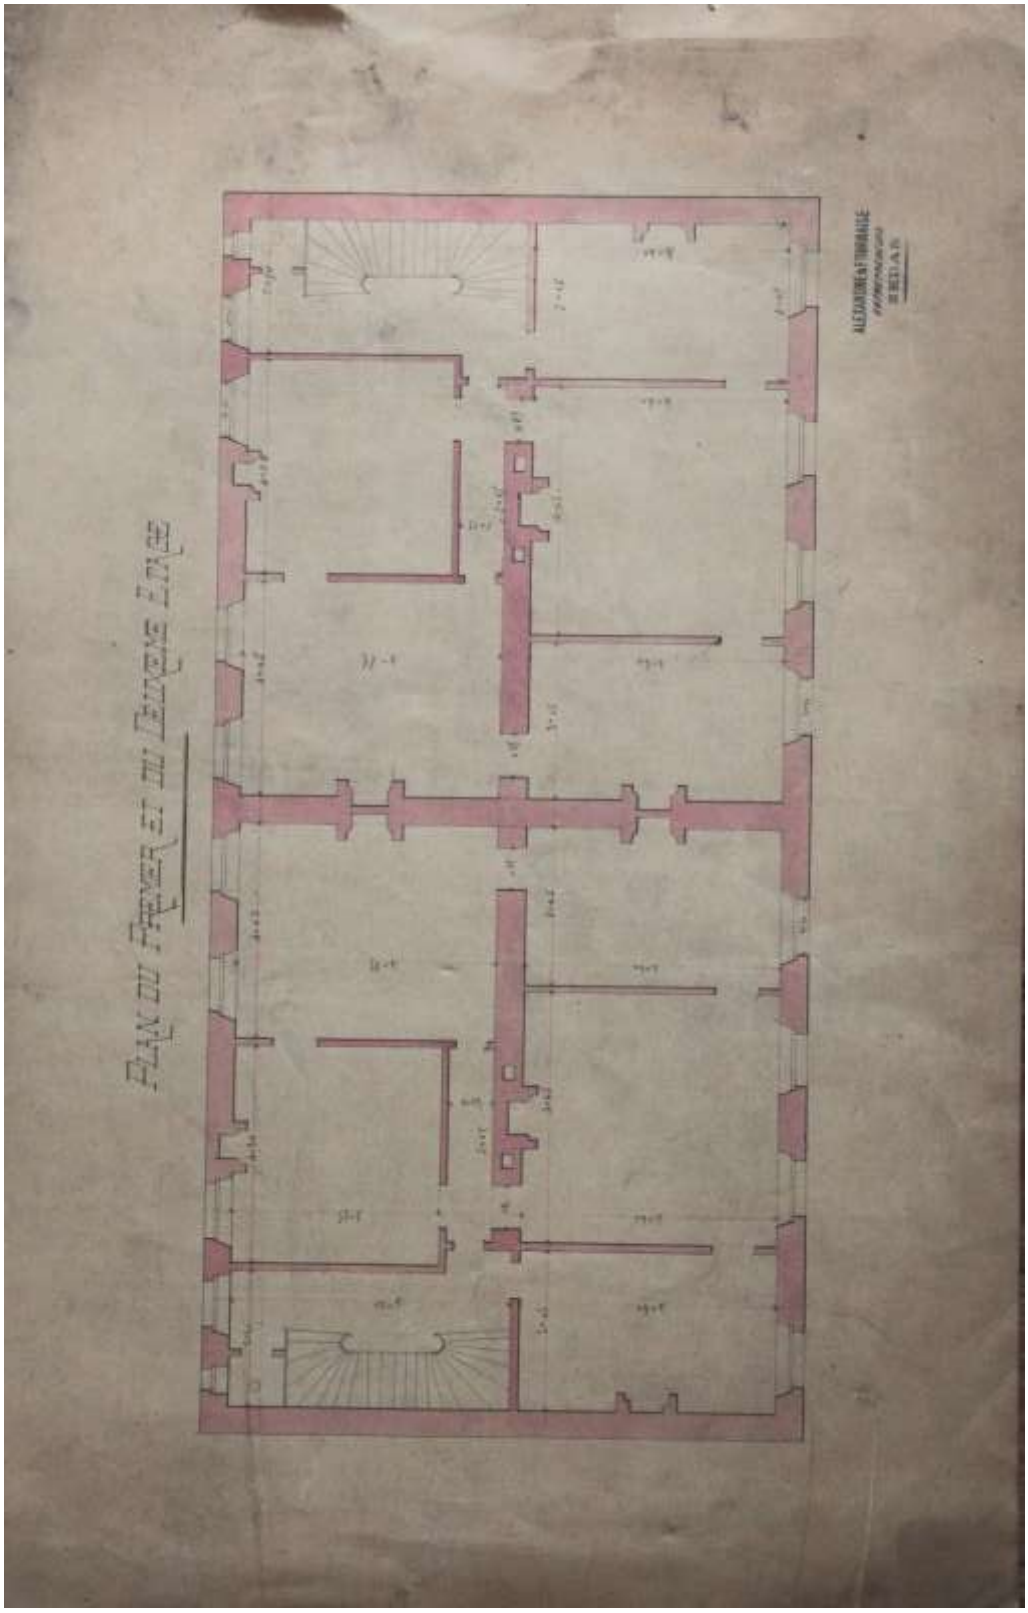

Plan du Premier étage

C. FOURNAISE Entrepreneur

22 avenue Philippoteaux Sedan

Taille du document :
52 x 34.5

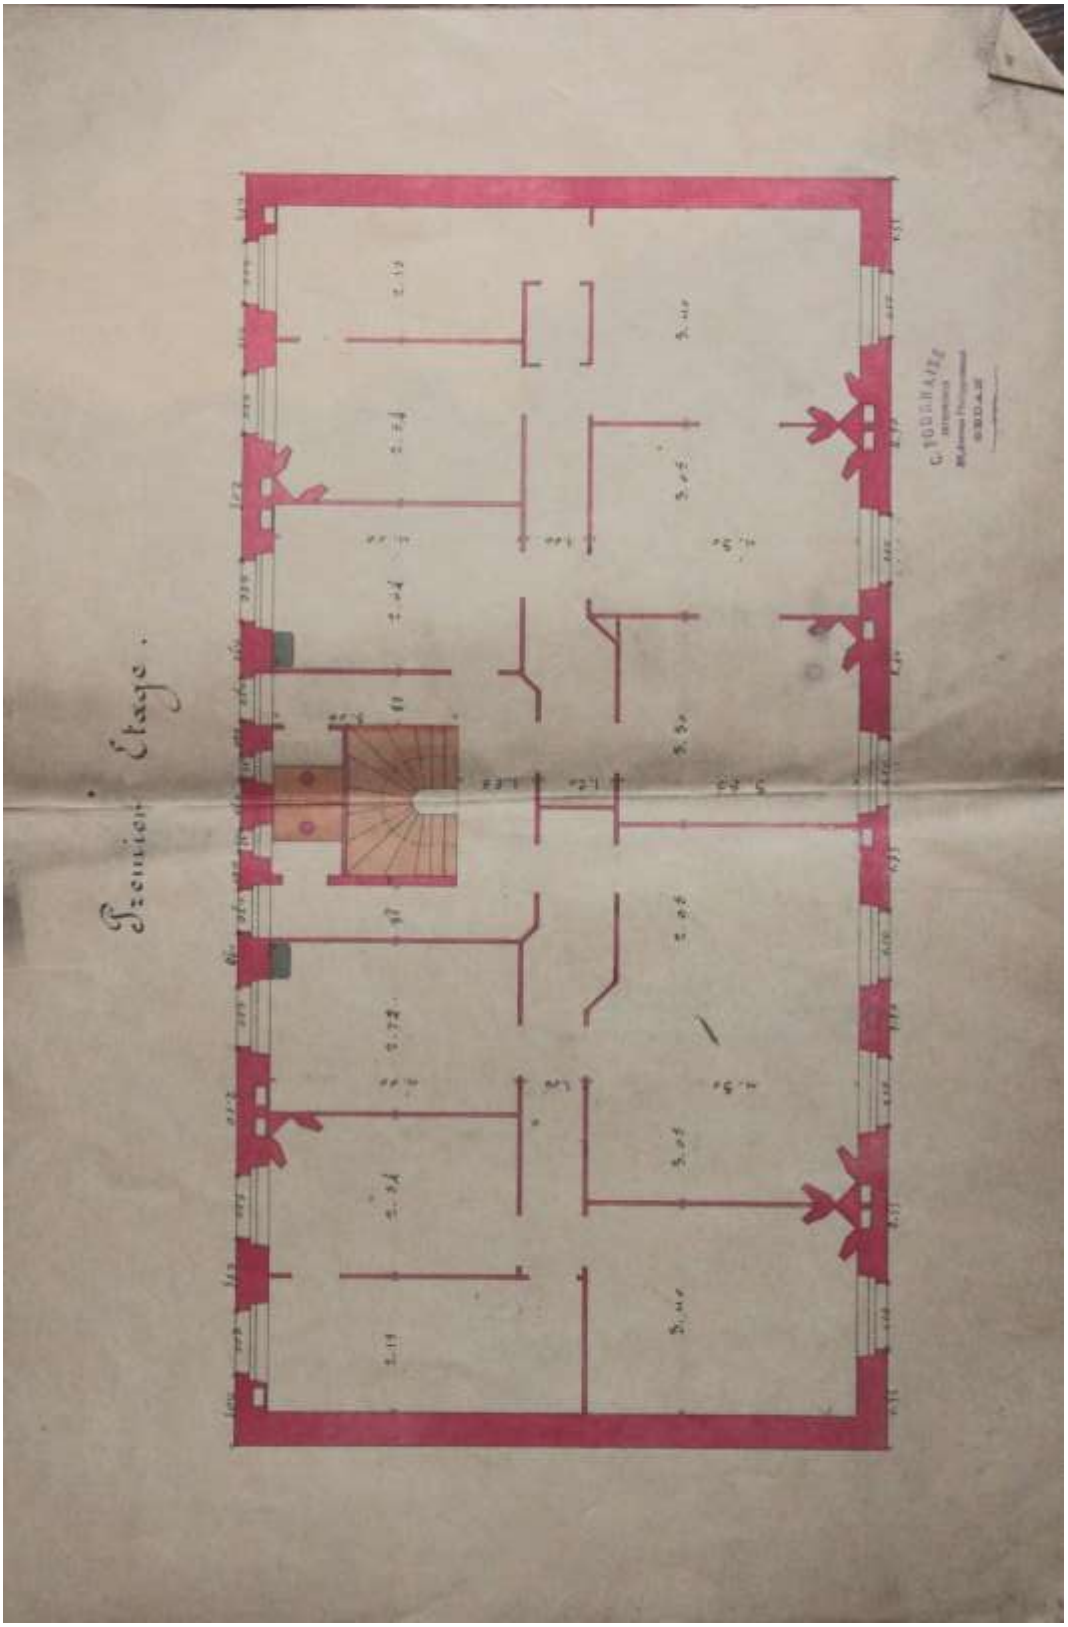

Plan

C. FOURNAISE Entrepreneur

22 avenue Philippoteaux Sedan

Taille du document :
52.5 x 33

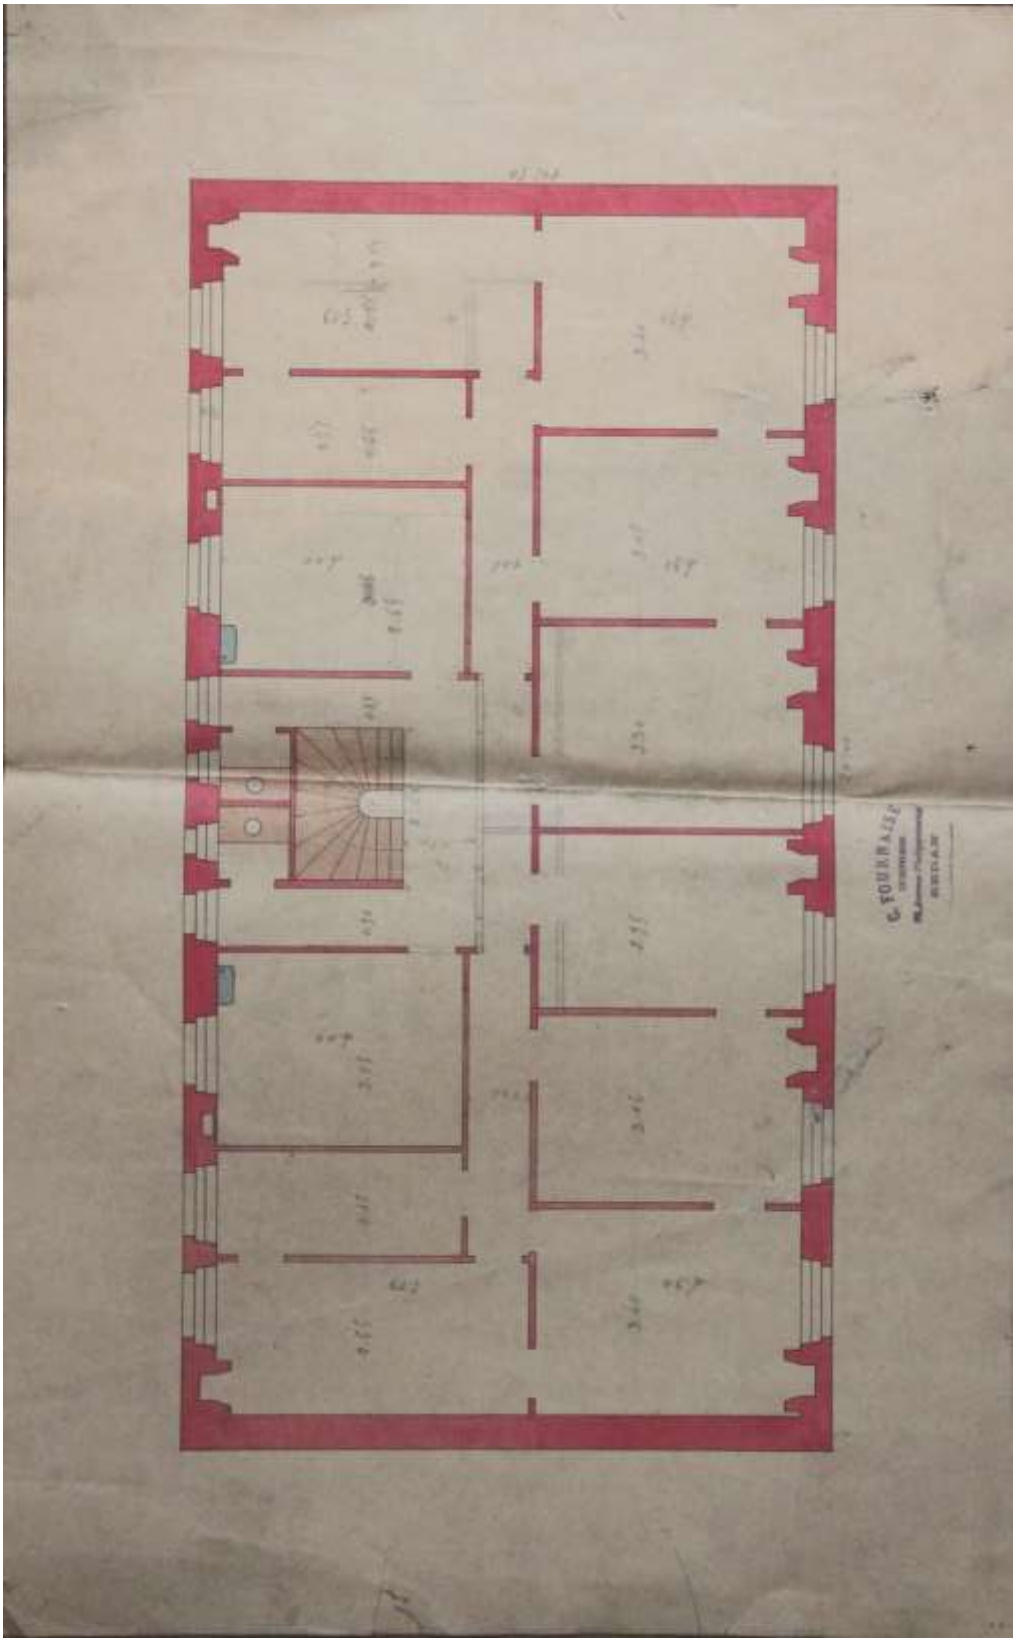

Plan du Premier étage

C. FOURNAISE Entrepreneur

22 avenue Philippoteaux Sedan

Taille du document :
45 x 32.5

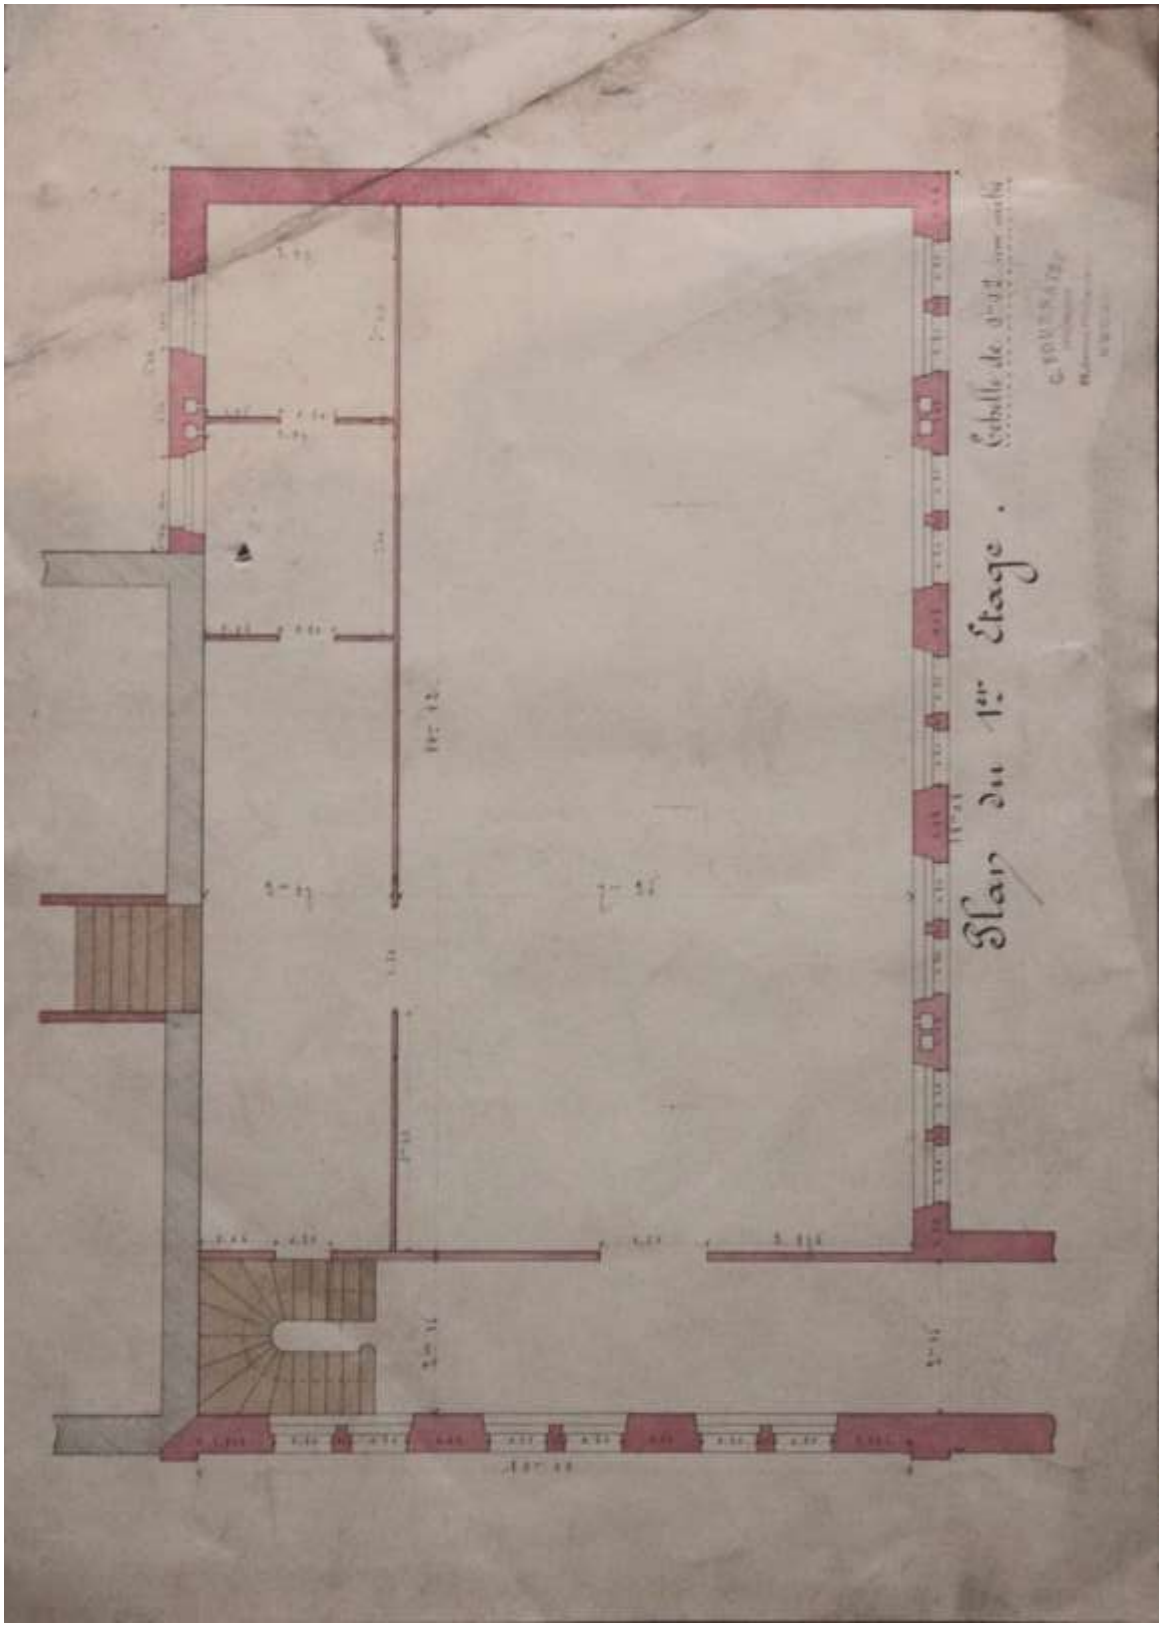

Plan

Taille du document :
58.5 x 55

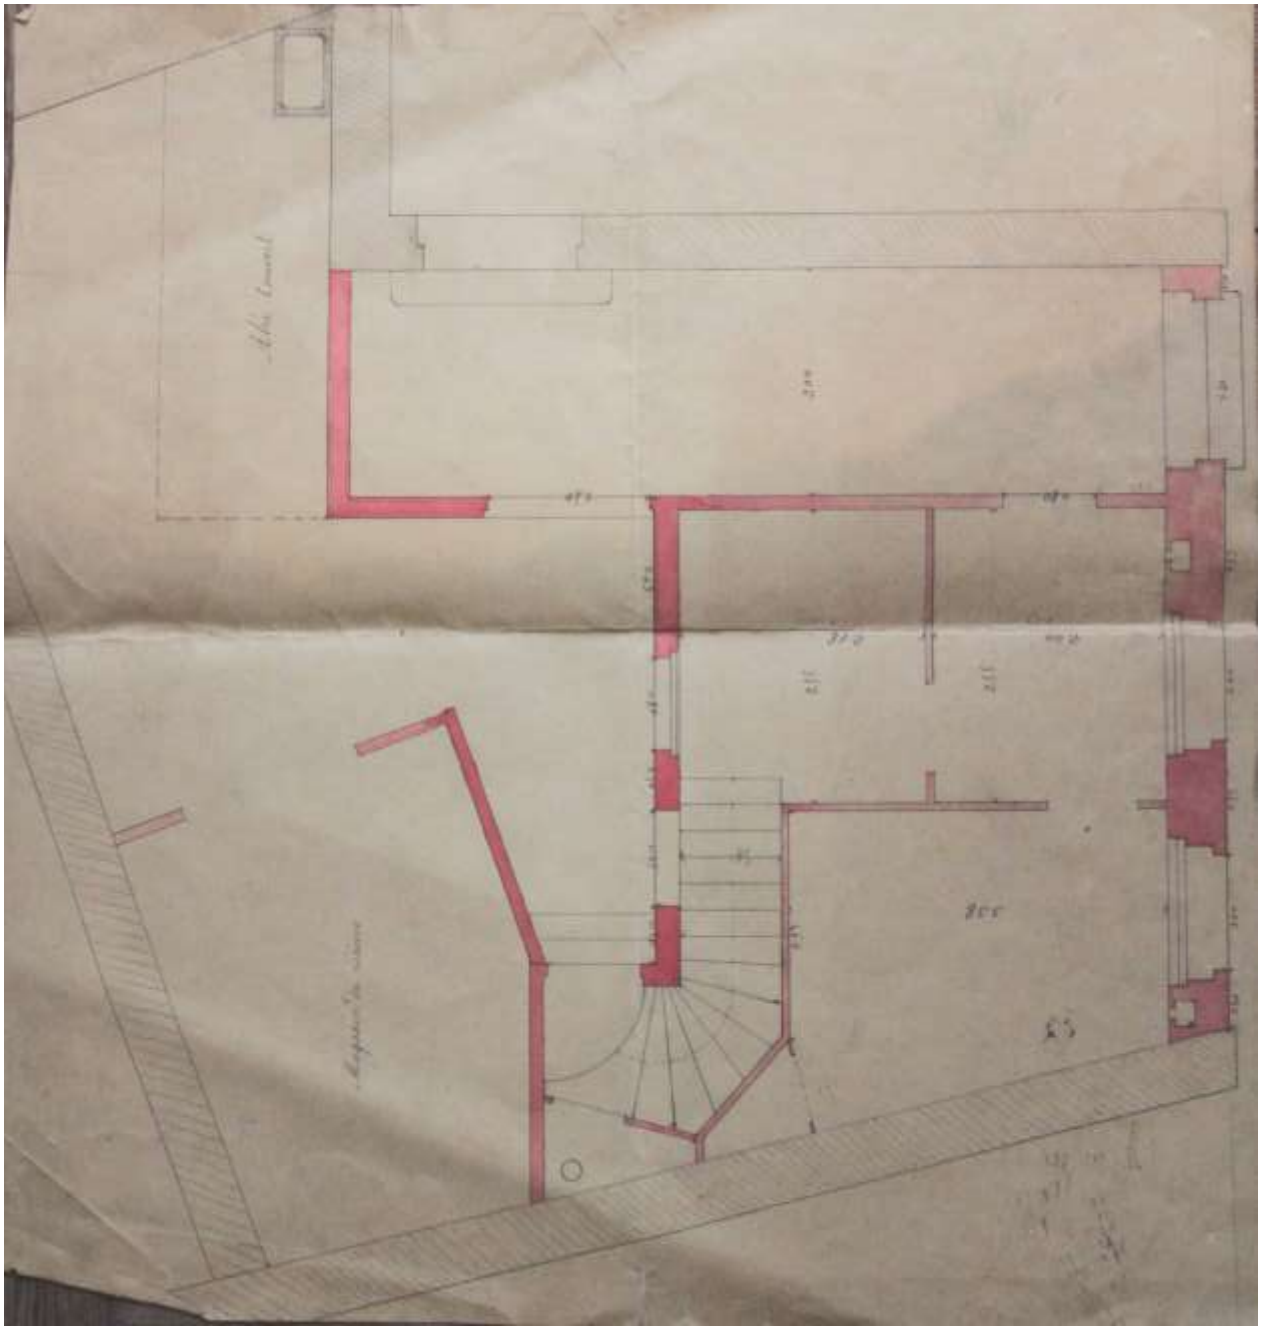

Plan

Taille du document :
50.5 x 37.5

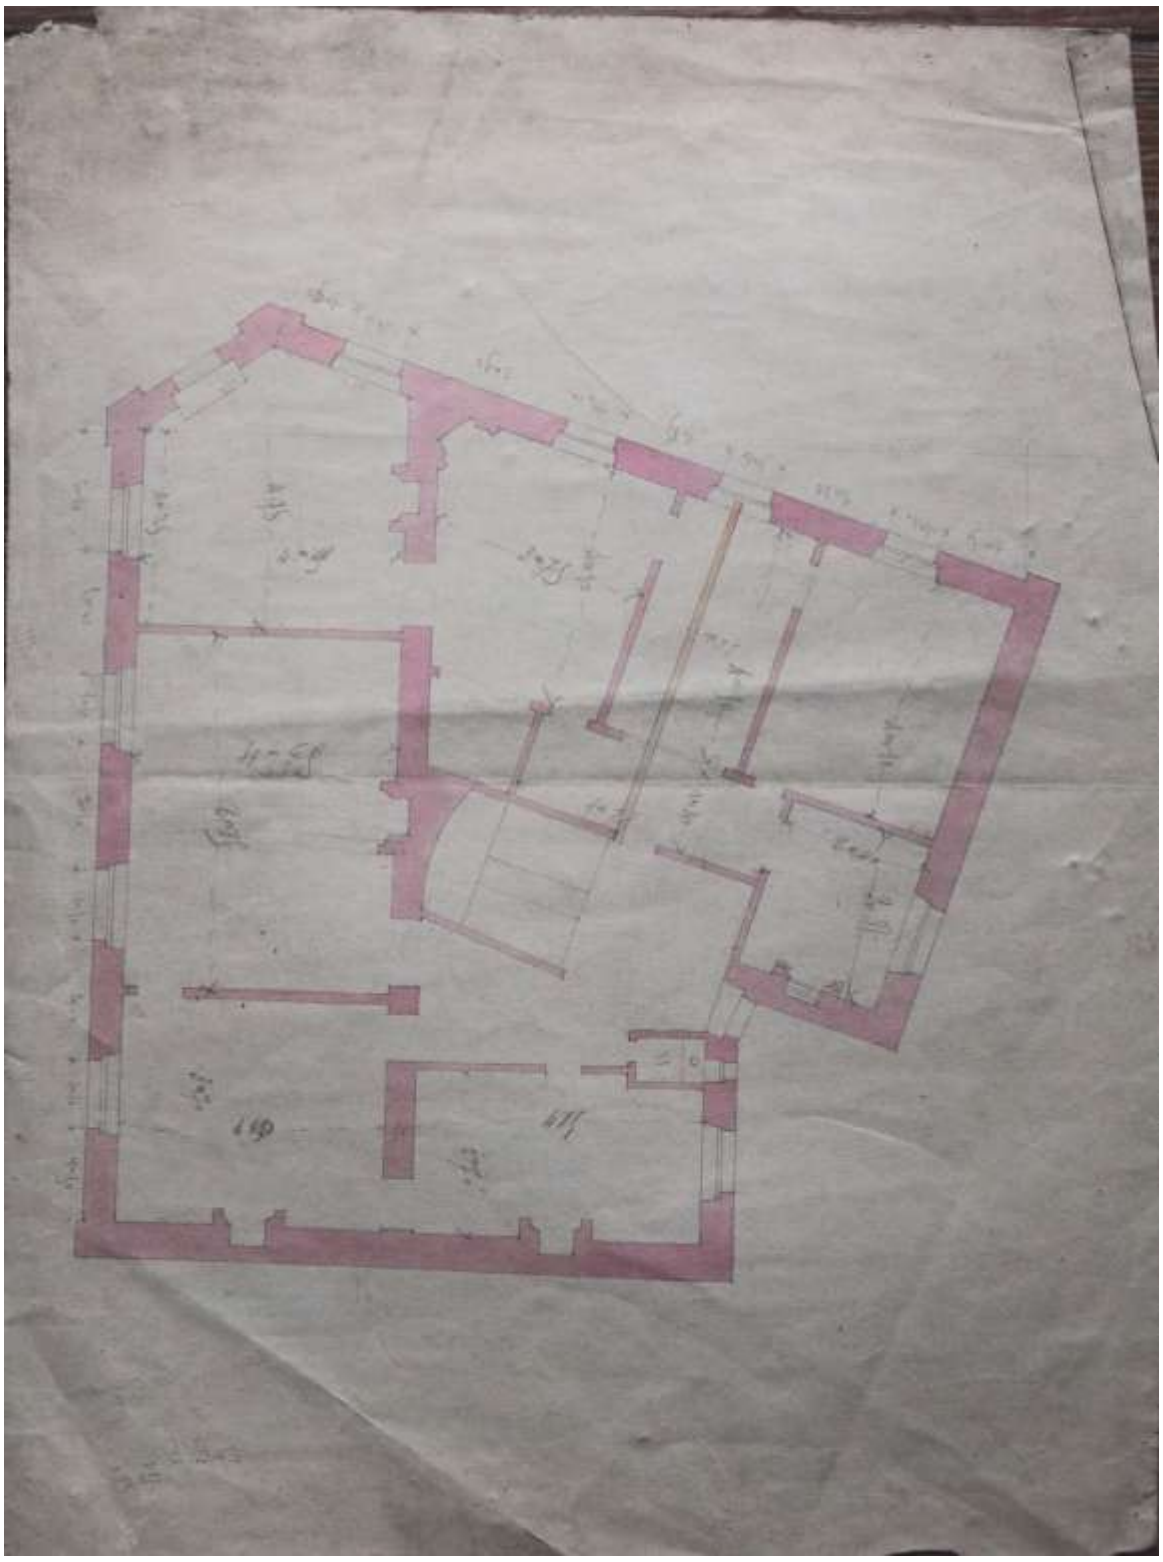

Plan en coupe suivant A-B

Taille du document :
33.5 x 44.5

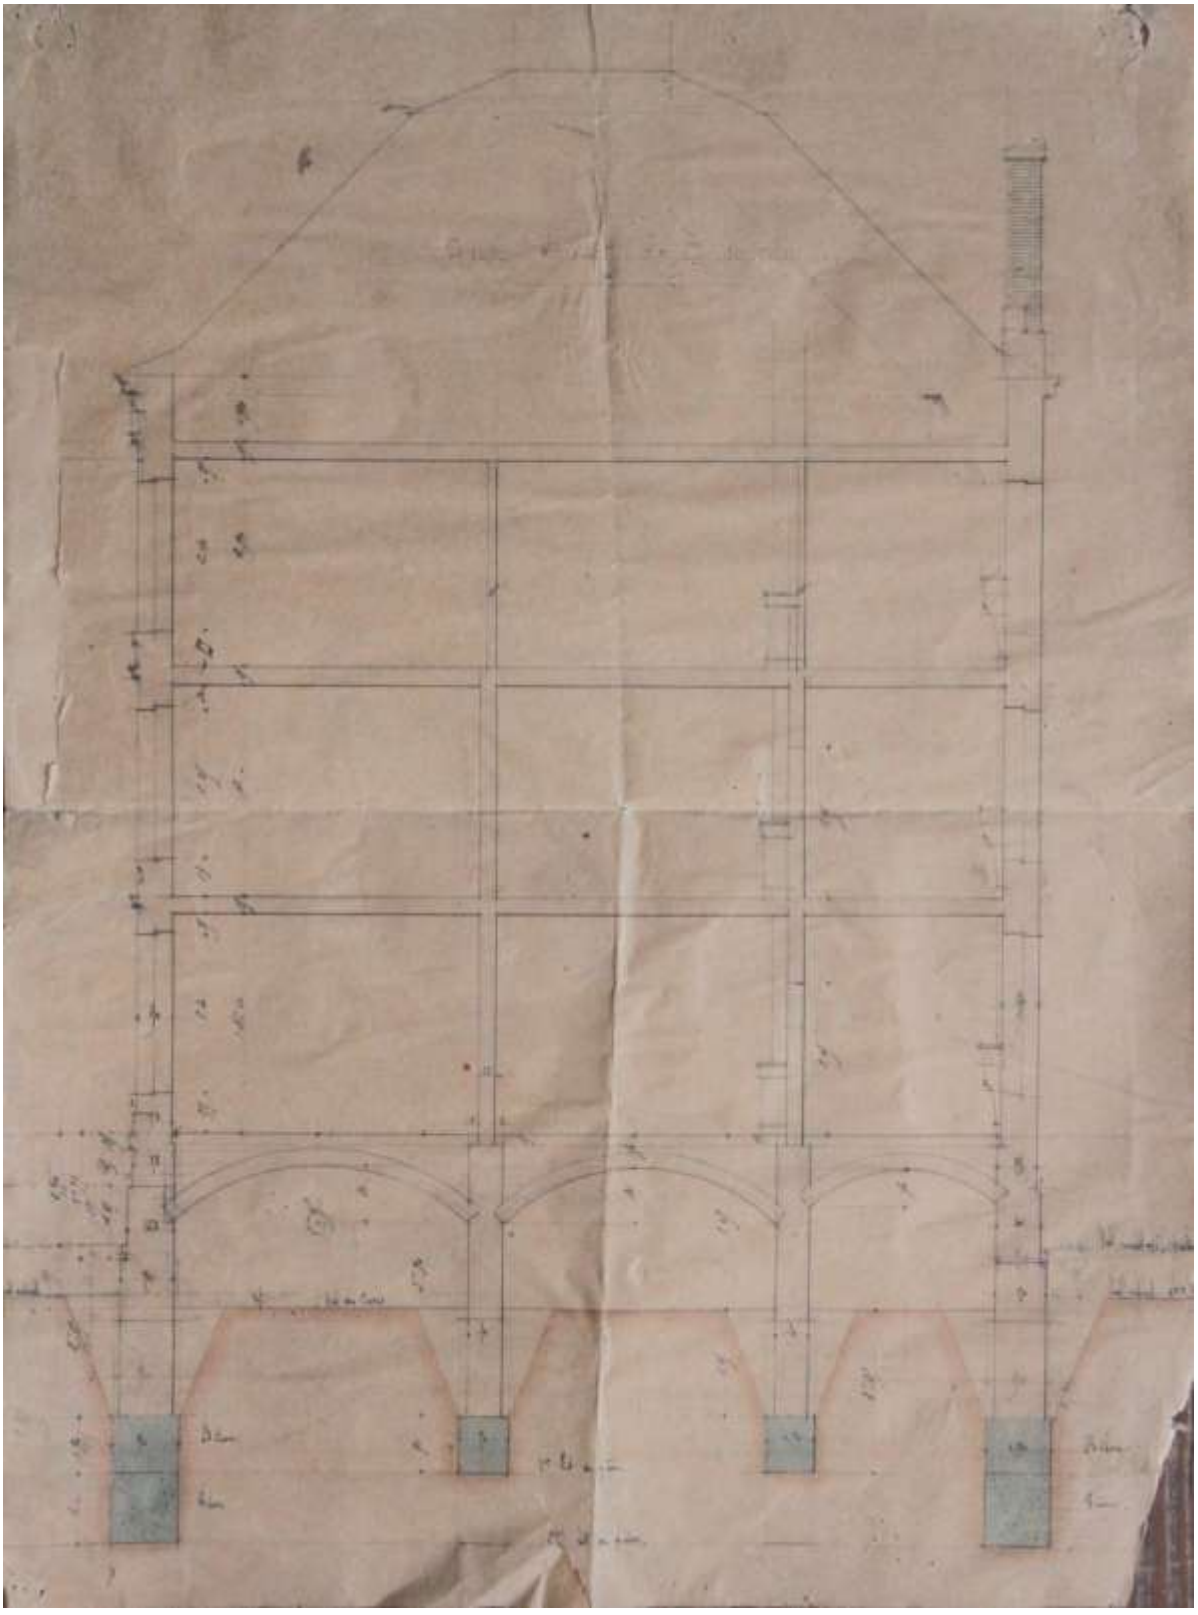

Plan

Rue des jardins

Taille du document :
53.5 x 43.5

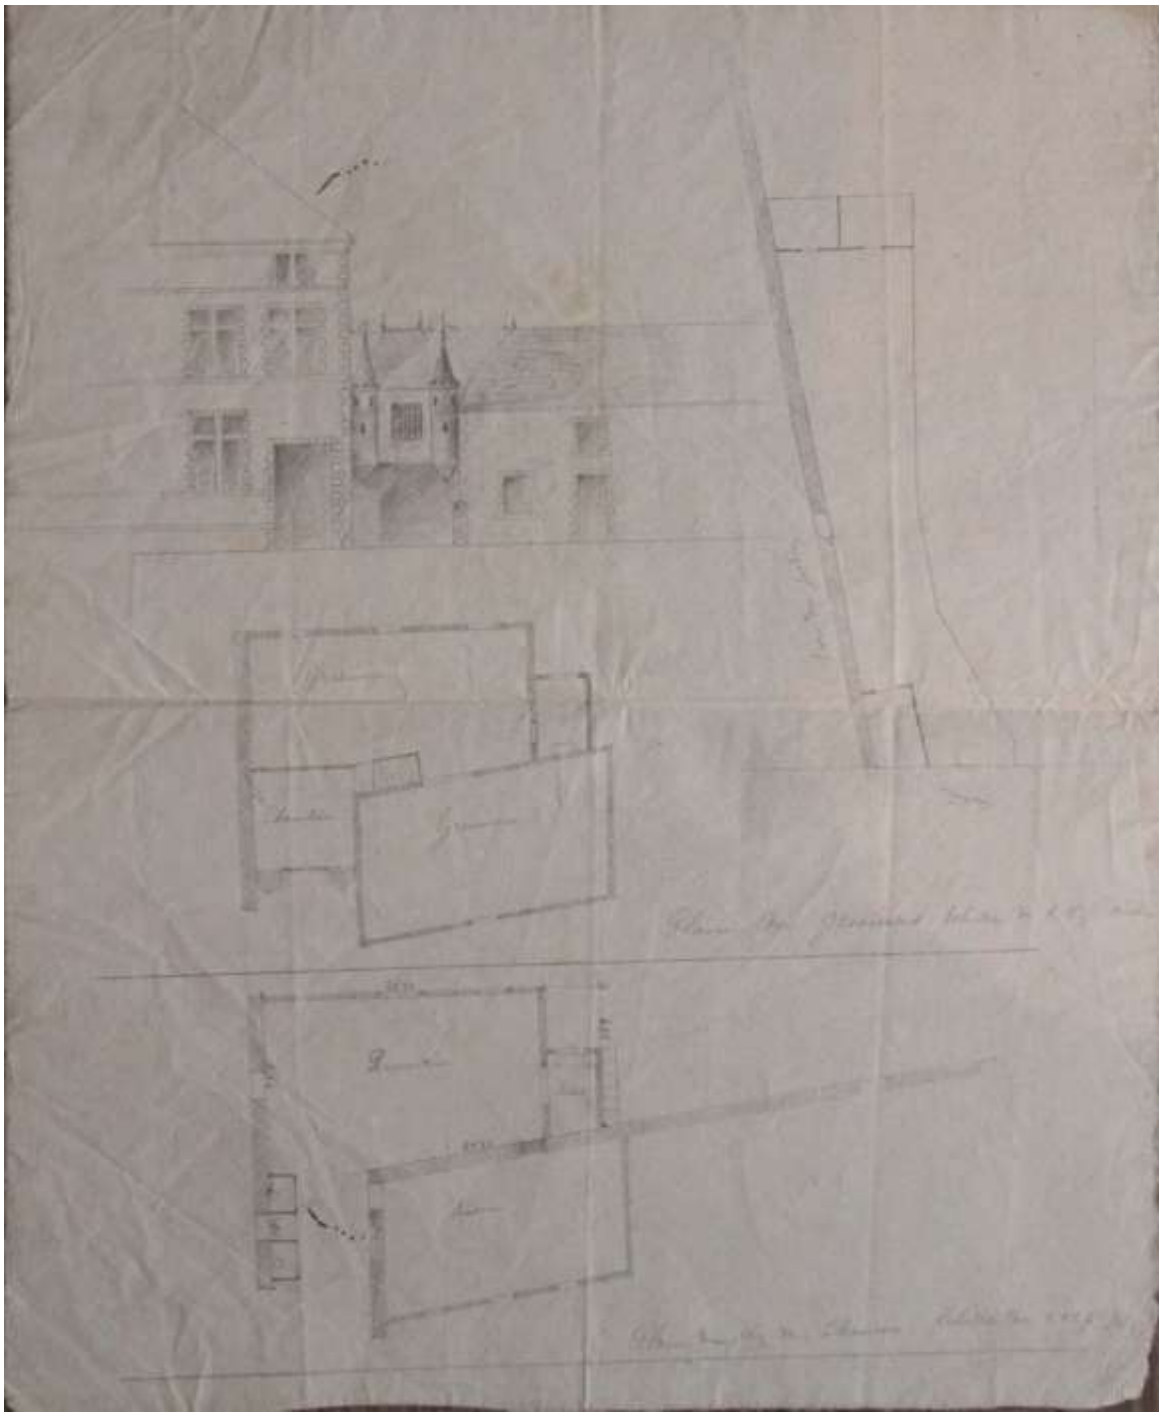

Vue en coupe

Taille du document :
25 x 128.5

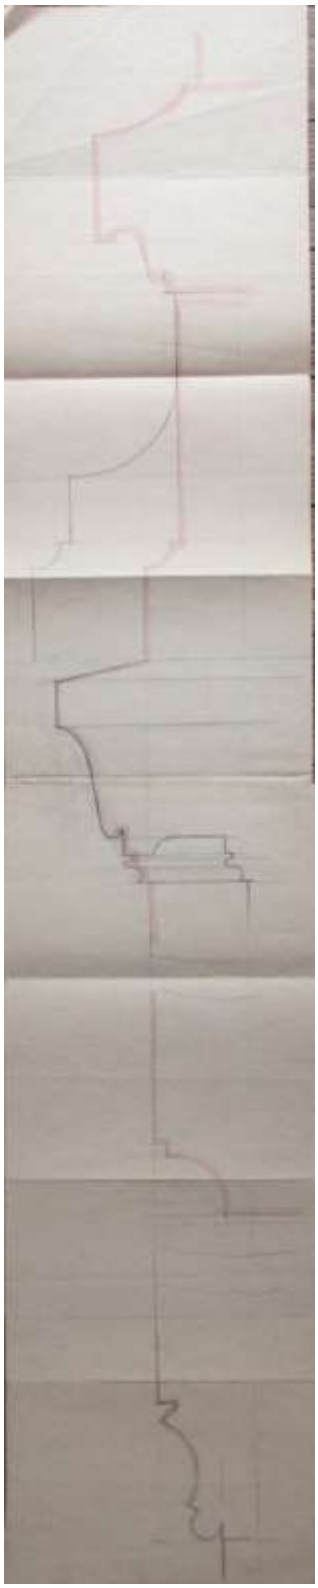

Façade

Taille du document :
64.5 x 50

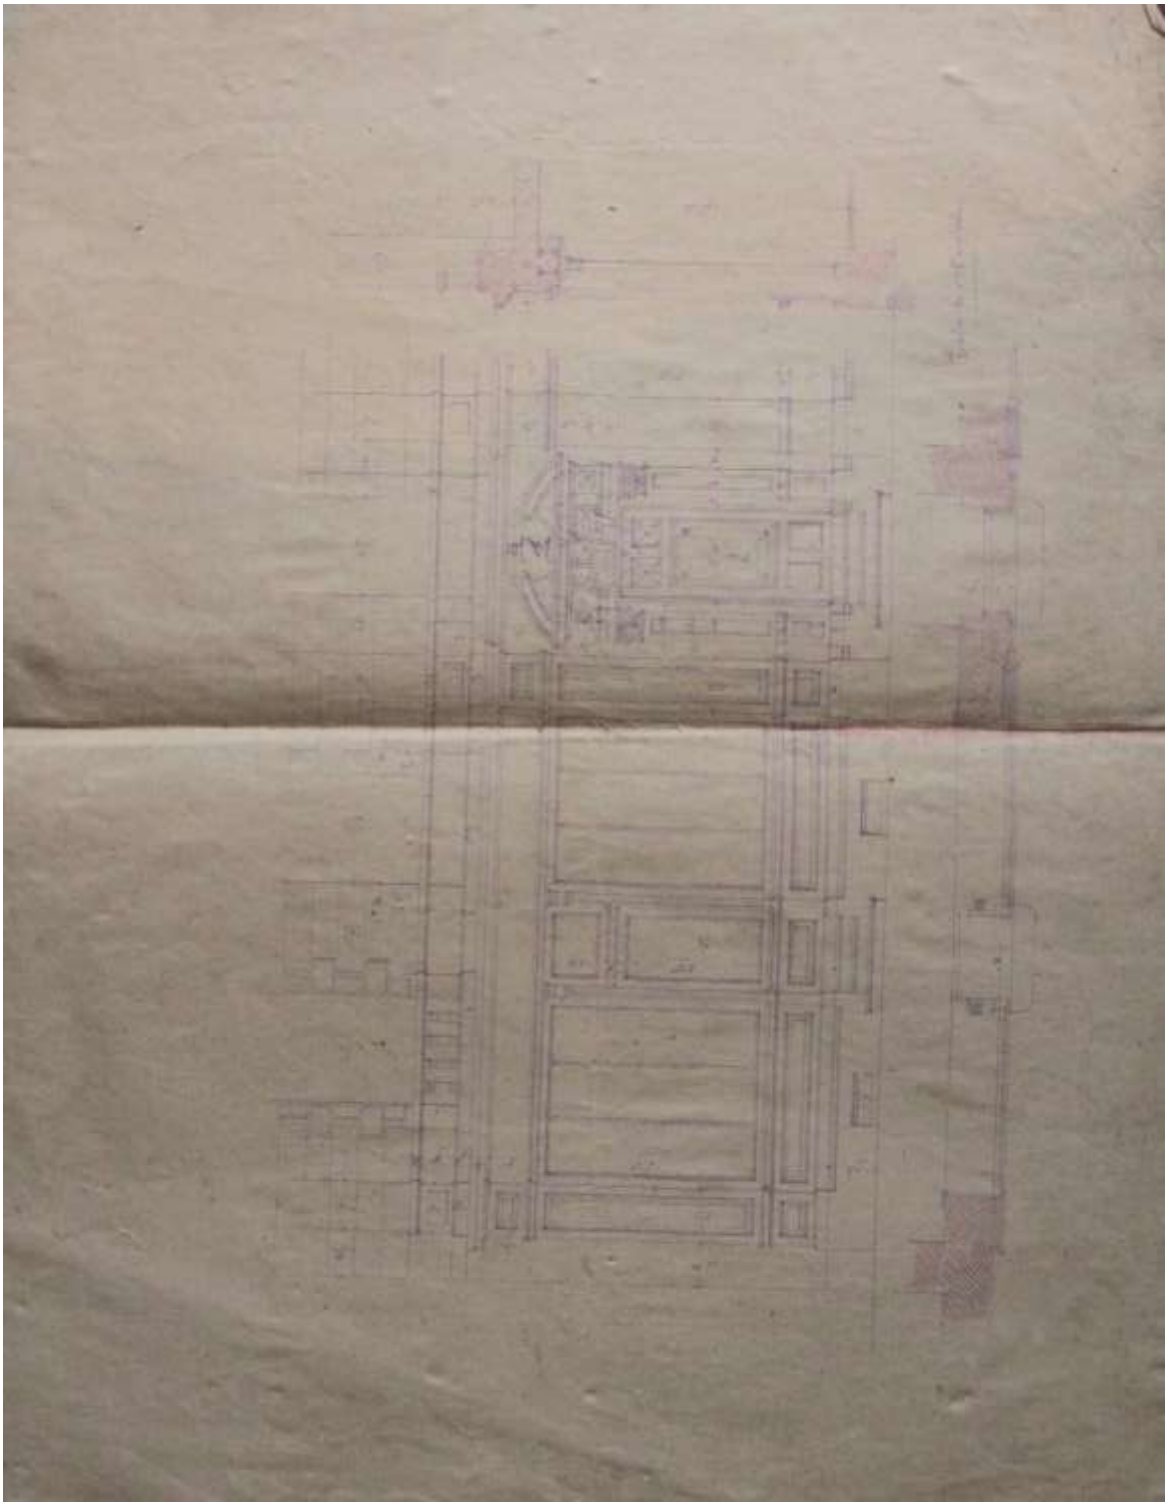

Façade

Façade sur rue

Taille du document :
38 x 40.5

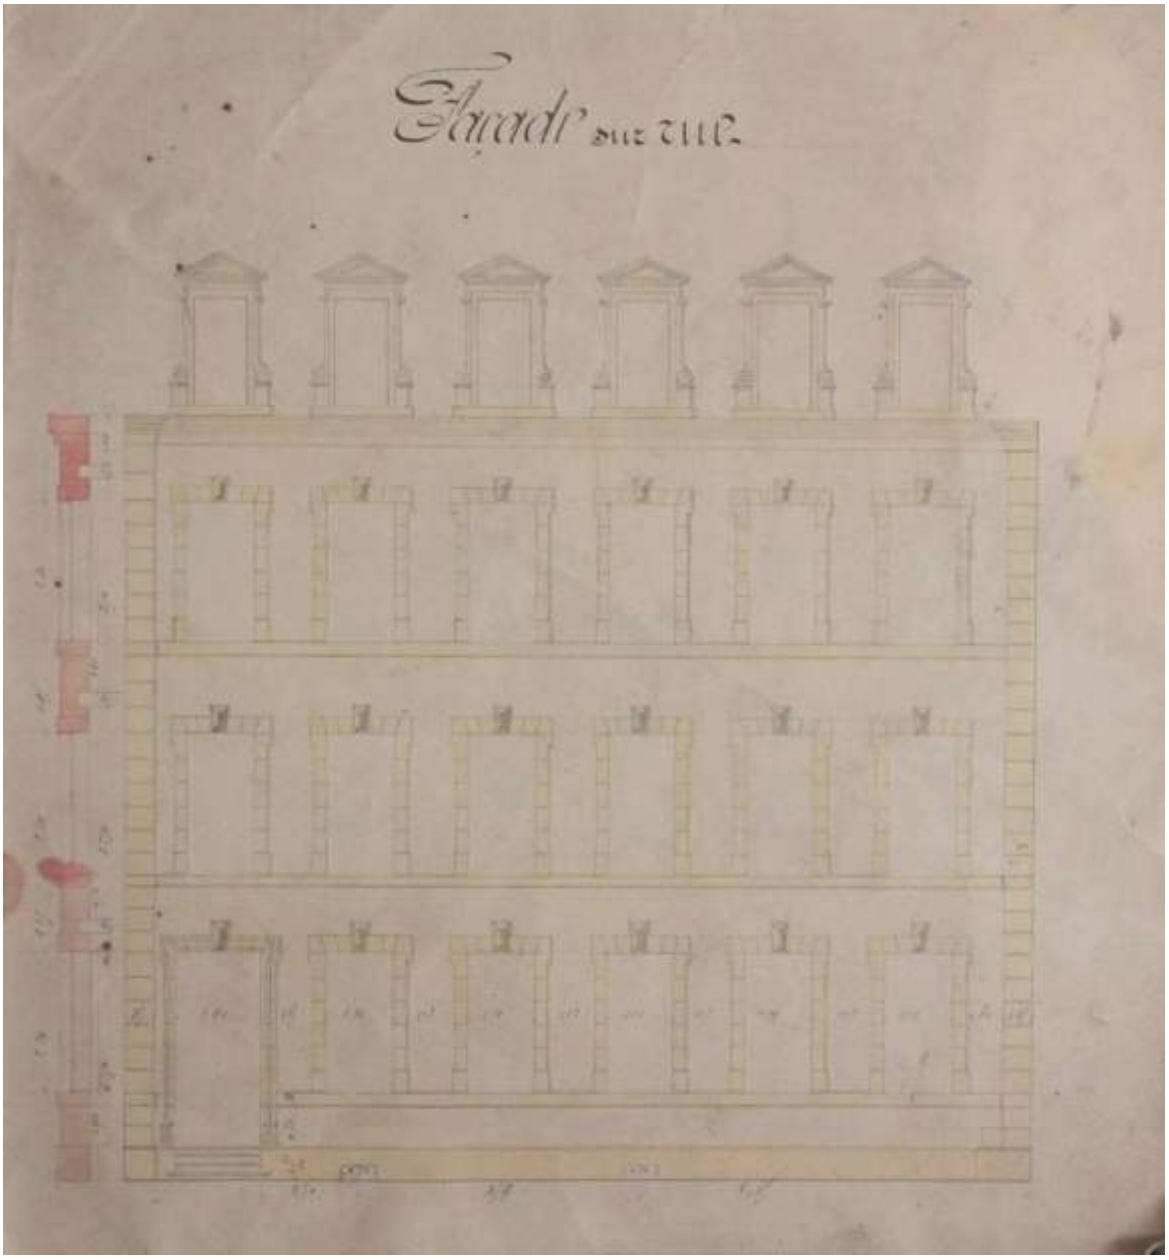

Façade

Taille du document :
44 x 31

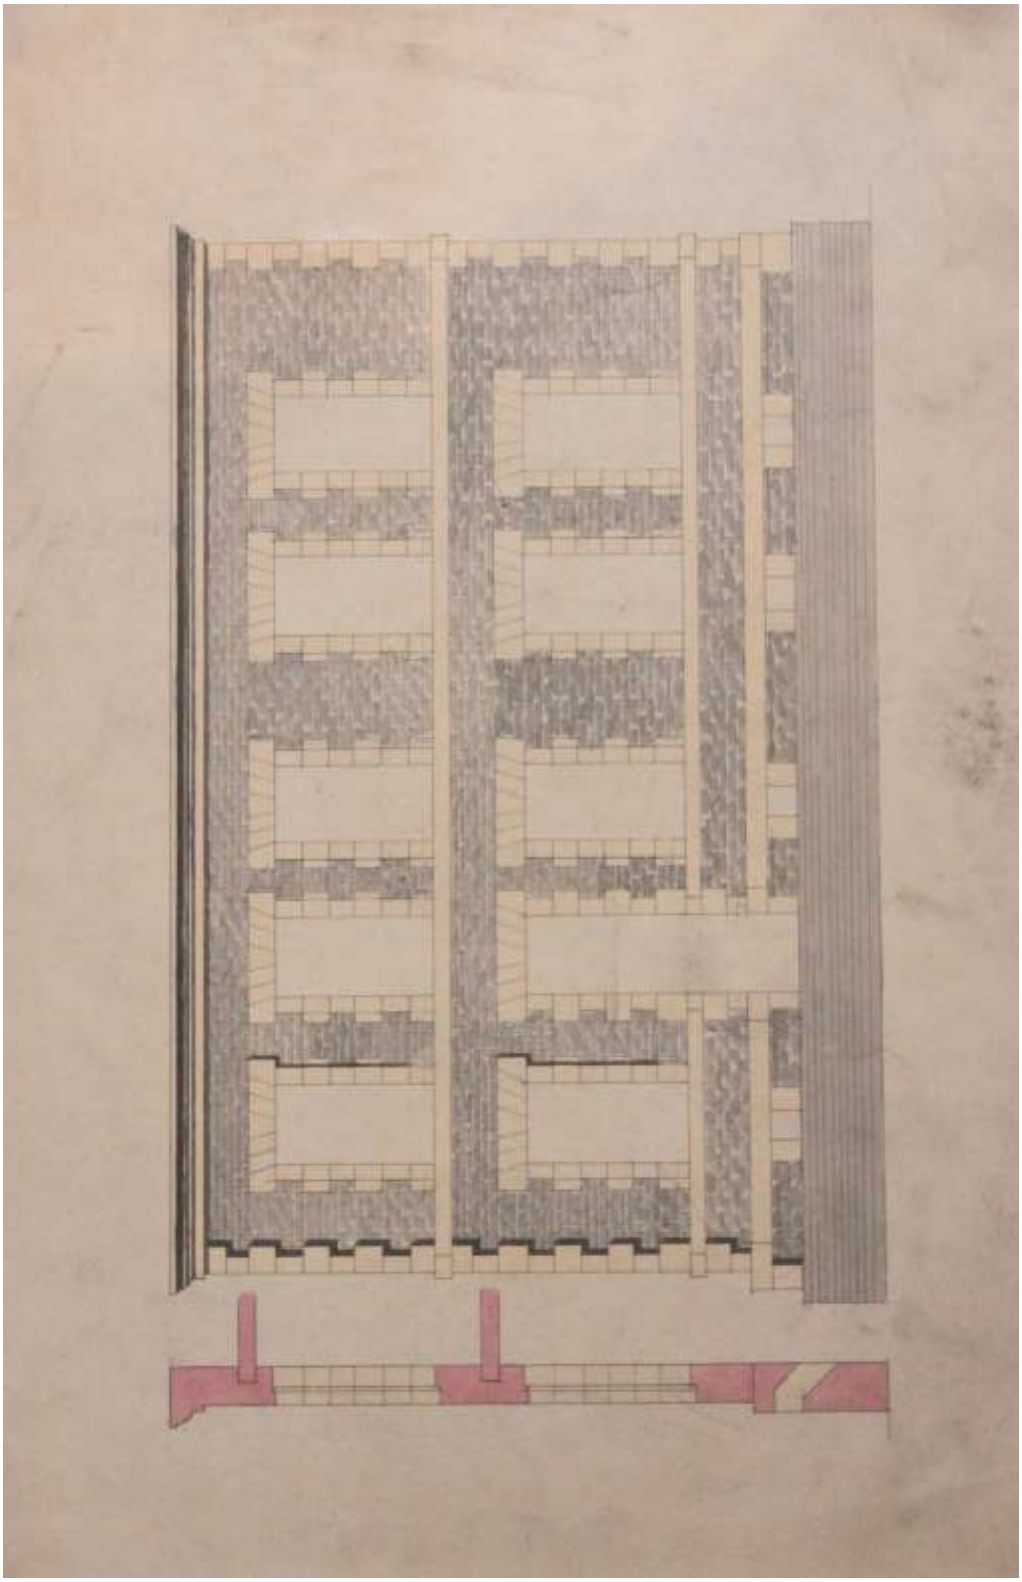

Façade

Taille du document :
45.5 x 36

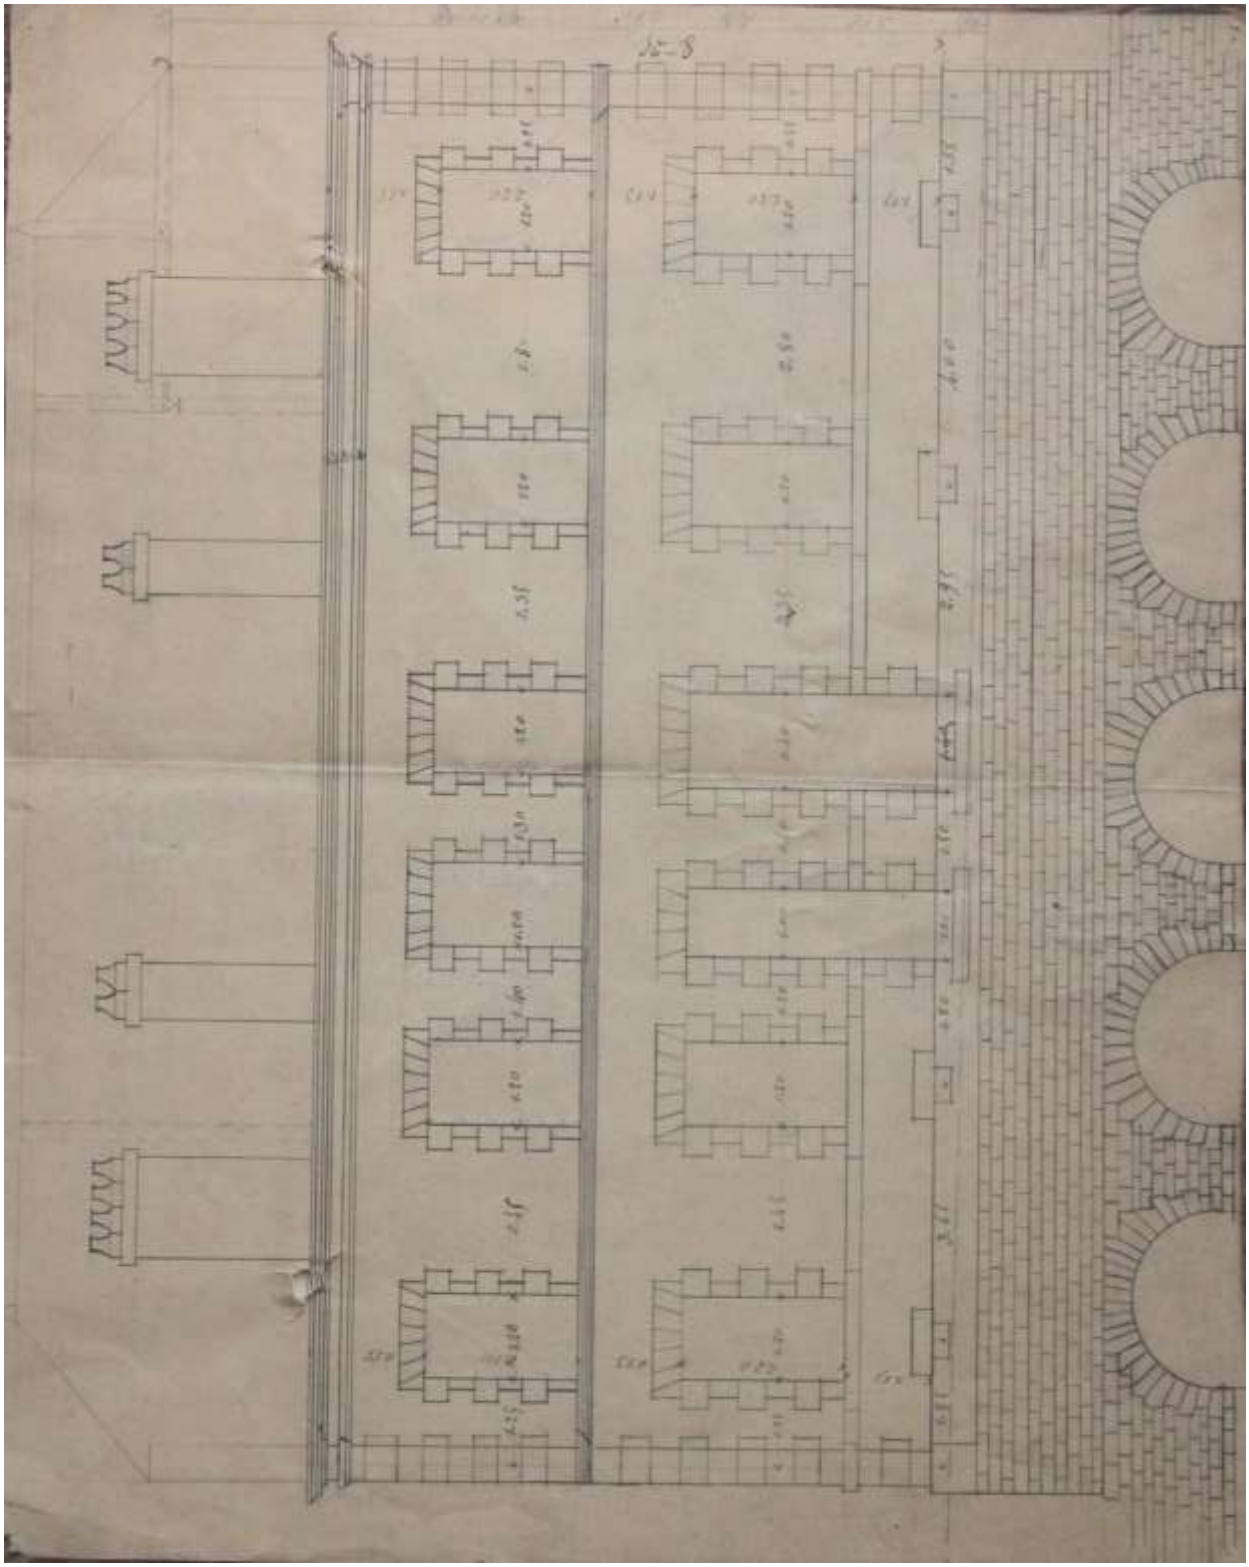

Propriété de Mr PIROUX

Profil des chambranles des fenêtres du rez-de-chaussée.

Taille du document : Recto
63.5 x 47.5

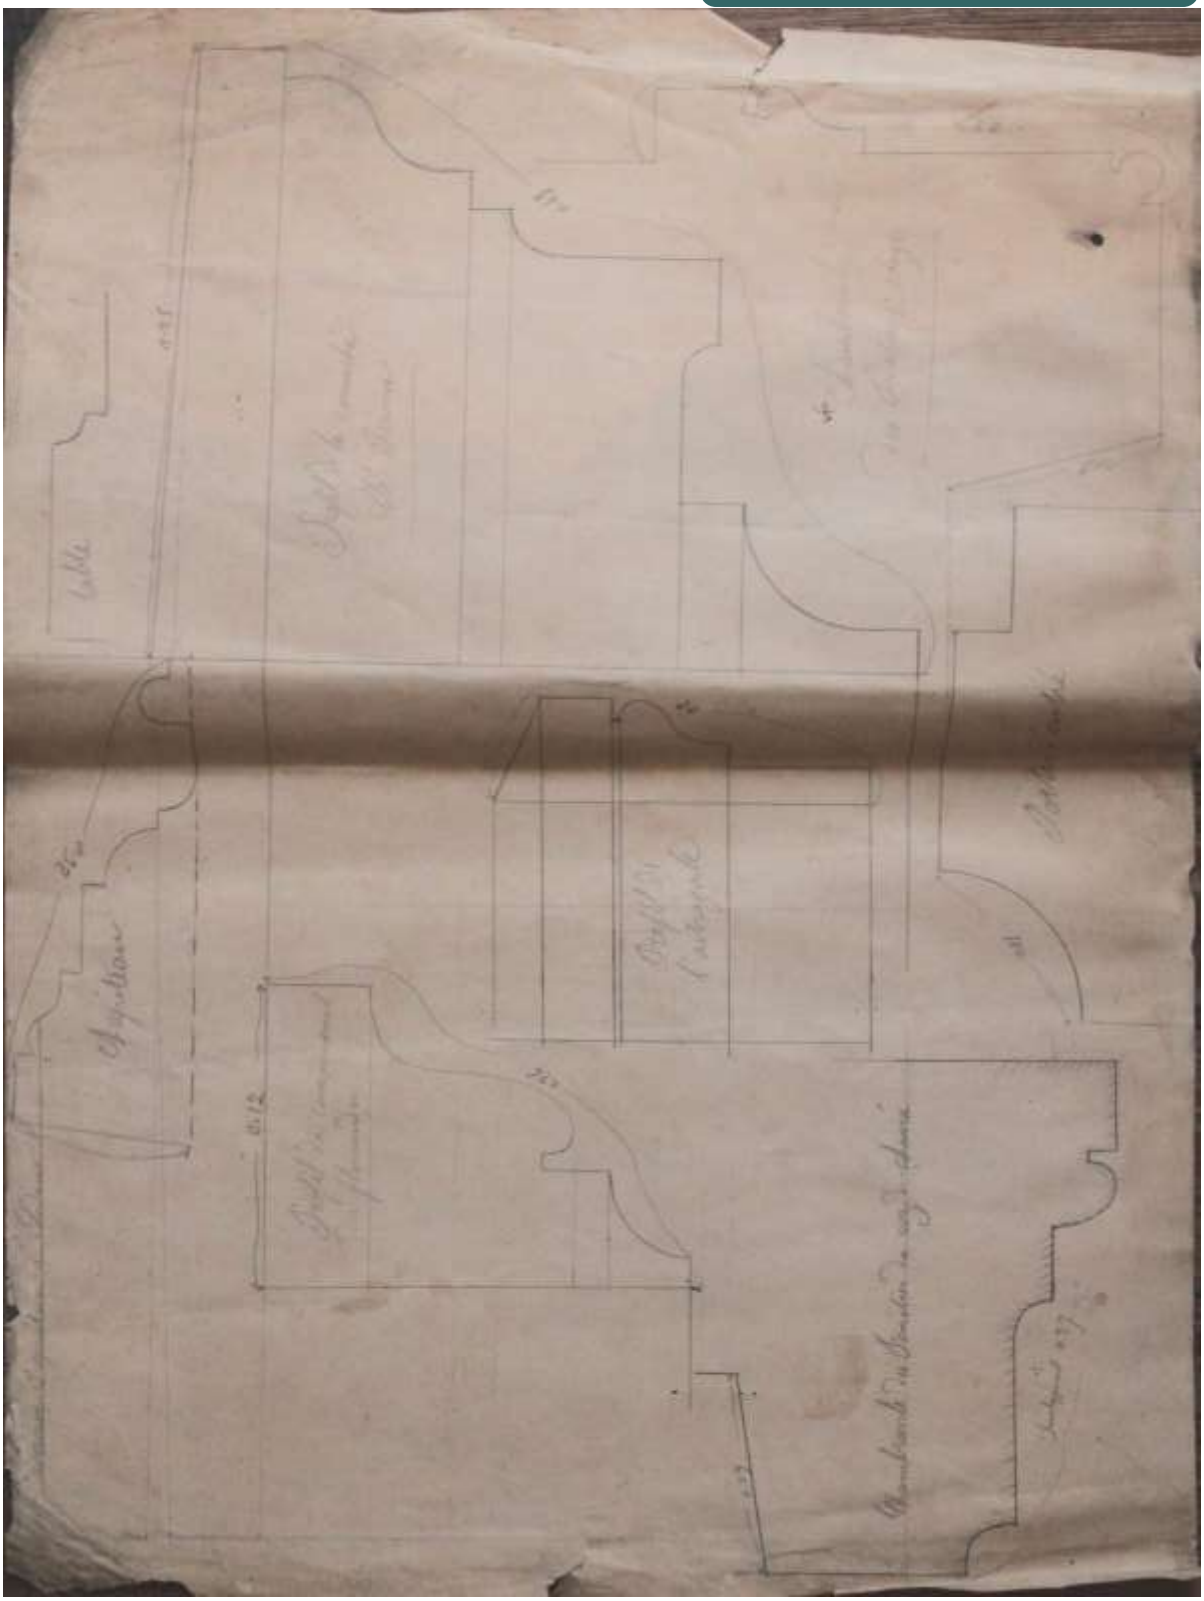

Propriété de Mr PIROUX

Taille du document : Verso
64 x 47.5

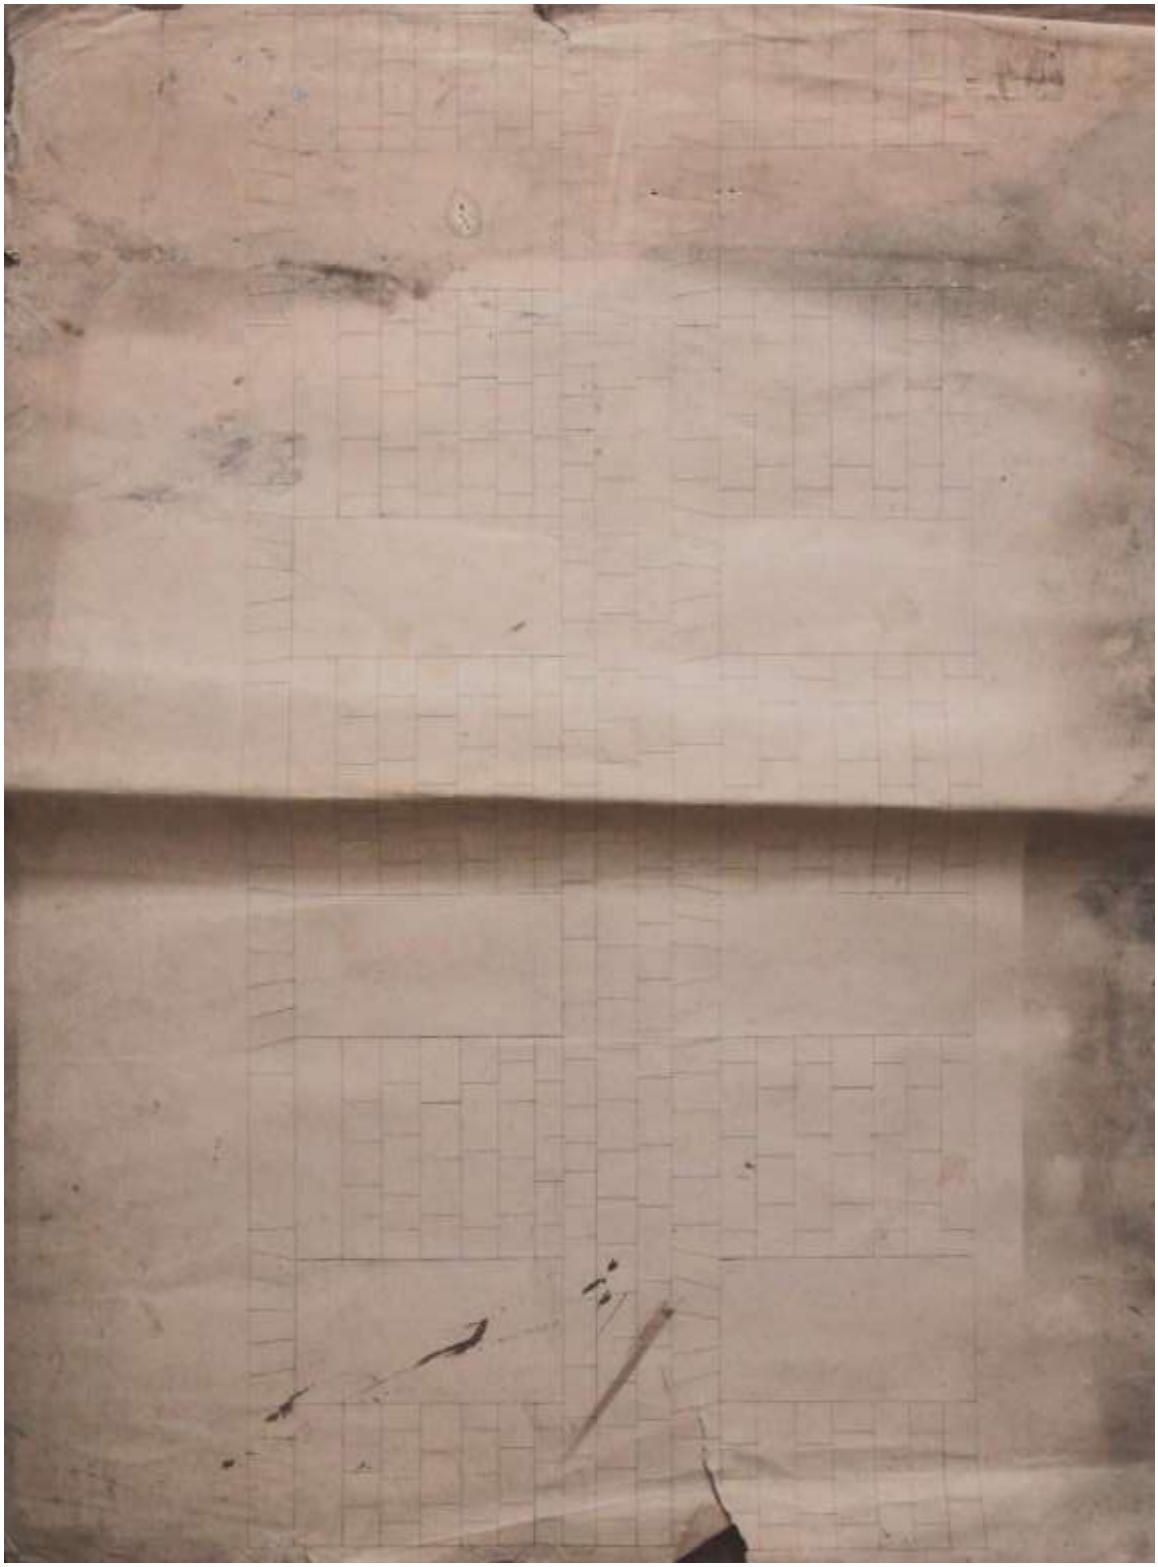

Société d'Histoire et d'Archéologie du Sedanais

1 Rue de Metz
BP 20096
08204 SEDAN Cedex

Téléphone : 03 24 32 65 78
Messagerie : ste.histoire@orange.fr

Retrouvez-nous sur le Web!
www.histoire-sedan.com

Conception et réalisation:
POMMIER Bruno
